軌建設修正計畫，然截至查核日（114 年 4 月）止迄未獲核定，現有總經費不足以支應後續增設駐車場等優化方案，難以實現縮短尖峰時間列車班距之需求導向措施；2.據報載輕軌班距過長、行車速度慢不符部分乘客期待，尖峰期間人潮過多時無法順利搭乘等營運情形未臻完善，允宜廣納民眾乘車需求研謀改善措施；3.輕軌運量及票箱收入持續成長，惟仍低於計畫運量，允宜依循使用者需求導向，研議旅遊導覽等多元經營方案，評估觀光客與市民搭乘用途頻率不同而收取差別票價之可行性等情事，經函請檢討改善。據復：1.第 6 次修正計畫於 113 年 11 月 13 日將修正後報告書提送續審，刻由交通部審查中；2.配合市政府活動適時加密班次疏運人潮，於有限運輸量能進行車輛調度及配置，另為避免輕軌事故影響平面道路交通，營運單位高雄捷運股份有限公司（下稱高捷公司）透過宣導防禦性駕駛，避免潛在行車事故，該局並與交通局研商，調整與優化路口交通號誌時相，減少輕軌於路口停等時間及次數，提升整體行車速度；3.持續透由提升系統穩定度、配合活動加密班次、優化場站設備等措施，提升運量及票價收入，另高捷公司亦採取發行旅遊套票方式吸引觀光客搭乘，配合 TPASS 月票，培養通勤（學）民眾搭乘習慣，與依里程計費觀光旅次之電子票卡及旅遊套票有所區隔，以達採行差別票價之目的。



高雄輕軌

照片來源：本處於 114 年 3 月 2 日拍攝製作。

（三） 持續推動黃線捷運建設計畫，惟整體計畫經費大幅增漲，部分路線工程無法發包，且機廠用地水保工程期程延遲，影響接續進場施作統包工程之期程，允宜檢討改善。

市政府為促進大高雄都會區大眾捷運系統長遠發展，由捷運工程局依整體路網評估成果，優先興建高雄都會區大眾捷運系統都會黃線，與營運中之捷運紅線、橘線、輕軌及臺鐵等路線形成轉乘站點，補足都會核心區軌道路網缺口，提升整體運輸系統綜效。黃線起於神農路（鳥松機廠，Y1 站）至澄清路，Y1 至 Y5 站約 4.92 公里，建工民族路段止於亞洲新灣區 Y15 站，澄清五甲路段止於前鎮區公所 Y23 站，全線約 22.91 公里，運用前瞻基礎建設－軌道建設計畫經費，綜合規劃報告於 111 年 3 月獲行政院核定，金額 1,442 億 3,700 萬元（中央補助 833 億 8,200 萬元），嗣因疫情、缺工、戰爭及物價上漲等因素，該局啟動第 1 次修正計畫作業，於 113 年 1 月函送交通部，總經費預計調整至 2,423 億 8,600 萬元，增加 981 億 4,900 萬元

（68.05%）。截至 113 年底止，計有 YM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程等 6 案已完成發包作業，金額 1,204 億 749 萬餘元（表 2），加計專案管理（含監造）委託服務案 31 億 3,960 萬元，合計 1,235 億 4,709 萬餘元。經查執行情形，核有：1.修正計畫尚未獲核定，囿於經費不足，距原綜合規劃報告計畫總經費僅餘 206 億 8,990 萬餘元，惟尚有 Y9 至 Y15 站、Y19 至 Y23 站之土建及設施機電工程無法辦理發包，恐影響全線營運通車期程；2.鳥松機廠用地遷葬階段之水保工程尚未完成，影響接續進場施作統包工程之期程；3.租稅增額收益迄未收取，允宜依償債計畫內容及期限確實執行，及時挹注償債財源，減少利息負擔等情事，經函請檢討改善。據復：1.於 114 年 2 月間完成修訂報告書提報中央續審，已開工路段將評估增加工班及施工機具等措施，期 121 年完成部分路段並通車；2.鳥松機廠 A1 區遷葬水保工程已完竣，於 114 年 3 月交付統包商申報開工作業；3.已編列尚未收取租稅增額之合計數，預計於 114 年度全數撥付高雄市大眾捷運系統土地開發基金，減少債務利息負擔。

表 2　黃線發包概況

單位：新臺幣百萬元

項次	名稱	決標金額	決標日
合　計		120,407	
1	YM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	43,399	111.8.26
2	YT01 標軌道統包工程	4,048	112.2.22
3	YC01 土建及設施機電統包工程（Y1 至 Y4 站）	23,399	112.10.25
4	YC02 土建及設施機電統包工程（Y6 至 Y8 站）	16,699	113.6.18
5	YC03 土建及設施機電統包工程（Y5、Y16 至 Y18 站）	30,692	112.12.28
6	YD01 標土建及設施機電細部設計委託技術服務（Y9 至 Y15、Y19 至 Y23 站）	2,168	113.10.17

資料來源：整理自高雄市政府捷運工程局提供資料。

（四）　積極推動岡山路竹延伸線第一階段捷運建設計畫，以促進岡山地區衍生之交通需求，惟通車後實際運量未如預期，允宜檢討改善。

捷運工程局為促進岡山地區衍生之交通需求，運用前瞻基礎建設－軌道建設計畫經費，積極推動高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫，將捷運紅線南岡山站（R24）往北延伸至岡山車站，使其成為高雄市北側之全方位轉運中心，以達成帶動岡山地區繁榮及紓解各項重大計畫未來衍生之交通需求，促進長遠發展及建設之目標，第一階段設置 RK1 站（圖 1），綜合規劃報告書於 105 年 12 月經行政院核定，嗣因疫情、缺工、戰爭及物價上漲等因素，再於 113 年 4 月經行政院核定第 2 次修正計畫，經費自第 1 次

圖 1　岡山路竹延伸線路線



資料來源：整理自高雄市政府捷運工程局提供資料。

修正核定之 30 億 2,020 萬元調整至 39 億 6,524 萬元，增加 9 億 4,504 萬元（31.29%），償債計畫規劃財源為票箱收入、附屬事業收入、場站開發效益、租稅增額收益、容積增額收益等。經查執行情形，核有：第一階段已於 113 年 6 月 30 日通車，惟截至 113 年底止，累計實際運量 58 萬餘人次，僅占綜合規劃報告書同期間預計運量 149 萬餘人次之 39.27%，運量雖持續成長，惟與預估運量仍有差距，未能支應本業營運收支差短之情事，經函請檢討改善。據復：請高雄捷運股份有限公司將短期策略聚焦於活動結合與服務優化，包括結合跨年、演唱會等大型活動，彈性調整營運時間、縮短班距，並配合 TPASS 政策積極宣傳，鼓勵民眾使用公共運輸；中長期策略則以多元發展，強化捷運與其他大眾運輸轉乘整合，提供便捷轉乘環境、善用場站空間開發商業設施，吸引人潮與商機，以提升運量。

（五） 因應綠色交通運輸趨勢，辦理岡山路竹延伸線第二階段捷運建設計畫，惟土建統包工程因廠商估驗計價請款程序延宕，預算執行情形欠佳，允宜檢討改善。

捷運工程局為因應綠色交通運輸趨勢，做全面性整合規劃，運用前瞻基礎建設－軌道建設計畫經費，積極推動高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫，路網分為第二 A 階段 RK2 至 RK6 站及第二 B 階段 RK7 至 RK8 站，綜合規劃報告書皆已提報中央審核，分別於 110 年 3 月、112 年 4 月經行政院核定，嗣因疫情、缺工、戰爭及物價上漲等因素，再於 113 年 4 月經行政院核定第二 A 階段第 1 次修正計畫，經費自原核定 199 億 3,200 萬元，調整至 279 億 1,848 萬元，增加 79 億 8,648 萬元（40.07%），通車期程展延至 116 年底；另第二 B 階段計畫經費為 146 億 1,669 萬元。經查執行情形，核有：1.截至 113 年底止，第二 A 階段土建統包工程實際施工進度為 12.89%，雖較預計施工進度 11.74%超前，惟因廠商估驗計價請款程序延宕，致預算執行情形欠佳，又因自來水管遷改工程而展延竣工日期；2.第二 A 階段及第二 B 階段場站周邊土地尚未完成都市計畫變更作業，影響土地開發期程等情事，經函請檢討改善。據復：1.第二 A 階段土建工程因自來水管線牴觸，影響部分捷運基樁基礎打設作業而展延竣工日期，已請統包商積極辦理估驗計價及控管預算執行進度，以確保工程及計畫如期完成；2.第二 A 階段之 RK2、RK3、RK6 站都市計畫變更案於 113 年 11 月召開第 1 次內政部專案小組委員聽取簡報會議，嗣該局補充及修正資料續提審議，目前由內政部都市計畫委員會審議中，並持續徵詢第二 B 階段地主參與聯合開發意願。

（六） 持續規劃小港林園線捷運建設，延伸捷運紅線至林園區之路網服務範圍，惟核定經費已不敷支應工程發包需求，且用地取得期程延宕，影響計畫執行進度，允宜檢討改善。

捷運工程局為改善小港林園地區大眾運輸環境，降低沿線因重型貨車交通安全疑慮，提供

安全便捷低污染大眾運輸，串聯南北產業園區與高雄國際機場，規劃辦理高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫，全線起於捷運紅線 R3（小港站）車站所預留隧道，續採地下隧道往南延伸，於林園區中芸排水前爬升為高架，可行性研究及綜合規劃報告書分別於 110 年 12 月及 111 年 9 月獲行政院核定，路線長度為 11.59 公里，包含地下段 11.46 公里及高架段 0.13 公里，設有 RL1 至 RL7 等 7 座車站（圖 2），核定總建設經費 533 億 1,100 萬元（中央補助 313 億 1,400 萬元），分為 2 階段施工。經查執行情形，核有：1.為應疫情等外在環境因素影響，原核定經費無法因應工程發包需求，雖已積極推動修正計畫，惟截至 114 年 4 月止迄未獲核定，影響後續土建、設施機電工程發包期程及計畫整體執行進度；2.持續規劃小港林園線捷運建設，延伸捷運紅線至林園區之路網服務範圍，惟用地取得期程延宕，影響計畫執行進度等情事，經函請檢討改善。據復：1.計畫尚未核定主要係尚待說明經費漲幅之合理性，及提報展延計畫期程未依工程特性及工地實際現況檢討修正等，經該局修正後，交通部業於 114 年 4 月核轉行政院審查；2.RL4 至 RL7 站都市計畫變更案目前尚於內政部都市計畫委員會審議階段，該局已依第 2 次專案小組會議委員建議調整計畫內容，並與地主進行溝通，後續將儘速提報續行審議，俾利加速用地取得期程。

圖 2　小港林園延伸線路線



資料來源：整理自高雄市政府捷運工程局提供資料。

（七）　為籌措捷運建設所需經費，持續辦理市政府作價投資土地開發事宜，惟辦理情形未臻完善，允待檢討改善。

市政府將市有財產作價投資高雄市大眾捷運系統土地開發基金，提供基金開發利用，以活化閒置不動產並挹注大眾捷運建設或營運所需資金，規劃開發方式包括標售、標租、設定地上權及依據大眾捷運法辦理土地聯合開發。截至 113 年底止，市政府作價投資市有地計有岡山區和平段 1195 地號等 19 處、69 筆土地，面積計 8 萬餘平方公尺。其中除基金折減 1 處外，計有標脫 4 處、出租 3 處，共 21 筆土地，計 2 萬餘平方公尺，經查岡山區和平段 1156 地號等 9 筆土地，捷運工程局依據土地法第 25 條規定之土地處分程序，以標售方式辦理開發作業，於 112 年 9 月函報行政院，迄 114 年 4 月已 1 年餘，尚未獲核定，無法續予辦理公開標售作業；另鳥松區美德段 358 地號土地，雖經市政府市有財產審議會審議通過標售程序，惟於 111 年 4 月、

8 月及 112 年 3 月開標均流標，迄 114 年 4 月止仍無處分計畫；又前鎮區瑞隆段二小段 673－3 地號土地，現況係出租予交通局作為停車場使用，該土地已依據土地法第 25 條規定，完成土地處分程序，於 113 年 4 月經市政府市有財產審議會審議通過標售程序，歷經 1 年尚未啟動標售作業。綜上，該局為籌措捷運建設所需經費，規劃辦理市政府作價投資土地開發事宜，惟土地開發收益不足，部分開發作業停滯，且仍有多處土地尚待研議開發策略，經函請檢討改善。據復：部分土地已依土地法規定辦理土地處分程序，尚待內政部回覆，及囿於人力不足，且土地開發政策現以聯合開發與都市更新等案件為主，部分未符合捷運聯合開發範圍或無大額開發效益之土地，暫以出租、出借等方式活化使用，後續將再適時檢討擬定處分計畫及辦理標售作業。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見 6 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者 3 項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者 3 項（表 3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見 3 項通知檢討改善。

表 3　112 年度審核報告所列捷運工程局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題	說明
仍待繼續改善	
（一）環狀輕軌運量雖持續成長，惟仍低於計畫運量；又土地開發時程未依建設及財務計畫期程執行，存有回饋財源不足挹注營運成本之隱憂，恐致營運收支差距持續擴大，亟待研擬具體因應策略，以降低政府財務風險。	因運量及營運情形未臻完善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。
（二）積極辦理岡山路竹延伸線捷運建設計畫，以應岡山、路竹地區衍生之交通需求，惟土地開發及增額容積收益實現期程仍較預計期程落後，允宜檢討改善。	因土地開發期程落後，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）」。
（三）持續推動小港林園線捷運建設，擴大路網服務範圍延伸至小港、林園地區，惟計畫執行情形及財務負擔能力欠佳，允宜檢討改善。	因計畫執行進度落後，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（六）」。
已研謀改善或依改善措施持續辦理	
（一）積極推動環狀輕軌建設，連接紅橘線形成十字環形捷運路網，路口設置科技執法設備及科技防護措施試驗，惟交通事故頻仍，成效尚未彰顯，建請協同相關單位妥謀改善策略，兼顧駕駛人員、乘客及用路民眾之生命安全與交通便捷。	
（二）推動都會核心區捷運延伸路網建設，持續興建捷運黃線，惟部分路幅狹小路段潛存轉乘停車空間不足之風險，且債務舉借作業欠當，允宜研謀改善。	
（三）輕軌成環與廣告綜效逐漸展現，惟未檢討權利金之計算方式，致無法獲取增額附屬事業收入，亦未督促議訂廣告新約，允宜檢討改善。	

拾柒、消防局主管

消防局主管僅消防局 1 個機關，掌理火災預防、災害搶救、緊急救護、教育訓練、火災調查及勤務指揮等業務。茲將 113 年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一） 計畫實施之查核

業務計畫 2 項，下分工作計畫 3 項，包括參考災害潛勢分析，結合災害應變經驗，更新編修高雄市地區災害防救計畫，健全災害防救體系；購置消防機器人及空拍機等，強化科技救災運用；辦理火災預防規劃及防火宣導；充實救災設備；強化災害防救資通訊系統；充實救護醫療裝備，提供民眾最佳緊急救護服務等重要施政項目，其中已執行完成者 1 項，尚在執行者 2 項，主要係和發消防分隊新建工程尚待驗收結算，及中央補助購置水箱車等計畫期程跨年度，須保留續予執行。

（二） 預算執行之審核

1. 歲入預算數 1 億 5,535 萬元，決算審核結果，審定實現數 9,766 萬餘元，應收保留數 5,014 萬餘元，主要係中央補助購置水箱車等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為 1 億 4,781 萬餘元，較預算減少 753 萬餘元（4.85%），主要係中央補助辦理和發分隊新建工程等計畫之核撥數較預計減少。

2. 以前年度歲入轉入數計 1,522 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 161 萬餘元（10.63%）；減免（註銷）數 182 萬餘元（11.97%），主要係違反消防法規之應收罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數 1,178 萬餘元（77.40%），主要係違反消防法規之行政罰鍰尚待收繳。

3. 歲出原編列預算數 30 億 491 萬餘元，因成立特種搜救大隊等事由，經動支第二預備金 696 萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備 5,077 萬餘元，合計 30 億 6,266 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 29 億 7,986 萬餘元（97.30%），應付保留數 5,385 萬餘元（1.76%），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 30 億 3,371 萬餘元，預算賸餘 2,894 萬餘元（0.95%），主要係人事費賸餘。

4. 以前年度歲出轉入數計 117 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 45 萬餘元（38.67%），應付保留數 71 萬餘元（61.33%），主要係美濃分隊耐震補強工程履約爭議訴訟中，須保留續予執行。

（三） 重要審核意見

1. 持續推動強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，深化災害防救能量，惟計畫執行未臻周延，亟待檢討改善，以強化民眾災害風險意識與防救災能力。

消防局為因應極端氣候造成天災規模擴大，災害發生頻率亦增加，自 112 年起配合內政部推動強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（下稱強韌計畫），以大規模災害整備、跨域支援合作及政府持續運作 3 大核心規劃，持續深化地方政府災害防救能量，強化民眾災害風險意識與防救災能力，計畫期程為 112 至 116 年度。嗣於 112 及 113 年度獲內政部消防署補助 1,736 萬餘元，並自籌經費 330 萬餘元，合計 2,067 萬餘元，執行強韌計畫相關工作，並委外辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫專業服務採購案。經查辦理情形，核有：(1) 推動韌性社區以強化民間自我防救災量能，惟市轄經檢視存有潛在大規模崩塌地震影響區域及高土壤液化潛勢區等 26 個較高災害風險行政區中，除仁武、阿蓮、湖內、永安、橋頭及前鎮等 6 個行政區內之部分里別已取得韌性社區標章外，餘 20 個行政區內均未成立韌性社區，有待研謀善策研議優先輔導，以強化民眾自救及互助之災害應變能力；(2) 因應大規模災害救災需求，輔導推動建立跨域聯防合作機制，惟鹽埕、鼓山、左營、茂林及桃源等 5 個區公所，仍未簽署跨域聯防合作，允宜儘速輔導加入，以提高災害防救效能；(3) 為強化災害防救據點整備與運作，設置避難收容處所，惟據市政府最近 1 次公告（113 年 12 月）市轄可供作緊急避難收容處所 441 處中，茂林區基督長老教會等 7 處位於大規模崩塌潛勢區，易生避難安全疑慮，有待通報相關機關妥為評估該等緊急避難收容所之適宜性，以達災害避難成效；(4) 協助區公所建立地區災害防救計畫更新機制，惟經檢視市政府防災資訊網結果，苓雅、鼓山及前鎮等區公所尚未配合 112 年高雄市地區災害防救計畫滾動修訂各該區災害防救計畫內容，並研擬相應對策，允宜檢討改善，以提升轄管區域災害防救應變能力等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 將持續依據大規模災害災損推估成果，選定高風險地區依序由高至低推動韌性社區；(2) 已建置 38 區公所災害防救區域聯防機制及簽訂跨域聯防合作（表 1）；(3) 社會局及區公所業已檢視各避難收容處所之消防

表 1 各行政區簽訂跨域聯防合作情形

序號	跨域聯防合作之行政區
1	小港區、大寮區、前鎮區、苓雅區、鳳山區
2	三民區、前金區、前鎮區、苓雅區、鳳山區、新興區
3	路竹區、永安區、阿蓮區、湖內區、茄萣區
4	梓官區、橋頭區、彌陀區
5	燕巢區、楠梓區、岡山區、橋頭區、大社區、田寮區
6	鳥松區、仁武區、大樹區
7	燕巢區、仁武區、大樹區、旗山區
8	小港區、林園區、大寮區
9	美濃區、旗山區、杉林區
10	旗津區、前鎮區、小港區
11	甲仙區、杉林區、六龜區、美濃區、內門區、那瑪夏區
12	左營區、楠梓區、鳳山區、鼓山區、旗山區
13	鼓山區、鹽埕區、左營區
14	茂林區、桃源區
15	茂林區、六龜區

資料來源：整理自高雄市政府消防局提供資料。

安檢情形及耐震評估等，並將其列為每年區公所災防考核時之評核項目，作為汰除（換）避難收容場所依據，以保障安置民眾之安全性；(4) 苓雅區、鼓山區及前鎮區之地區災害防救計畫已更新上傳至市政府防災資訊網。

2. 持續列管公共危險物品製造、儲存、處理高風險場所之消防安全管理，惟間有檢舉獎金相關規定未盡周妥，或公共危險物品資訊公開未臻落實，亟待檢討改善，以減少公共危險物品災害發生。

消防局因應消防法第 1 條規定，職司火災預防、搶救災害及緊急救護等任務，為維護公共安全，確保人民生命財產安全，爰持續加強公共危險物品管理，落實執行場所消防安全檢查，並強化企業自主防災意識及應變能力，加強園區內場所查核，以減少災害發生或降低其危害性。113 年度消防局持續列管公共危險物品場所共計 362 家，其中達管制量 30 倍以上者計 178 家，未滿 30 倍者計 184 家，並辦理檢查共 570 件次（表 2）。經查執行情形，核有：(1) 為達全民監督公共危險物品場所安全目標，訂定高雄市舉發重大違反消防法第 15 條第 1 項及第 2 項案件獎勵辦法（下稱高雄市舉發違反消防法案件獎勵辦法），其中第 5 條規定舉發重大違反消防法案件經主管機關裁罰，於罰鍰全數繳清後，得按實收罰鍰金額 5%或 10%發給舉發人獎勵金，內政部消防署爰於 112 年 11 月建議各地方消防機關自違反消防法罰鍰提撥檢舉獎金比例至少提高為 20%，且臺東縣、嘉義市等已配合修正相關規定，嗣消防法亦於 113 年 11 月將有關舉發違反消防法案件獎勵金，由「得」修正為「應」以實收罰鍰總金額一定比例提充獎金獎勵舉發人，惟高雄市舉發違反消防法案件獎勵辦法遲未配合調整修正，允宜研議藉由提撥比例之調整，鼓勵從業人員勇於檢舉不法，以維護公共安全；(2) 已公開列管達管制量 30 倍以上之公共危險物品製造、儲存或處理場所，惟各場所製造、儲存、處理之公共危險物品項目闕如，亦未依災害防救法公告相關各類場所之消防防災、防護或安全防護計畫等事項；(3) 辦理公共危險物品與可燃性高壓氣體場所、各類場所設置及維護消防安全設備等違反消防法裁罰作業，保有相對處分人機敏資料檔案，惟迄未依個人資料保護法公開辦理裁罰作業資料檔案名稱，亦未訂定個人資料安全維護相關規定等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 已擬具高雄市舉發違反消防法案件獎勵辦法修正草案辦理中；(2) 已於網站增列申請表單供民眾申請查閱相關場所內之公共危險物品種類名稱，及公開消防防災、防護或安全防護等計畫資料；(3) 已依個人資料保護法於網站公開個人資料檔案名稱，另研訂個人資料保護管理要點中。

表 2 公共危險物品場所列管及檢查情形


項 目	列管家數	檢查件次	不符件次
合 計	**362**	**570**	**24**
達管制量 30 倍以上	178	317	17
達管制量未滿 30 倍	184	253	7

資料來源：整理自高雄市政府消防局提供資料。

3. 為減少消防人員暴露高危險火災環境，運用智慧聯網消防機器人協助救災任務，惟相關管理維護及資安辦理情形容有精進空間，允宜檢討改善，以提升整體消防救災效能，及降低資通安全風險。

高雄市轄內眾多工業及科技園區廠房儲放高危險性質化學品，消防局為因應高風險場域，確保消防人員救災安全，於 111 及 113 年度採購具遠端操控之 4G AIoT 智慧聯網消防機器人（下稱消防機器人，圖 1）共 6 台，財產價值 3,580 萬元。經查消防機器人相關管理維護及資安辦理情形，核有：(1) 消防機器人係結合影像、紅外線熱顯像鏡頭和氣體偵測等多樣感測器模組，運用 AI 導入之物聯網資訊進行遠端操控與資料傳輸，實具資訊通訊功能，惟未納列資通訊設備清冊管理，不利落實資通安全弱點通報機制導入作業，恐衍生資安風險；(2) 已訂定資通安全維護計畫，惟資通安全風險評估未納列風險評估及處理彙總表，且尚有住警器補助管理系統及救災安全管制系統等 5 項資訊安管系統尚未納入資通安全維護計畫，不利辦理資通安全風險評估、防護及控制措施；(3) 市政府 113 年度第 2 次電子郵件社交工程檢測結果，所屬人員開啟惡意郵件及點閱連結之次數或其相關占比，均高於第 1 次，人員資通安全意識尚須加強等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 消防機器人已納列資通訊設備清冊，進行後續資安風險評估，以降低資安風險及提升救災效率與安全性；(2) 刻正修訂資通安全維護計畫、風險評估及處理彙總表；(3) 已於 114 年增辦資通訊課程 4 小時，加強同仁資通安全認知。

圖 1 消防機器人

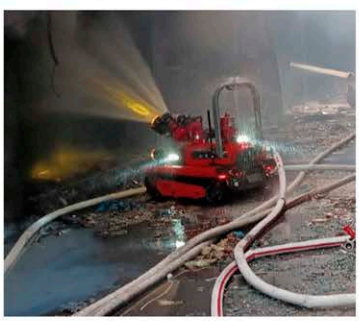

資料來源：整理自高雄市政府消防局提供資料。

（四） 112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見 3 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表 3）。

表 3 112 年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題	說明
已研謀改善或依改善措施持續辦理	
1. 為提升危急個案急救成功率，實施扣緊生命之鏈DA－CPR等緊急救護服務，惟非緊急狀況使用救護車案件逐年攀升，又送醫案件反應時間仍高於全國平均，允宜加強宣導並提高救護技術員量能，完善緊急救護服務品質。	
2. 辦理醫院及長照機構等消防安全檢查，提升火災預防能力，惟間有長照機構未納列安管系統、或列管場所用途別登錄未臻妥適，允宜檢討改善，俾利追蹤場所管理權人檢修申報及檢查，健全消防安全管理。	
3. 善用新型科技及技術，以提升火災救災效能，惟部分分隊尚未配置相關應災裝備及災害搶救演練容有精進空間，允宜檢討改善，以提升整體消防救災效能，並保障消防人員執勤安全。	

拾捌、文化局主管

文化局主管計有公務機關 1 個，非營業特種基金單位 2 個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

文化局主管僅文化局 1 個機關，掌理文化政策與制度之推展、文化資產維護與營運、古蹟維護與再造、推動表演藝術及影視產業、推廣文創產業與視覺藝術等業務。茲將 113 年度決算審核結果說明如次：

（一） 計畫實施之查核

業務計畫 2 項，下分工作計畫 9 項，包括文化政策與環境推展、文化資產維護與營運、表演藝術推動、文創產業與視覺藝術推展、影視產業推動業務、駁二營運中心業務、文化中心業務及文化工程建設與維護等重要施政項目，其中已執行完成者 1 項，尚在執行者 8 項，主要係眷村文化資產保存計畫等修復工程期程跨年度，須保留續予執行。

（二） 預算執行之審核

1. 歲入預算數 4 億 4,156 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 4 億 2,676 萬餘元，應收保留數 5,593 萬餘元，主要係中央補助辦理再造歷史現場專案計畫等經費，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為 4 億 8,269 萬餘元，較預算增加 4,113 萬餘元（9.32%），主要係出租場域變動租金收入較預計增加。

2. 以前年度歲入轉入數計 1 億 2,524 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 546 萬餘元（84.20%）；減免（註銷）數 1,387 萬餘元（11.08%），主要係中央依計畫實際執行數核撥補助款，未撥付數無需保留，辦理註銷；應收保留數 590 萬餘元（4.72%），主要係中央補助辦理再造歷史現場專案計畫等經費，依實際執行進度撥款。

3. 歲出原編列預算數 24 億 1,152 萬餘元，因應風災移緩濟急 4,520 萬餘元，合計 24 億 5,673 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 23 億 1,252 萬餘元（94.13%），應付保留數 1 億 2,155 萬餘元（4.95%），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 24 億 3,408 萬餘

元，預算賸餘 2,265 萬餘元（0.92%），主要係再造歷史現場專案計畫—左營舊城見城計畫結餘。

4. 以前年度歲出轉入數計 2 億 7,943 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 6,723 萬餘元（59.85%）；減免（註銷）數 342 萬餘元（1.23%），主要係高雄市武德殿西側整地等工程結餘；應付保留數 1 億 876 萬餘元（38.92%），主要係見城之道—南門廣場營造與東門銜接（第一期）工程履約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

文化局主管包括（一）作業基金：高雄市文化創意產業園區發展基金；（二）特別收入基金：高雄市公共藝術基金等 2 個單位。茲將 113 年度決算審核結果說明如次：

（一） 計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有觀光渡輪船票收入、文化園區門票收入及公共藝術推動等 3 項，實施結果，文化園區門票收入，因駁二藝術特區自營倉庫觀光人數未如預期，致未達預計目標。

（二） 餘絀之審定

1. 作業基金：決算審核結果，審定短絀 6,256 萬餘元，與預算賸餘 55 萬餘元，相距 6,312 萬餘元，主要係辦理濱線觀光列車－哈瑪星號復駛等業務費用較預計增加所致。

2. 特別收入基金：決算審核結果，審定短絀 1,005 萬餘元，與預算賸餘 4 萬餘元，相距 1,009 萬餘元，主要係設置公共藝術提撥收入較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一） 為提升市民藝術涵養及營造優質城市美學氛圍，推動公共藝術設置，惟部分案件未依規定辦理設置或拆除，且間有資訊登載未盡詳實，允待檢討改善，以強化制度執行與藝術推廣效能。

文化局為提升市民藝術涵養、創造城市新亮點及營造優質城市美學氛圍，於 93 年度創設高雄市公共藝術基金，並分別於 101 年 6 月及 102 年 2 月制定「高雄市公共藝術基金收支管理及運用自治條例」及「高雄市政府公共藝術設置作業要點」，辦理公共藝術設置及維護作業。截至 114 年 4 月高雄公共藝術網刊載已完成之公共藝術案件計 811 筆，經查辦理情形，核有：1.公有建築及工程總預算逾千萬元，應辦理惟未辦理公共藝術者，累計達 74 件，其中部分未編列經費或未成立執行小組，違反文化藝術獎助及促進條例等相關規定；2.高雄公共藝術網站列 811 筆與文化部公共藝術網所公開之資料載列 908 筆，兩者相差 97 筆，或列登已裁撤作品，不利民眾參訪體驗；3.文化藝術獎助及促進條例施行細則規定，基金用途宜優先用於傳統工藝、

美術之購藏、扶植傳承及人才培育，惟實際支出經費用於駐村藝術推廣、展演活動居多，有待檢討經費運用項目與分配比例；4. 原住民事務委員會未依規定提送審議即拆除公共藝術作品，顯示管理機關對法定程序未熟稔，恐損藝術家權益及創作；5. 已設置完成之公共藝術作品，間有保養情況欠佳情形；6. 高雄市公共藝術基金管理會未依規定次數召開會議等情事，經函請檢討改善。據復：1. 為強化公共藝術管控，將持續函請興辦機關查填執行情形，並列管申請建照之工程，督促未辦理案件儘速完成；2. 持續與文化部網站勾稽作品清單，並已更新作品現況資訊，確保資料正確；3. 檢視經費用途之配置比例與內容，具體落實條例所揭扶植傳承傳統工藝美術之立法精神；4. 將加強宣導公共藝術移置或拆除作品之規定，避免類似情形再次發生；5. 將請各興辦機關依設置時所擬管理維護計畫及經費如實執行；6. 將檢討管理會召開次數，或視實際需求研議調整，以完善會議制度。

（二） 推動文化資產保存與活化，涵蓋多區歷史建築、古蹟等場域，文化價值逐漸彰顯，惟部分資產未提報維護計畫，保險與財產管理作業亦未臻周妥，允宜強化制度執行與推動認養機制，以提升資產維護效能並落實風險控管。

依文化部國家文化資產網統計，截至 113 年底高雄市轄內蘊藏有形文化資產計有古蹟 44 處、歷史建築 67 處、紀念建築 1 處、聚落 1 處、考古遺址 3 處、文化景觀 6 處及古物 51 件；無形文化資產計有傳統表演藝術 15 種、傳統工藝 8 種、民俗 21 種、保存技術及保存者 3 種。文化局為使文化資產永續保存，辦理各項文化資產之管理、維護、調查、再利用等保存及活化事宜。經查辦理情形，核有：1. 辦理轄內文化資產及其周邊場域清潔維護作業，因涵蓋中、西、鼓山、鹽埕等多個區域，場域類型多元、分布廣泛，維護工作繁重且具持續性，長期依賴公務預算支應，對地方財政形成壓力；借鏡財政部、臺中市及日本京都市等地經驗，透過志工參與或企業協力推動文化資產認養與維護，提升管理效能並凝聚社會參與，建議盤點維護需求高且適宜開放之場域，研議導入認養制度，由民間協助日常維護以分擔財政壓力，並促進文化資產活化利用；2. 高雄市歷史建築田町齋場（原鼓山第二公有市場）自登錄後，因與土地所有人遲未完成租賃契約，致預算連年保留，113 年雖啟動修復工程，惟土地使用權未確立，恐影響預算執行與管理維護作業權責；3. 截至 113 年底，高雄市 112 處市定文化資產中，仍有 36 處未依文化資產保存法訂定或檢討管理維護計畫，另 11 處未提報修復再利用計畫，尤以私有資產違規比例偏高（表 1），亟需主管機關加強公有資產示範與私有資產輔導；4. 高雄市多處文化資產未依文化資產保存法等相關規定完成火災與公共責任保險，尤以對外開放場域更具高風險，且曾有市轄古蹟鳳山龍山寺及歷史建築高雄港站北號誌樓遭火災焚毀案例，造成嚴重文資損毀，亟待強化風險控管機制；5. 部分具文化資產性質之市有及國有不動產，因無估價資料致未列

帳，影響珍貴財產管理完整性，允應依規定檢討估列；6. 文化資產相關審議會之規定，部分尚未納入性別比例規範，或雖已修正內容卻未同步更新於高雄文化資產網，與性別平等政策及資訊正確性原則有間等情事，經函請檢討改善。據復：1. 將研議評估民間認養之可行性；2. 目前仍持續與土地所有人商議土地租用事宜，期竣工後可延續市場時期租地予市政府模式，公私協力活化歷史建築；3. 已提醒各文化資產所有人檢討修正逾期之管理維護計畫；對私有資產則由承辦人定期發文並協助辦理；4. 非該局為管理人之公私有文化資產場域，將定期提醒所有權人依古蹟管理維護辦法辦理災害保險，並將保單報局備查；5. 鳳山縣舊城修復工程等尚在申請補助中，待完工後登錄價值，另疏漏部分將辦理列帳；6. 已修正各審議會要點納入性別比例等規定，並完成網站更新。

表 1　未依規定訂定（修正）管理維護計畫及修復再利用計畫文化資產情形

單位：處、%

資產類別/所有權屬	數量	管理維護計畫未依限訂定（修正）者						未訂定修復再利用計畫者	
		小計		未訂定者		逾 5 年以上未檢討修正者			
		數量	比率	數量	比率	數量	比率	數量	比率
合　　計	**112**	**36**	**32.14**	**16**	**14.29**	**20**	**17.86**	**11**	**9.82**
市定古蹟	**44**	**13**	**29.55**	**－**	**－**	**13**	**29.55**	**3**	**6.82**
公　　有	27	5	18.52	－	－	5	18.52	1	3.70
非 公 有	17	8	47.06	－	－	8	47.06	2	11.76
歷史建築	**67**	**22**	**32.84**	**15**	**22.39**	**7**	**10.45**	**8**	**11.94**
公　　有	35	6	17.14	2	5.71	4	11.43	2	5.71
非 公 有	32	16	50.00	13	40.63	3	9.38	6	18.75
紀念建築	1	1	**100.00**	1	**100.00**	**－**	**－**	**－**	**－**
公　　有	－	－	－	－	－	－	－	－	－
私　　有	1	1	100.00	1	100.00	－	－	－	－

註：1. 非公有包含公私有及私有。
　　2. 資料來源：整理自高雄市政府文化局提供資料。

（三）　推動街頭展演活動具初步成效，惟表演與觀光空間整合度不足，允宜導入跨單位協作機制，以達成藝文與觀光雙軸並進之政策效益。

「街頭展演」為推動城市文化之重要形式，兼具文化傳播、藝術教育與社會參與等功能，能活化公共空間、促進市民參與，並提升城市識別度與觀光吸引力。據文化局 113 年文化統計年報列載，辦理街頭展演活動計 512 場，表演者達 1,080 人次，觀賞人次達 30 萬 4,376 人次，較 111 及 112 年度顯著成長，推動工作已展現初步成效。惟經統計活動場域仍以「其他展演地點」為主，計 321 場，占比達 62.70%，反映尚未建立具識別性與連續性之固定展演場域，導致活動分散、品牌聚焦不足與觀眾黏著度不高。澄清湖風景區雖為單一場地中場次最多者，達 115 場，觀賞人次達 11 萬 2,000 人次（表 2），惟該場地尚無常態性策展與節目設計，文化應用潛力仍待開發。另據觀光局 113 年 12 月「主要觀光遊憩區遊客人次表」，如駁二藝術特區（41

萬 2,172 人次）、愛河（19 萬 3,777 人次）、蓮池潭（18 萬 8,170 人次）等皆為主要觀光熱點，惟文化局文化統計年報中未見該等場域街頭展演紀錄，亦未納入 113 年「高雄市主要文化觀光遊憩區參觀人次表」所列前五大場域（包括高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、美術館、文化中心、大東文化藝術中心）之展演統計，顯示街頭藝文推動與觀光動線整合度仍有待加強。觀察其他直轄市經驗，臺北市於西門町與捷運站口設置街藝專區，搭配藝人審查與管理制度，並舉辦街藝嘉年華，兼顧規模與參與度；臺中市則以草悟道與市民廣場為核心，結合市集與節慶活動，發展具在地特色之藝文空間。允宜強化街頭展演與觀光場域整合，優先於人潮密集區設置固定展演與示範空間，導入策展與場域經營機制，提升街頭展演作為文化亮點與觀光節點之策略功能，實現藝文與觀光雙軸推動目標之情事，經函請研議改善。據復：高雄市遊客造訪之重要景點，如駁二藝術特區、蓮池潭、旗津風景區等場域之街頭藝人表演及觀賞相關人次已於 114 年 4 月開始列入公務統計報表修訂案進行申報，將積極媒合熱門場域，與觀光、交通及民間單位合作，協助街頭藝人於城市熱點展演，並於節慶活動規劃主題式展演，推動藝文與觀光並進。

表 2　113 年度高雄市前 6 大街頭展演及觀光遊憩區人潮統計

展演地點	觀賞人次	觀光遊憩區名稱	參觀人次
其他	186,214	駁二藝術特區	412,172
澄清湖風景區	112,000	愛河	193,777
義大世界 123 廣場	2,645	蓮池潭	188,170
旗津海岸公園	1,827	旗津風景區	153,197
科學工藝博物館廣場	1,600	澄清湖	137,960
社教館前庭	90	佛光山	108,585

資料來源：整理自高雄市政府文化局提供資料。

（四）　賡續推動博物館與地方文化館發展計畫，以發揚在地文化特色、促進文化平權及深化民眾參與，惟計畫內容更新幅度有限及協作機制薄弱，允待強化分級輔導與聯策平台，以提升館舍營運永續性與文化資源運用效益。

文化部為健全博物館功能並建立地方文化館永續經營機制，補助地方政府推動「博物館與地方文化館發展計畫」，於 110 至 111 及 112 至 113 年度分別核定市政府「博物館與地方文化館升級計畫」補助經費 1 億 967 萬元（含中央補助 7,555 萬元）及 1 億 2,419 萬餘元（含中央補助 8,580 萬元），補助博物館與地方文化館舍計 36 座（表 3），類型涵蓋運籌機制、館舍提升及整合共創計畫等三大面向。經查辦理情形，核有：1.依文化部補助要點，運籌機制計畫應協助地方館舍提升品質與永續營運，惟文化局於 110 至 113 年度推動運籌機制計畫經費逾 1,000 萬元，多年重複補助高雄市博物館地方文化館，營運成效未見顯著提升。例如：旗山糖鐵故事館多年重複執行導覽訓練、市集推廣等內容，缺乏創新與改善；舊鼓山國小文物館長期無常設人員進駐，營運經費高度依賴補助，難以形成穩定且自主之營運模式；那瑪夏原住民文物館雖已

重新開幕，惟部分空間仍待整理，且缺乏專業團隊與明確營運策略，反映輔導未見分級規劃，允宜設計考核機制改善營運不彰館舍，適時汰弱或轉向輔導；2.依文化部補助要點，整合共創計畫應促進館舍活化、整合資源並深化在地文化，惟文化局 110 至 113 年度推動整合共創計畫，成果多為短期活動，重複性高，缺乏常設協作機制，例如：哈瑪星計畫之哈瑪星貿易商大樓 113 年僅開放 26 日，未能有效串聯鄰近場館；岡山與橋頭地區資源整合不足，歷史建築未納入策展；鳳山至林園各館獨立運作，缺乏主題串聯，整體推動成效有限，允宜設立常設合作平臺與聯展機制，強化館際協作與資源整合，提升政策執行效益與文化影響力等情事，經函請檢討改善。據復：1.為強化地方文化館輔導制度，將結合 114 至 115 年度運籌專家輔導團，研擬館舍營運潛力與執行成效評估指標，納入訪視重點，並作為館所自主評核依據；後續將依評估結果與專家意見，調整提升與共創計畫補助順序，送文化部複審，以達分級評量與資源汰弱目標；2.將持續評估館舍地理與人文特性，納入中長程輔導目標，提供資源整合方針，強化館際連結與主題聯合策展，提升協作計畫成效與持續性。

表 3　110 至 113 年補助博物館與地方文化館舍情形

110 至 113 年	110 至 111 年
1.歷史博物館 2.勞工博物館 3.電影館 4.打狗英國領事館 5.武德殿 6.鳳儀書院 7.林園歷史教室 8.臺灣鳳梨工廠 9.駁二藝術特區 10.紅毛港文化園區 11.新思惟人文空間 12.高雄文學館 13.鍾理和紀念館 14.旗山糖鐵故事館 15.那瑪夏原住民文物館 16.哈瑪星貿易商大樓 17.舊三和銀行 18.舊鼓山國小 19.台灣糖業博物館 20.小林平埔族群文物館	1.柯旗化故居 2.哈瑪星台灣鐵道館 3.舊打狗驛故事館 4.見城館 5.高雄市桃源區原住民文物館 6.郭常喜兵器藝術文物館 7.旗津戰爭與和平紀念公園主題館 8.再見捌捌陸一臺灣眷村文化園區
	112 至 113 年
	1.美術館 2.醒村 3.新濱町連棟紅磚街屋 4.逍遙園 5.愛國婦人會館 6.雄鎮北門 7.甲仙化石館 8.台灣螺絲博物館

資料來源：整理自高雄市政府文化局提供資料。

四、112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見 2 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表 4）。

表 4　112 年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題	說明
已研謀改善或依改善措施持續辦理	
（一）已建置管控機制持續追蹤各項再造歷史現場與古蹟及歷史建築維護工作，惟部分計畫執行進度仍未如預期、或文化資產遲未訂定管理維護計畫，允宜研謀改善，以提升市容及觀光效益。	
（二）持續辦理行政法人績效評鑑作業，強化行政法人營運及服務效能，惟部分行政法人仰賴政府挹注情形未能有效減緩，允宜督促積極開拓財源，以提升經費自籌能力。	

拾玖、交通局主管

交通局主管計有公務機關 2 個，市營事業單位 1 個，非營業特種基金單位 1 個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

交通局主管包括交通局及車輛行車事故鑑定委員會等 2 個機關，掌理運輸規劃、停車場管理、運輸管理、交通管制、交通裁罰、行車事故鑑定等業務。茲將 113 年度決算審核結果說明如次：

（一） 計畫實施之查核

業務計畫 3 項，下分工作計畫 5 項，包括配合南部半導體 S 廊帶健全交通路網，推動台 39 高鐵橋下道路等可行性評估；建置南部半導體 S 廊帶產業園區聯外智慧運輸走廊、AI 智慧道路優化基礎建設；賡續辦理交通行動服務（MeN Go）建置計畫，推動公共運輸月票減輕民眾負擔；制訂交通事故防制計畫，強化工程、教育、執法、推廣公共運輸等 4E 改善策略；落實人本交通，檢討行人號誌、標誌、標線等設施，改善通學環境；推動公共自行車及共享綠能運具，結合公共運輸路網，提供第一哩路及最後一哩路轉乘接駁服務；新建電力驅動渡輪 3 艘汰換老舊渡輪，保持船舶航行安全及穩定；利用公有閒置土地闢建停車場及引進民間資金參與興建營運多目標使用立體停車場，平衡公共停車供需；引進智慧化技術，結合多元停車費繳費管道，提升停車場經營績效及服務滿意度；持續推動公車無障礙化及電動化，汰換成電動低地板公車，提供友善公車服務，並響應綠色運具潮流，降低排放空氣污染物等重要施政項目，其中已執行完成者 2 項，尚在執行者 3 項，主要係高雄市區及南高屏通勤月票補助計畫期程跨年度，須保留續予執行。

（二） 預算執行之審核

1. 歲入預算數 33 億 1,883 萬元，決算審核結果，審定實現數 23 億 9,240 萬餘元，應收保留數 3 億 5,714 萬餘元，主要係交通違規罰鍰及高雄市停車場作業基金賸餘繳庫數尚待收繳；合計決算審定數為 27 億 4,955 萬餘元，較預算減少 5 億 6,927 萬餘元（17.15%），主要係高雄市區及南高屏通勤月票補助計畫，依實際執行情形核撥，補助及協助收入較預計減少。

2. 以前年度歲入轉入數計 7 億 6,383 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 4 億 6,508 萬餘元（60.89%）；減免（註銷）數 26 萬餘元（0.04%），主要係註銷中央補助候車亭及集中式站牌等相關候車設施設置工程等依實作數量結算撥付之賸餘；應收保留數 2 億 9,848 萬餘元（39.08%），主要係中央補助電動大客車示範計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

3. 歲出原編列預算數 36 億 5,256 萬餘元，因投資高雄市輪船股份有限公司旗津站體美化工程，及辦理慰助凱米颱風拖吊泡水車輛實施計畫等事由，經動支第二預備金 1,983 萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備 1,103 萬餘元，合計 36 億 8,343 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 27 億 3,158 萬餘元（74.16%），應付保留數 1 億 580 萬餘元（2.87%），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 28 億 3,738 萬餘元，預算賸餘 8 億 4,604 萬餘元（22.97%），主要係高雄市區及南高屏通勤月票補助計畫執行之結餘。

4. 以前年度歲出轉入數計 6 億 2,011 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 3 億 1,477 萬餘元（50.76%）；減免（註銷）數125 萬餘元（0.20%），主要係註銷高雄市區及南高屏全區通勤月票、中央補助公路公共運輸服務升級等計畫賸餘；應付保留數 3 億 407 萬餘元（49.04%），主要係中央補助電動大客車示範計畫期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算營業部分

交通局主管僅高雄市輪船股份有限公司 1 個單位。茲將 113 年度決算審核結果說明如次：

（一） 計畫實施之查核

營運計畫為客運收入 1 項，實施結果，主要係受疫情後出國旅遊人潮攀升及颱風影響，國內旅遊人數較預計減少，致未達預計目標。

（二） 盈虧之審定

決算審核結果，審定本期淨損 6,179 萬餘元，較預算本期淨損 4,852 萬餘元，增加淨損 1,327 萬餘元，約 27.36%，主要係受疫情後出國旅遊人潮攀升及颱風影響，國內旅遊人數低於預期，勞務收入較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

交通局主管僅作業基金－高雄市停車場作業基金 1 個單位。茲將 113 年度決算審核結果說明如次：

（一） 計畫實施之查核

營運計畫主要有路邊及路外平面停車場收入、路外立體停車場收入及拖吊保管收入等 3 項，實施結果，計有拖吊保管收入 1 項，因持續推動各項交通大執法及民眾守法意識提高，違規停車收入較預計減少，致未達預計目標。

（二） 餘絀之審定


決算審核結果，審定賸餘 3 億 139 萬餘元，較預算賸餘 2 億 4,307 萬餘元，增加 5,831 萬餘元，約 23.99%，主要係申請繳納代金以免予附設停車場案件多位於土地公告現值較高區域，停車場空間代金收入較預計增加所致。

四、重要審核意見

（一） 積極優化公車路線，建構完善公共運輸路網，惟部分常住人口較多區域尚無公車服務，或部分路線互相或與輕軌路線重疊，影響營運效能，有待檢討改善，達有限資源最適配置。

為應氣候變遷及接軌國際，市政府自 2021 年發表第 1 本自願檢視報告（Voluntary Local Review, VLR），並於施政主軸納入聯合國於 2015 年通過「2030 年永續發展議程」所提 17 項「永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」，其中永續城市與社區係含括「建置便利且多元大眾運輸」指標，據交通局統計，高雄市公車客運搭乘人數自 103 年度之 5,123 萬餘人次逐年穩定成長至 107 年度之 5,264 萬餘人次，嗣因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情降至 112 年度之 3,334 萬餘人次，截至 113 年底止仍未恢復疫情前之搭乘量。經查公車路線規劃及調整情形，核有：1.結合內政部 112 年 11 月電信信令人口統計及 113 年 9 月高雄市公車站牌分布圖層資料，以公車站牌周圍 500 公尺環域分析結果（圖 1），市轄 1 萬 7,387 個最小統計區（相當於行政區之「鄰」）中，計 1,403 個無公車服務，其中常住人口高於 500 人者計有 7 個；又已具服務路線，惟無常住人口者計 69 個，另分析公車站位及 113 年 6 月乘車票證交易（含公車式小黃）等資料，計 280 個站位無人上下車，公共運輸之可及性及資源配

圖 1 市公車站牌環域 500 公尺結果

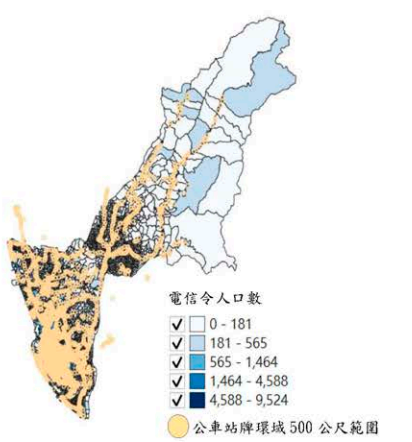

資料來源：整理自內政部電信信令人口統計及高雄市政府交通局提供資料。

置效率尚待提升；2.分析市轄橘 11A 及 8041A、紅 72 及紅 75 與紅 76、76 及 77、E09 及 E10 等公車路線重疊比率介於 54.26%至 81.03%間，又與輕軌平行重疊之 72 條公車路線中，路線 37 與輕軌重疊長度達 5.464 公里，已逾重疊比率不得超過 50%或重疊里程逾 5 公里得調整營運路線之標準，有待審慎研謀改善，以優化整體交通運輸資源配置等情事，經函請檢討改善。據復：1.已規劃進行公車路網檢討及費率調整委託案，由專業顧問團隊協助分析相關數據，另盤整無效運力路線及班次，將資源轉投潛力較高路段或升級幹線服務；2.已逐步進行服務路線重疊或班次之調整，惟部分路線端點囿於轉乘臺鐵或捷運等不同需求，須同步優化，刻正研議可行方案，或係應特定路線截短轉型服務，已調整班次保留尖峰通勤時段服務。

（二） 持續辦理公車營運與服務品質評鑑，惟未依評鑑結果落實溝通協調業者研議精進措施，復未妥為分析公車申訴內容，供施政回饋，允宜研謀改善，以兼顧提升民眾滿意度及保障乘客安全。

臺灣永續發展核心目標 9：「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸」及其具體目標 3.6：「降低交通事故死亡人數。」交通局為提升市轄大眾運輸服務水準，促進大眾運輸永續發展，辦理公車等運輸規劃及監理事務，於 110 至 112 年度陸續委託中華民國運輸學會辦理高雄市公車營運與服務品質評鑑（暨無障礙服務及性別友善度評鑑）計畫，金額合計 779 萬餘元。有關市公車服務品質評鑑情形，前經查核發現，評鑑缺失改善指標配分偏低，業通知研擬檢討評鑑制度及配分比重，惟公共運輸服務品質評鑑情形，仍核有：1.逐年辦理評鑑結果，多數業者遭客訴誤點或脫班，或諸多營運路線發生到站顯示、到站告知不正確等問題，惟遲未依評鑑結果落實溝通協調業者改善或研議具體可行精進措施；2.為利民眾即時反映公車運輸服務疑慮及其處理，設置申訴專線，並委由廠商派員受理客訴、提供諮詢、乘車規劃、答覆陳情意見整理等，惟 113 年度截至 8 月底止尚乏申訴案件統計分析結果，不利公共運輸服務品質之改善或提升；3.採秘密客方式稽查或評鑑公車式小黃服務品質，以瞭解車輛及駕駛實際服務情形，惟 113 年度僅評鑑 10 班次，占總發車 5 萬 7,633 班次之 0.02%，且 110 及 112 年度均未辦理稽查或評鑑，又分析公車式小黃乘車票證交易等資料結果，存超載（速）等駕駛行為，允宜善用科技資訊建立稽核模組，以強化監管能力等情事，經函請檢討改善。據復：1.「缺失改善」已納為評鑑制度剛性指標，由業者提出改善結果佐證或具體短中長期改善計畫，又評鑑結果直接影響業者下 1 年度補貼款核撥比例與金額，另定期召開會議滾動修正評鑑指標及檢討執行成效，確保制度具彈性與執行效益；2.受理民眾來電採即時答覆，內容業具意見彙整、問題分類及趨勢掌握等功能，並納入日常執行流程；3.已將公車式小黃列入「公車服務品質評鑑計畫」，要求業

者配合評鑑指標落實營運管理，另請業者恪遵交通法規並明定違規改善機制。

（三） 為落實綠色運輸理念，賡續補助市轄客運業者汰換運具，惟逾齡公車比率仍高，又公車站點鄰近尚乏公共自行車租賃站，易影響民眾使用公共運輸意願，有待積極督促改善。

行政院為落實環境永續發展與綠色運輸理念，規劃2030年全面電動化市區公車，並於111年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」提出「運具電動化與無碳化」等12項關鍵戰略，爰交通局配合中央「電動大客車示範計畫」協助業者導入電動大客車，截至113年底止獲補助 6 億 2,581 萬元，又為應節能省碳，陸續建置提供萬餘輛公共自行車供民眾租賃使用，期滿足轉乘或接駁需求。經查大客車汰換及整體公共運輸接駁服務情形，核有：1.截至113年8月底止，市轄車齡逾8年之汽（柴）油及12年之柴油等公車各為260輛及31輛，占總營運859輛之30.27%及3.61%。又分析同年1至7月市轄公車業者營運虧損補貼資料結果，部分業者逾12年之高齡車輛累計行駛12萬7,207公里，占同期間市轄公車總里程81萬9,131公里之15.53%，存安全疑慮。另全面電動化期程在即，惟市轄電動公車僅295輛占總營運859輛之34.34%，仍具強化空間，均待研謀改善；2.臺灣永續發展具體目標9.2，提高偏鄉地區住戶可於步行500公尺範圍內使用公路公共運輸比例。截至113年8月底止交通局核定公車停靠站計5,230站，其中於鄰近500公尺內無公共自行車租賃站點者計1,755站，比率達33.57%，又市轄鳳山等6個已設置公共自行車租賃站點百處以上之行政區中，尚有13站公車停靠站鄰近1公里內無租賃站點（表1），且據統計，市轄機車計210萬餘輛，僅次於新北市，尚不利縮減既有移動污染源，以應節能減碳目標之達成，允宜檢討整體公共運輸規劃及運具配置等情事，經函請檢討改善。據復：1.要求業者提出高齡車輛汰換及電動化轉型規劃，業經陸續提報及依期程、補助條件推進，截至114年3月市轄電動公車占比增為35.8%；2.13處未置租賃站點係因人口密度低或地形陡峭，或囿於交通環境所致，為強化公共運輸接

表1 公車站點鄰近1公里內無腳踏車租賃站點

序號	區名	站名	座標X	座標Y
1	楠梓	玉皇宮	120.343217	22.749445
2	楠梓	旗楠路口	120.345356	22.7475
3	楠梓	萬金松	120.345951	22.747397
4	楠梓	萬金松	120.346305	22.747358
5	楠梓	頂鹽天月宮	120.27675	22.74639
6	楠梓	光華路口（保社里）	120.347677	22.745852
7	楠梓	光華路口（保社里）	120.34782	22.74574
8	楠梓	高鐵總機廠	120.345855	22.759847
9	鼓山	山海宮	120.25421	22.64448
10	鼓山	山海宮	120.25418	22.644474
11	前鎮	紅毛港文化園區	120.318	22.54919
12	鼓山	慈德堂	120.25368	22.647224
13	鼓山	慈德堂	120.253583	22.647336

資料來源：整理自高雄市政府交通局提供資料。

駛服務已擴增站點，以落實城鄉交通平權。

（四） 為確保市公車運輸服務水準，積極提升公車駕駛職業環境，惟間有公車業者修減市轄公車營運計畫，轉至他市縣拓展公車服務，且市轄公車駕駛頻生缺工等情，凸顯市公車營運及經營環境呈窒礙警訊，允宜研謀改善。

交通局為提升市公車服務水準及營運績效暨民眾搭乘公共運輸意願，依汽車運輸業管理規則核定市區汽車客運業營運路線、督導考核汽車運輸者之運輸績效、車輛及員工狀況等。查高雄市公車運輸路線經交通局核准分由統聯汽車客運股份有限公司高雄分公司（下稱統聯客運）等 7 家業者經營，其中漢程汽車客運股份有限公司（下稱漢程客運）係 102 年間承接原高雄市公車處金獅湖站所有路線並持續營運迄今，惟查漢程客運於 108 年間加入臺南市公車經營行列及陸續營運該市 7 條路線，並自 111 年 10 月陸續修減其經營之高雄市 33 及 82 公車路線營運計畫，該等路線報經交通局核定，暫由統聯客運或高雄汽車客運股份有限公司代為行駛，嗣 113 年 3 月 26 日各該路線經高雄市市區客運審議會決議授權交通局釋出重新徵求經營業者，凸顯市區公車經營環境難符業者期待。復因疫後旅遊及運輸業復甦，相關業者屢以高薪招攬司機，造成六都公車頻傳「駕駛荒」，據交通局統計，113 年 8 月底市區汽車客運駕駛編制人數計 956 人，惟現職人數僅 796 人，駕駛缺額達 160 人，約 16.74%。另因臺南市公車單程票價 18 元優於高雄市同項金額 12 元，部分業者基於趨利動機，已至臺南市拓展相同業務並持續增加經營版圖，益徵高雄市公車營運存服務量能及持續發展之窒礙警訊，允宜依相關規定積極瞭解業者之營運情形及員工勤務，妥處缺工問題，經函請檢討改善。據復：已積極爭取中央經費支持「提升公車駕駛職業環境」政策，期留任人才，並主動配合交通部徵才活動，協調勞工局開辦原住民與新住民大客車駕訓班，及督導業者於校園等進行宣傳招募，將持續觀察各業者駕駛缺員情形，掌握人力配置與需求變化，研擬因應措施，以確保市區公車營運穩定與永續發展。

（五） 陸續增置公共自行車數量或租賃站點，使用人次漸增且整體服務滿意度逾 9 成，惟間有站點無車可借等侯時間滿意度大幅下降，復未妥適評估設站之預期效益，允宜檢討增站評估及移設機制，俾提升公共資源使用效益。

交通局為便利民眾銜接各項公共運輸之最初與最後一哩路，並鼓勵其使用綠能運具以建構低碳城市，提升公共自行車租賃系統及服務量能與品質，自 109 年 3 月起委託微笑單車股份有限公司提供全新 YouBike2.0 系統及設備服務，營運期間 7 年（109 年 6 月至 116 年 6 月底止），原合約金額 5 億 7,898 萬元，期間並為擴站所需辦理後續擴充增站（柱）及車輛。截至 113 年底止，已設置 1,392 處租賃站，投入 1 萬 3,000 輛公共自行車，經查高雄市公共自行車租賃系統

營運及建置管理服務工作執行情形，核有：1.公共自行車使用人次漸增，且據 112 年度 YouBike 服務滿意度問卷調查結果，整體服務滿意度達 9 成 5，惟其中「無車可借等候時間」滿意度僅有 7 成 7，較前 3 年度（109 至 111 年度）約維持於 9 成 4 存大幅下降情事，且經於高雄市城市資料平台擷取 113 年 9 月間各租賃站可借還車輛數之即時資訊分析，發現間有站點於部分時段經常缺車，或瀕臨無車（僅餘 1 輛車），或未能配合大眾運輸系統營運時間妥為增補等情，允宜檢討研謀善策因應；2.針對部分站點長時間僅餘 1 輛車可借情形，允宜考量列為示警項目，並參酌各站點歷史借用數據分析是否存有故障車未即時排除情事，以利主動處理，減少民眾使用不便；3.為完善公共運輸路網持續投入經費擴增租賃站點及車輛規模，惟依據 113 年 5 至 8 月民眾借還車資訊分析各站點使用情形，借還次數合計介於 235 萬餘人次至 300 萬餘人次間，其中借還日平均人次低於 68 人次之站點計有 898 站（表 2），約占日平均營運站點總數 1,282 站之 7 成；另日平均未達 10 人次者計有援中港濕地公園等 144 站，整體顯示部分站點日平均借還量偏低，使用情形未臻理想，有待通盤檢討站點設置或移設之評估機制，以提升公共資源效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.持續增站增車，以應使用需求及形成鄰近站點互補效果，降低單站無車或餘 1 輛車情形，同時要求承商增加調度車與人力及調整夜間排班制度，並導入大數據預測機制，依據歷史需求動態調整補充車輛；2.已要求營運商簡化 APP 使用者通報介面，提升故障車之回報意願，及設立專責人力進行故障車輛檢修作業，並建立長時間未借車輛通報機制，以提升檢修效率，並不定期查核車輛妥善率，以強化服務品質監督；3.為有效擴大服務範圍，已訂定明確設站評估基準，另持續透過數據分析及地方會勘等機制，調整租借人次長期偏低站點，未來持續滾動檢討。

表 2　113 年 5 至 8 月之日平均借還量低於 10 人次情形

單位：站、%

使用人次區間	站數	累計站數	累計站數比率
合計	898		
1 人次以上未達 2 人次	1	1	0.11
2 人次以上未達 3 人次	13	14	1.56
3 人次以上未達 4 人次	21	35	3.90
4 人次以上未達 5 人次	20	55	6.12
5 人次以上未達 10 人次	89	144	16.04
10 人次以上未達平均人次	754	898	100.00

資料來源：整理自高雄市政府交通局提供資料。

（六）　為達減碳目標，推廣多元綠能共享運具，惟部分行政區尚乏業者提供共享運具服務，或運具租借數呈逐年下降趨勢，允宜研謀因應措施，以保障民眾交通權益。

交通局為發展都市生態交通，提供綠色運輸服務，以達減碳目標，推動新型態共享交通工具，訂定高雄市共享運具發展管理自治條例等規定，供業者申請路邊或私人開放空間等區域設

置共享運具服務區之依循，提供民眾租借串聯大眾運輸，復考量共享運具投放數量及使用次數日增，於 110 年 6 月明定共享運具保險內容。經查共享運具推廣情形，核有：1.參考公有停車格數量及臺北市共享運具總量標準，訂定共享汽車及機車（含自行車）限額為 1,000 輛及 1 萬輛，惟截至 113 年 8 月底止，僅核發 6 家業者營業許可，明定共享汽車及機車投入上限量為 350 輛及 3,717 輛，服務範圍涵括苓雅等 27 個行政區，又業者實際投入營運量為 350 輛及 2,919 輛，僅占共享汽車及機車之限額 35.00%及 29.19%，且部分行政區尚乏共享服務，亦無設置公共自行車租賃站（表 3），不利民眾使用公共運輸串聯接駁，有待研謀善策輔導或鼓勵業者調增營運範圍，俾提供適足公共運輸服務；2.分析 111 年至 113 年 8 月底，6 家共享運具業者營運資料結果，月平均租借數分別為 19 萬 4,164 次、15 萬 4,569 次、12 萬 8,640 次，呈下降趨勢，有待檢討問題癥結研謀具體因應措施等情事，經函請檢討改善。據復：1.截至 114 年 3 月底止，已核准共享電動汽車及機車各 350 輛及 2,645 輛，而實際投放約 5 成，係因部分車輛調度或維修，尚待檢修完成始得陸續投入營運，另研擬提供低保證金及權利金額度等優惠措施，以強化服務可近性及營運誘因；2.已開發「高雄 iBus+ App」整合公車等各類運具資訊，並納入共享運具租借連結，期擴大公共運輸服務範圍。

表 3　各行政區共享運具設置情形

單位：家、站

項目／區名	業者提供共享運具			公共自行車租賃站	項目／區名	業者提供共享運具			公共自行車租賃站
	汽車	機車	自行車			汽車	機車	自行車	
合計	24	47	9	1,363					
苓雅	1	5	1	95	甲仙	1	—	—	1
三民	1	4	1	152	岡山	1	—	—	57
左營	1	4	1	127	美濃	1	—	—	4
前金	—	4	1	35	梓官	1	—	—	11
前鎮	1	4	1	121	路竹	1	—	—	21
新興	1	4	1	31	旗山	1	—	—	10
鼓山	1	4	1	101	燕巢	1	—	—	10
鳳山	1	4	1	166	彌陀	1	—	—	8
鹽埕	1	4	1	22	大社	—	—	—	7
楠梓	1	3	—	127	內門	—	—	—	—
鳥松	1	2	—	29	田寮	—	—	—	—
橋頭	1	2	—	30	杉林	—	—	—	—
旗津	—	2	—	10	那瑪夏	—	—	—	—
大寮	—	1	—	29	林園	—	—	—	15
大樹	1	—	—	8	阿蓮	—	—	—	5
小港	1	—	—	72	茂林	—	—	—	—
仁武	1	—	—	39	茄萣	—	—	—	8
六龜	1	—	—	—	桃源	—	—	—	—
永安	1	—	—	3	湖內	—	—	—	9

備註：1.資料期間：截至 113 年 8 月底止。
2.資料來源：整理自高雄市政府交通局提供資料。

（七）　高雄市輪船股份有限公司肩負以企業化經營原則，發展河港交通運輸服務，惟間有獎金發放存適法性疑義或營運獎金發放要點與實務未臻契合，亟待研謀改善，俾健全經營體質及強化管理機制。

高雄市輪船股份有限公司（下稱輪船公司）依市政府車、船分立政策，於 94 年 1 月成立，肩負企業化經營原則，提供市民低廉、便捷、舒適而安全之河港交通運輸服務，並依船

船船員最低安全配置標準配置船務人員（表 4），113 年度總人事費支出（含退休及離職金）9,912 萬餘元。經查人事管理情形，核有：1.依輪船公司設置自治條例（下稱設置條例）保障前身高雄市公共車船管理處（下稱車船處）移撥職工之福利及勞動條件，惟未審酌公司整體財務狀況，逕以未經市政府核定之決議或工作規則作為職工年終及考核獎金之發放準據，復依各該決議發放獎金予非設置條例規範應予保障之職工，獎金發放存適法性疑義；2.訂定輪船公司船務人員營運獎金發放要點（下稱營運獎金發放要點）供業務執行之依循，惟實際扣減項目及金額與規範未合，損及獎酬制度公平性與激勵效果；3.屢遭民眾陳情未依航班航行，惟未研擬具體有效改善措施，容任船務人員遲到影響航班正常營運，損及公司形象；4.未訂定工作績效考評機制報經主管機關核定，逕以管制性項目（員工慰勞費）支應員工獎勵獎金，核發作業有欠周妥；5.訂定工作規則並報經勞動主管機關核備及公開揭示，惟未配合實務運作調整，致同一事項於不同規範之內容迥異，或實際運作準據異於工作規則等情事，經函請檢討改善。據復：1.將檢視相關規定及完善發放標準，提董事會決議並送市政府核定；2.經檢視輪船公司於前身車船處時期之獎金要點及現行規定，有請事（病）假時減發營運獎金之規範，將於勞資會議時納入提案討論，倘需修訂營運獎金發放要點，將提董事會決議後送市政府核定；3.已將員工勤惰情形納入年終考核，並檢討獎金發放之正確性，且予輔導告誡並調整勤務，亦請主管關懷及督促其正常出勤，避免類此情事再生；4.業已檢討未再發放相關獎金，俟彙集各部門意見，研議適切之發放辦法，以激勵員工績效；5.鑑於工作規則涉及勞雇雙方權利與義務，其修訂需經勞資協商，將於勞資會議召開時檢視工作規則與實務運作差異，並逐次修訂後再行陳報主管機關核備。

表 4　船務人員編制與配置情形

單位：人

職稱	編制人數	實際配置人數
合計	68	63
船長（含第2船長3人）	16	15
輪機長	16	13
機匠	14	13
水手	22	22


備註：1.實際配置人數統計日期為 114 年 3 月 31 日。
2.資料來源：整理自高雄市輪船股份有限公司提供資料。

（八）　為提升乘船服務品質，積極汰換船隻，惟經營成效未如預期提升且乘載管控未臻周延，有待檢討改善，以強化經營效能，並確保旅客乘船安全及船舶正常運行。

高雄市輪船股份有限公司 113 年度主要業務計有經營「旗津－鼓山」、「前鎮－中洲」、「旗津－棧貳庫」等 3 航線，並為推展觀光，依船隻行駛範圍，經營海上巴士、3 艘遊港輪及愛河愛之船，且為提升乘船服務品質，爭取經費 1 億 6,000 萬元，辦理新購電力驅動交通渡輪 2 艘及遊港船 1 艘汰舊計畫。據統計，113 年度載客 318 萬 2,544 人次（收益人次），累計營運收

入 8,128 萬餘元。經查各航線經營管理情形，核有：1. 高雄市觀光遊憩據點總到訪人次由 109 年度 2,183 萬餘人次增至 113 年度 6,923 萬餘人次，且駁二藝術特區及旗津風景區遊客人次呈現成長趨勢（圖 2），惟受高雄港觀光服務業者多採削價競爭模式影響，抑制營運收入成長，及公司營運成本居高不下等，致整體經營績效欠佳，顯示經營策略具精進空間。另查截至 113 年底止，公司帳列累積虧損 11 億 6,736 萬餘元，達資本總額 4 億 6,336 萬元之 251.93%，且資產總額 3 億 8,125 萬餘元，僅為負債總額 10 億 8,525 萬餘元之 35.13%，尚不足抵償所有債務，雖曾研擬包括爭取旗津居民乘船補貼、增闢渡輪航線等開源節流措施及債務改善計畫，惟未呈現具體改善成效，尚待就營運策略與財務結構問題檢討改善，以強化經營效能並減低營運虧損，達事業永續發展目標；2. 為應 103 年間經交通局等機關聯合稽查發現，所屬旗鼓 1 號等渡輪超載情事，研訂渡輪站乘客控管機制改善計畫，惟所屬旗鼓 1 號及雄棧 2 號渡輪卻分別於 114 年 1 月 25 日及 26 日發生超載而遭交通部航港局裁處罰鍰，且雄棧 2 號渡輪係屬第 2 次違規，顯示所擬改善措施尚無法有效遏止渡輪超載情事再生，有待落實船舶承載人車數量管制措施，以確保旅客乘船安全及船舶正常運行等情事，經函請檢討改善。據復：1. 自 111 年起針對既有航線進行觀光轉型計畫，並持續檢討票價結構及依目前觀光人潮拓展其他航線，導入新主題及創意方案，規劃遊港船 IP 聯名計畫及依營運狀況制定行銷策略，期增加營收及運量；2. 渡輪登船方式為行人及機車 2 通道，管控具複雜度，且適逢春節連假，人潮湧入，致生超載情事，已研擬各航班暫以限載人數 80%控管登船數及研辦增設電子自動化技術等改善措施。

圖 2　旗津風景區及駁二藝術特區 3 遊憩據點遊客到訪趨勢

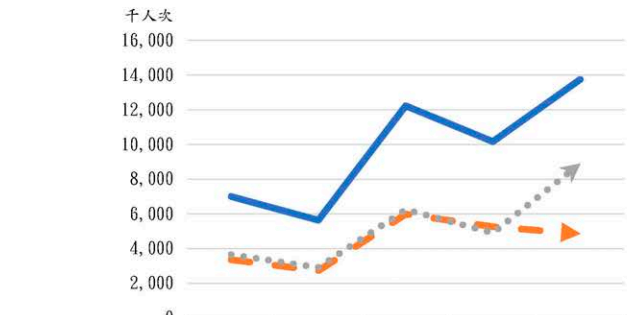

	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
合計	6,993	5,628	12,222	10,162	13,746
旗津風景區	3,354	2,721	5,977	5,257	4,852
駁二藝術特區(註1)	3,639	2,906	6,244	4,904	8,894

註：1. 棧貳庫緊鄰駁二藝術特區。
2. 資料來源：整理自交通部觀光署觀光統計資料庫網站資料。

五、112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見 8 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者 1 項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者 7 項（表 5），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見 1 項通知檢討改善。

表 5　112 年度審核報告所列交通局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題	說明
仍待繼續改善	
定期辦理大眾運輸營運與服務評鑑作業，惟未依規定設置評鑑委員會及前期評鑑缺失改善指標之配分偏低，難以促使業者積極改善，允宜檢討精進，以督促落實提升服務品質及執行成效。	因評鑑缺失改善情形未如預期，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二）」。
已研謀改善或依改善措施持續辦理	
（一）持續辦理交通環境改善及宣導教育，制訂交通事故防制計畫執行，惟高齡者及機車族群交通事故死傷人數偏高，部分易肇事熱點未能有效改善，亟待研謀因應措施，提升樂齡族群及機車行車安全。	
（二）爭取前瞻基礎建設計畫經費興建停車場，以改善停車空間不足問題，並滿足轉乘及觀光停車需求，惟計畫執行情形未臻周延，允宜注意檢討改善，俾提升計畫執行成效。	
（三）興建高雄高工立體停車場，解決大順路沿線停車問題，並提供捷運輕軌全線通車轉乘停車功能，惟部分施工管理未盡周妥，且屋頂設置太陽能光電設施標租作業與工程期程未能配合，允宜研謀改善。	
（四）推動新一代智慧運輸系統及提升使用需求之交通行動服務 MaaS 計畫，惟部分路側設備妥善率欠佳，無法與交通控制平臺連線，及交通服務計畫執行情形未臻周延，亟待研謀善策妥處，以提升路側設備管理效率及計畫執行效益。	
（五）建置公車候車亭相關設施，提供旅客舒適候車空間，惟部分設施未考量行動不便者或身障者實際需求，設置無障礙候車空間，或未妥適維護管理，允宜研謀改善措施，以打造友善親切之無障礙運輸環境。	
（六）高雄市輪船股份有限公司配合市政府執行旗津區居民免費乘船公共政策，解決旗津區居民行之問題，惟因渡輪營運未能有效改善虧損及旗津卡票券管控作業未臻落實，致長年虧損未償債務居高不下，允宜研謀改善，以提振營運效能。	
（七）爭取中央及市政府補助電力驅動渡輪汰舊計畫經費，提升服務品質，惟前置規劃作業未臻完善，延宕委外建造期程，且電力驅動渡輪實際建造進度較計畫辦理期程落後，有待加強督導與管控施工進度，以達計畫執行效益。	

貳拾、海洋局主管

海洋局主管僅海洋局 1 個機關，掌理高雄市各項海洋事務、輔導海洋產業、海洋休閒遊憩、防治海洋污染、維護海洋生態、海洋環境監測及保護、魚市場業務輔導、漁港規劃建設等事項。茲將 113 年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容說明，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一） 計畫實施之查核

業務計畫 7 項，下分工作計畫 9 項，包括市轄漁港清潔管理及設施維護修繕；辦理海洋污染防治稽查；行銷高雄市遊艇業與海洋城市特色，促進海洋產業發展；推動郵輪母港政策，發展郵輪產業經濟；推廣各區漁會特色漁產品及行銷大宗漁獲；執行各項水產品安全檢驗及查驗工作；輔導漁會加強組織系統健全會務；辦理漁業養殖區修建工程等重要施政項目，其中已執行完成者 6 項，尚在執行者 3 項，主要係彌陀漁港及海岸光廊環境改造整建統包工程等尚未完工，須保留續予執行。

（二） 預算執行之審核

1. 歲入預算數 3 億 6,823 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 3 億 5,305 萬餘元，應收保留數 1,402 萬餘元，主要係中央補助辦理 112 年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善（第二期）等工程，依實際執行進度撥款，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為 3 億 6,707 萬餘元，較預算減少 115 萬餘元（0.31%），主要係中央補助辦理刺網漁業輔導轉型等計畫，核定數較預計減少。

2. 以前年度歲入轉入數計 5 億 1,253 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 3 億 3,671 萬餘元（65.70%）；減免（註銷）數 131 萬餘元（0.26%），主要係違反漁港法之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數 1 億 7,450 萬餘元（34.05%），主要係中央補助辦理 112 年興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善等工程，依實際執行進度撥款，尚未核撥數須保留續予執行。

3. 歲出原編列預算數 11 億 2,364 萬元，因補助梓官區漁會辦理冷凍廠設施整修計畫等事由，經動支第二預備金 1,529 萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備 109 萬餘元，合計 11 億 4,002 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 9 億 5,427 萬餘元（83.71%），應付保留數 1 億 3,752 萬餘元（12.06%），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 10 億 9,179 萬餘元，預算賸餘 4,823 萬餘元（4.23%），主要係中芸漁港漁筏泊區興建等工程結餘。

4. 以前年度歲出轉入數計 6 億 4,871 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 4 億 5,360 萬餘元（69.92%）；減免（註銷）數 3,440 萬餘元（5.30%），主要係旗津漁港深水碼頭浚挖等工程結餘；應付保留數 1 億 6,070 萬餘元（24.77%），主要係興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善等工程尚未完工，須保留續予執行。

（三） 重要審核意見

1. 為兼顧文史建物活化及觀光發展，承租土地辦理鼓山魚市場整建計畫，惟事前規劃及執行情形未盡理想，尚未達成自償性目標，有待檢討改善。

鼓山魚市場位於鼓山區哈瑪星聚落，與鼓山輪渡站為鄰，位居觀光及交通要道，海洋局為兼顧文史建物活化及觀光發展，向高雄區漁會及國有財產署南區分署承租原第一拍賣場舊址及港埠土地，辦理鼓山魚市場整建活化計畫，預算金額 1 億 9,700 萬元，規劃改建為「高雄農漁精品展售中心」，期結合海洋資源及魚市場百年文化價值，帶動哈瑪星經濟發展。惟該中心開幕後經營成效欠佳，前經本處通知允宜活用魚市場百年歷史意涵，提升旅客參訪誘因以永續經營，嗣經該局更換承租廠商，於 114 年 3 月以「新濱町海洋廚房」名稱重新開幕營運（表 1）。經查辦理情形，核有：（1）辦理重要施政計畫，未依規定事先就整建活化之執行策略、營運方式、財務分析及預期效益等面向進行完整評估，以作為後續經營管理參考，致投入政府資源整建結果，尚未達成自償性目標；（2）辦理依文化資產保存法列冊追蹤之鼓山魚市場信用部建物牆面整修，未依規定事先通報審查，恐造成文化資產損毀；（3）棧貳庫至鼓山魚市場觀光廊道景觀單調且無遮蔭及導覽，不易吸引駁二藝術特區遊客到訪該中心，雖規劃推動哈瑪星舊濱線至文龍宮（捷運站至輪渡站）之景觀廊帶以便利民眾運用大眾交通工具前往，惟尚處於研議階段；（4）為推廣高雄市優質水產品及行銷鼓山魚市場，辦理海味市集活動，惟成效有限，且水產相關攤位數僅約占全部攤位數之四分之一，與活動目的未盡相符；（5）所承租國有財產署土地已有部分面積遭占用，未來恐衍生需代為繳納使用補償金之風險，亟待預為妥謀善策因應等情事，經函請檢討改善。據復：（1）爾後辦理重要施政計畫將依規定事先就執行策略、營運方式、財務分析及預期效益等面向進行完整評估，以作為後續經營管理參考；（2）已辦理補送程序並經文化局備查，後續再有其他裝修或使用計畫，將依文化資產保存法規定辦理；（3）將持續整合市政府相關局處資源，改善棧貳庫至鼓山魚市場沿線景觀設施，以完善人行環境、營造友善觀光動線；（4）未來將於活動主題及攤位組成上加強整體一致性與識別度，並輔導該中心

表 1 鼓山魚市場整建營運大事記

年月	事項
110/07	海洋局承租高雄區漁會土地
110/10	鼓山魚市場整建活化計畫統包工程開工
111/07	海洋局與南仁湖育樂股份有限公司簽訂租約
111/10	鼓山魚市場開幕試營運
112/01	正式營運
112/09	暫停營運
112/12	重新開幕營運
113/05	海洋局取得南仁湖育樂股份有限公司同意終止租約
113/08	海洋局與漢來國際物業管理顧問股份有限公司簽訂租約，並與南仁湖育樂股份有限公司解約
113/09	鼓山魚市場暫停營運
114/03	新濱町海洋廚房開幕

資料來源：整理自高雄市政府海洋局提供資料。

建立合適之定位，落實活化舊有之鼓山魚市場場域，建立新形態以海洋文化結合休閒遊憩之政策目標；(5) 現正整體評估鼓山輪渡站減量設計可行性，並研議拆除部分阻隔建物，另同步與高雄區漁會協調及研議相關處理機制。

2. 為減少海洋垃圾對海域環境及海洋生物之危害，辦理海底（漂）垃圾清除及廢漁網回收再利用計畫，惟相關計畫辦理情形核有欠妥，有待檢討改善。

臺灣永續發展目標之具體目標 14.1 揭示：「減少各式海洋污染，包括營養鹽及海洋廢棄物。」海洋局為強化海洋廢棄物治理，減少海洋垃圾對海域環境及海洋生物之危害，委商辦理 113 年度高雄市推動活力海洋計畫，及各漁港廢漁網回收再利用計畫，截至 113 年底止，計清除 250 公斤海底垃圾及回收 49.785 公噸廢漁網（表 2）。經查辦理情形，核有：(1) 111 至 113 年度高雄市加入環保艦隊之漁船為 660 艘，惟實際攜回海底（漂）垃圾僅 4 至 7 艘，占總數 0.61%至 1.06%，尚待檢討漁船參與意願偏低原因；(2) 環保艦隊獎勵金（品）之領取單非由受獎人親自簽收，或部分漁民廢漁網兌換獎勵品數量超逾規定；(3) 廢漁網回收登記清冊所載兌換禮券有編號重複、張數不符、起訖編號前後倒置等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 因多數船主不願將垃圾帶至堆置區，將研議其他替代方案，以提升漁船攜回海底（漂）垃圾意願；(2) 將研擬倘未由本人親自簽領，以授權書方式同意代領，另漁民兌換數超逾上限係因其家人申領時誤填已領取人資料，嗣後將詳加審核；(3) 將加強督促承商切實登記漁網回收兌換資料並詳加審核。

表 2 各漁港廢漁網回收情形

單位：公噸

名　稱	回收數量
合計	**49.785**
旗津漁港	14.966
中芸漁港	14.653
蚵子寮漁港	9.376
彌陀漁港	2.750
旗后漁港	2.700
上竹里漁港	1.972
興達漁港	1.013
中洲漁港	0.981
鳳鼻頭漁港	0.959
小港臨海新村漁港	0.415

資料來源：整理自高雄市政府海洋局提供資料。

3. 為維護漁港航道進出及船隻安全，辦理各漁港漂流物清除處理工作，惟廠商未依契約規定開工時間進場施工、漂流木堆集於汕尾漁港遲未棄運，有待檢討改善。

海洋局為預防颱風、豪雨等天然災害致漁港內流入浮木及漂流物，妨礙漁港航道進出及影響船隻安全，辦理 113 年度高雄市轄各漁港浮木、漂流物清除處理工作（開口契約）採購案，截至 113 年底止，計清理 45.26 公噸。經查辦理情形，核有：(1) 依施工說明規定，廠商應於接到通知起 24 小時內，依機關指示將搶修機具及器材運至指定救災搶修（險）地點，及依機關

指定之數量及地點，派遣符合規定之救災機具勞務人員報到工作，惟經查有廠商未依契約規定時間進場清除漂流物；(2) 依契約規定，漁港漂流木清除作業係先行堆集於汕尾漁港，後續再進行清除及棄運處理，惟因廠商處理量能不足，致未能於契約期間完成漂流木去化，截至 114 年 3 月底止尚有百餘公噸堆集於汕尾漁港港嘴處，影響環境衛生等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 將於廠商最後一期請款作業時辦理扣罰，並依政府採購法不良廠商處置作業原則規定，將該廠商刊登公報；(2) 已辦理漂流木清除作業招標並已清除完畢。

4. 為提升漁業整體環境，發揮漁港功能及促進養殖產業永續經營，辦理各項漁業設施整建工程，惟工程數量編列未盡覈實、保險單附加條款限縮承保範圍、職業安全衛生人員同時兼任他案工地，尚待加強履約管理。

海洋局為提升漁業整體環境，確保漁船停泊安全、發揮漁港功能，及改善水產養殖區排水問題，促進養殖產業永續經營，以提升漁業生產、增加漁民收入，113 年度編列預算辦理漁業工程規劃及修建計畫，加強整建各項漁業設施。經查辦理情形，核有：(1) 工程契約部分項目編列數量未盡覈實，細部設計（施工）圖示與結構計算書設計分析成果未盡相符；(2) 營造安裝工程財物綜合保險單附加條款限縮承保範圍或契約對保險之要求，風險未透過保險適當轉移；(3) 職業安全衛生人員同時兼任他案營造工地等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 將確實檢核並依實際施作數量結算，後續辦理勞務結算時再依據契約相關規定妥處，檢討設計疏失責任；(2) 營造廠已函文保險公司協助說明，將依保險公司函文結果研議後續處置方式；(3) 因承商品質計畫資料誤植，已於公共工程雲端服務網進行修正。

（四） 112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見 6 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者 1 項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者 5 項（表 3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見 1 項通知檢討改善。

表 3 112 年度審核報告所列海洋局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題	說明
仍待繼續改善	
為活化頹廢老舊鼓山魚市場，投入鉅資整建並委外經營，惟營運結果不如預期，尚待活用魚市場百年蛻變歷史意涵，強化旅遊深度，以提升遊客參訪誘因，結合在地產業永續經營，重拾昔日榮景。	鼓山魚市場整建計畫事先規劃及執行情形欠周，尚未達成自償性目標，業再研提審核意見詳「(三) 重要核意見 1.」。

表 3　112 年度審核報告所列海洋局主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

重要審核意見標題	說明
已研謀改善或依改善措施持續辦理	
1. 持續配合農業部漁業署推動前鎮漁港建設專案中長程計畫，辦理漁港碼頭整建及魚市場改善工程，惟部分工程計畫推動進度未如預期，影響整體計畫期程，及採購契約訂定未盡周妥，允宜研謀改善，期提升漁港競爭力及產銷與觀光效益。	
2. 為發展遊艇休閒觀光活動促進地方產業升級，積極規劃建置友善遊艇停泊及相關設施，惟遊艇泊位數未能容納轄內遊艇登記數，允宜持續檢討開發，與結合漁港周邊觀光資源及交通配套措施，以健全遊艇遊憩環境，繁榮地方經濟。	
3. 為帶動遊艇製造及周邊服務產業成長，發展藍色海洋經濟，辦理高雄海洋派對活動，惟部分執行情形與需求書規定未合、活動結束未進行效益分析以作為嗣後辦理參考，尚待研謀改善。	
4. 推動郵輪產業帶動地方觀光產業，提升國際能見度，惟郵輪航次及旅客人次未見穩定成長、郵輪觀光服務主責機關眾多且部分業務重疊，允待檢討改善。	
5. 為維護海洋生態及漁業資源，積極輔導主（兼）營刺網漁船轉型，惟未訂定刺網漁業管理規範、刺網漁業轉型進度緩慢，允待檢討改善。	

（五）　其他事項

海洋局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於 113 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 30 日間同意備查者，摘述如次：

海洋局辦理中芸整補場及港區環境改善工程暨管理情形，核有：新建中芸漁港漁具倉庫，已知存有建造執照未取得問題，卻未事先排除或修正計畫，積極依法研處，仍依原規劃辦理設計監造及發包施工，致耗費巨資興建之設施形成公有大型違建，影響政府施政形象；新建漁具倉庫逾年餘，未能有效整合漁民意見，屢次辦理改善工程，仍未切合漁民實際需求及承租意願，規劃執行欠周，耗費公帑卻未取得應有效益；又未取得使用執照，即將部分倉庫出租予漁民使用，亦未依法建置相關消防安全設備，衍生消防及公共安全問題，提高使用漁民及民眾生命財產安全風險等未盡職責及效能過低情事，經依審計法第 69 條第 1 項前段規定，函請高雄市市長查明妥適處理，並報告監察院。嗣經市政府研提：未取得使用執照部分，已陸續完成鑑界、建管建築線指定，並同步辦理臨時建物許可作業；新建完成漁具倉庫已與漁民完成訂約並全數進駐使用；有關消防設備部分，已於現場設置攝影機、滅火器等設備，以防止意外產生等。案經本處函報審計部陳報監察院，於 113 年 11 月 15 日獲同意備查。

貳拾壹、都市發展局主管

都市發展局主管計有公務機關 1 個，非營業特種基金單位 2 個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

都市發展局主管僅都市發展局 1 個機關，掌理全市重大建設發展及政策規劃，配合改善市民環境品質之都市發展政策，進行都市更新、都市設計、都市開發、社區規劃等業務之推動。茲將 113 年度決算審核結果說明如次：

（一） 計畫實施之查核

業務計畫 3 項，下分工作計畫 3 項，包括辦理都市發展業務、都市規劃設計及更新業務等重要施政項目，其中已執行完成者 2 項，尚在執行者 1 項，主要係社區規劃師駐地輔導及高雄市鳳山區五甲（含中和）國宅更名登記執行等計畫期程跨年度，須保留續予執行。

（二） 預算執行之審核

1. 歲入預算數 10 億 8,195 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 7 億 822 萬餘元，應收保留數 2,995 萬餘元，主要係高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫數尚待收繳；合計決算審定數為 7 億 3,818 萬餘元，較預算減少 3 億 4,376 萬餘元（31.77%），主要係高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫數未如預期。

2. 以前年度歲入轉入數計 1 億 2,239 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 497 萬餘元（4.06%）；減免（註銷）數 203 萬餘元（1.66%），主要係違反都市計畫法之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數 1 億 1,539 萬餘元（94.28%），主要係高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫數尚待收繳。

3. 歲出原編列預算數 3 億 4,762 萬餘元，因人事費不足，動支各類員工待遇準備 1,343 萬餘元，合計 3 億 6,106 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 3 億 1,958 萬餘元（88.51%），應付保留數 272 萬餘元（0.76%），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 3 億 2,231 萬餘元，預算賸餘 3,874 萬餘元（10.73%），主要係增額租金補貼及首購族購屋貸款利息補貼等計畫之申請、核定戶數未如預期致結餘。

4. 以前年度歲出轉入數計 532 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 162 萬餘元（30.60%）；減免（註銷）數 44 萬餘元（8.29%），主要係註銷高雄市社區規劃師駐地輔導計畫依實作數量結算之賸餘；應付保留數 325 萬餘元（61.11%），主要係新訂燕巢大學城特定區計畫（含地形圖重製）案履約中，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

都市發展局主管作業基金，計有高雄市城鄉發展及都市更新基金、高雄市住宅基金等 2 個單位。茲將 113 年度決算審核結果說明如次：

（一） 計畫實施之查核

營運計畫主要有辦理都市計畫都市更新規劃、公共及社區環境改善計畫、補助自行辦理實施更新事業、國民住宅及公營住宅出租收入等 4 項，實施結果，計有辦理都市計畫都市更新規劃、公共及社區環境改善計畫及國民住宅與公營住宅出租收入等 3 項，因都市更新事業輔導計畫期程跨年度，依執行進度結算核銷；或公辦都更規劃暨招商案因增加工項及招商進度落後，實際支出較預計減少；或凱旋青樹社會住宅未全數出租，致收入未達預計目標。

（二） 餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘 4,801 萬餘元，較預算賸餘 564 萬餘元，增加 4,237 萬餘元，主要係左營眷村都更案增辦工項致進度延後、北高雄科技走廊發展軸發展策略及土地使用檢討等規劃案配合政策延辦，及岡山、大寮與左營等公有土地都更案招商未如預期，相關支出較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一） 為落實居住正義，訂頒住宅審議會設置要點，惟未召開審議會議，復未妥為評估社會住宅需求總量，且計畫執行未達內政部所訂預期目標，均待檢討改善，俾落實政府平穩住宅供需市場及安定人民居住之目標。

市政府為落實居住正義，陸續由都市發展局規劃運用高雄市住宅基金興建或整建既有房舍供社會住宅使用，於 108 年 6 月 21 日訂頒「高雄市政府住宅審議會設置要點」（下稱住宅審議會設置要點），以應諮詢、審議住宅計畫、評估經濟或社會弱勢者入住比率及區位分布、評鑑社會住宅等事務。截至 113 年底止，都市發展局計興辦完成鳳山共合宅、五甲國宅、前金警察宿舍（亦稱大同社會住宅）及凱旋青樹（圖 1）等社會住宅計畫；另三民區新都段等社會住宅興建計畫仍執行中。經查社會住宅計畫推動情形，核有：1.住宅審議會設置要點頒布後至 113 年底止，迄未邀集相關機關、民間團體及專家學者召開審議會議，有待檢討強化住宅計畫之審議及評估，俾切合民眾對社會住宅之需求，落實政府安定人民居住之目標；2.賡續推動社會住

圖 1　凱旋青樹社會住宅



資料來源：整理自高雄市社會住宅資訊網站資料。

宅興建計畫，惟未妥為評估轄內住宅需求總量或迫切優先協助照顧之對象，又截至 113 年 9 月底止規劃自行辦理之社會住宅計 2,124 戶，僅達內政部社會住宅興辦事業計畫（第三期，核定本）所訂市政府社會住宅興辦目標 1 萬 2,000 戶之 17.70%，復據統計市轄住宅存量餘裕且低度使用（用電）比率冠居六都直轄市，惟未檢討研議運用既存住宅資源或擴大獎勵民間興辦社會住宅之可行性，以減低居住需求者等待時間，有待檢討，俾覈實彰顯住宅業務之推動及執行成效；3. 為復甦都市機能，於 107 年間規劃運用經費 3 億 4,728 萬元辦理三民區新都段公營出租住宅計畫，惟未先行製作選擇方案或替代方案之成本效益分析報告，致計畫期程及經費歷經多次展延及調增，截至 113 年底止仍未完成工程發包，有待檢討、周延重大建設計畫前置作業，並積極辦理工程後續事宜，俾兼顧財務紀律及發揮計畫效能等情事，經函請檢討改善。據復：1. 將檢視調整住宅計畫，俟提出初步修正內容，並彙整待審議或提供諮詢議題，再召開審議會；2. 規劃 114 年度辦理高雄市住宅計畫委託研究案，檢視住宅課題及對策，分析近年住宅與家戶供需現況、區位及趨勢，同時估算各社會住宅推動方案成本，另透過公辦都更等方式取得社會住宅及其用地，並持續檢視財政，逐步充實住宅戶數；3. 爾後規劃新案將確實製作選擇方案或替代方案之成本效益分析報告，並研擬物價上漲或工程流標因應方案，另已採統包方式重新招標，將與專案管理廠商共同強化監督執行進度。

（二）　賡續推動社會住宅興建計畫，並兼顧提供身心障礙者適宜之住宅，惟已新建完成之社會住宅，公共空間未妥為規劃設置無障礙設施，或設施管理未臻周延，有待檢討改善，以落實維護身心障礙者權益，並確保住戶之居住品質及設備妥善運用。


為提供適宜青年及弱勢族群居住之住宅，以落實居住正義，都市發展局陸續規劃運用高雄市住宅基金興建或整建既有房舍供社會住宅使用。截至 113 年底止，累計投入 12 億 5,851 萬餘元興辦完成鳳山共合宅、五甲國宅、前金警察宿舍（亦稱大同社會住宅）及凱旋青樹等社會住宅，計有 367 戶已營運出租。經查社會住宅營運管理情形，核有：1. 截至 113 年 9 月底止，凱旋青樹社會住宅已提供 25 戶予身心障礙者入住，惟住宅頂樓（空中花園）出入口設置門檻，又部分樓層配置供公眾使用廁所係採推門設計且空間狹小，影響身心障礙者進出或使用；2. 訂定社會住宅生活管理公約，供維護住戶共同利益，確保良好生活環境之依循，惟部分公共區域屢

散發香菸燃燒味，且生活管理公約訂定之菸害防制措施，相較其他直轄市尚有未足，有待標竿學習強化社會住宅之菸害防制機制；3.據行政院主計總處統計，南部地區消費者物價指數（房租）年增率已由 108 年 0.80%增至 113 年 9 月之 2.95%，增幅達 268.75%，惟遲未因應物價變動檢討調整已出租逾 3 年社會住宅之各項收費標準，以提升高雄市住宅基金營運成效；4.為因應凱旋青樹社會住宅地下停車場收費需求，陸續增設停車場設施並置停車費自助繳費機 1 臺，惟自助繳費機設備逾年餘仍閒置未使用，有待檢討妥處，以發揮設備使用效能等情事，經函請檢討改善。據復：1.因凱旋青樹社會住宅係 107 年完成設計，早於內政部營建署於 108 年社會住宅規劃設計之相關參考手冊，爰未取得無障礙住宅標章，後續新建其他社會住宅時，已採用「建築物無障礙設計規範」規定設計及興建公共廁所；2.應租戶需求，於戶外空曠地置吸菸區，後續租戶反映類似案件已大幅減少，另於租約換約時一併修訂生活管理公約，提高違規抽菸罰扣點數；3.於 114 年修正財務計畫時，一併檢視修正社會住宅租金及調漲機制，以兼顧社會住宅興辦效益及財務狀況良性循環；4.配合租戶對機車位需求，已規劃部分汽車格位變更為機車位，致無多餘汽車位可供出租，衍生自助繳費機未用情事，後續將配合社會住宅規劃移至其他社會住宅使用。

（三） 推動閒置活化空間再利用，申請中央無償撥用燕巢橫山營區基地及建築物，惟撥用多年部分空間仍閒置，復未妥善管理維護，致部分已修繕設備頹壞或空間未依用途使用，有待檢討妥處，以積極發揮財物應有效能。

都市發展局為興辦提供具特殊情形或身分市民居住之住宅，並推動閒置空間活化再利用政策，於 105 年 9 月間向行政院申請並經核准撥用燕巢橫山營區共創基地（含基地內建築物及土地改良物），面積約 1.69 公頃，供社會住宅（含相關附屬公共設施）使用，嗣為利長期發展，使大專院校師生透過基地參與社區營造實務，打造北高雄社造培力及創意共創基地，辦理基地環境改善及營舍修繕暨場域經營管理維護事宜，並於 107 年 9 月 28 日向行政院申請變更用途，同意供作社區營造辦公室及相關附屬設施使用，預計 108 至 109 年完成全部房舍修繕。截至 113 年底止，累計辦理相關工程及維護支出 3,010 萬餘元。經查燕巢橫山營區共創基地再造情形，核有：1.陸續投入經費辦理環境改善計畫及申請變更財產使用用途，期活化場域，

圖 2 燕巢橫山營區共創基地開放情形

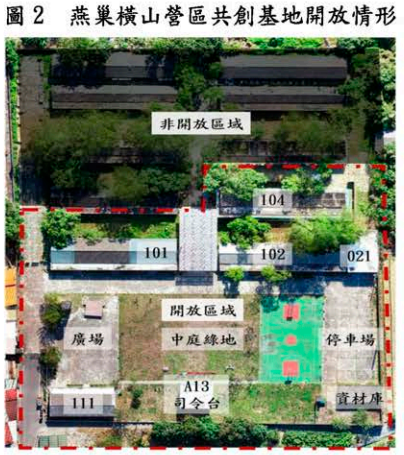

資料來源：整理自高雄市政府都市發展局提供資料。

惟迄 113 年底止仍未依限完成全數房舍修繕開放使用（圖 2），又部分空間因閒置且疏於維護致嚴重毀損，未能發揮財物應有效能；2. 部分空間或設施經整修完竣，僅供舉辦臨時或短期活動之用，遲未妥擬具體營運計畫，又部分已整修設施再生荒廢或頹壞情事，且部分場地續供特定單位使用多年，迄無研擬使用收費機制，減損公庫收入並衍生使用公平性疑慮等情事，經函請檢討改善。據復：1. 嗣投入經費及人力逐步完成公共開放空間整理及局部營舍修繕，並於整理完成後開放使用，貼近在地需求，另依 114 年 4 月市政府相關人員督導建議，持續將閒置空間轉為無毒友善農園及推行社區養蜂，以活化場域；2. 近來到訪基地人次已緩步成長，另考量基地使用方式、市場行情及整體尚未整備完善等因素，現階段以使用者自負場域衍生相關費用代替場地使用費，並規劃結合社區、產學合作，以共同推動淨零減碳、綠色永續發展目標，將公有建築及場域提供公益、公共或社區營造與創生培力使用，另已督請使用單位對空間使用未合用途或設施毀損部分限期改善或研議修復。

（四） 積極推動包租代管計畫，成功媒合案件呈成長趨勢，惟媒合成功案件多集中於市區，而部分有租屋需求之行政區，卻連年無媒合成功案件或件數偏低，允宜瞭解癥結原因，並採顧客導向方式評鑑租賃服務業者，以提升服務品質增加民眾參與意願，俾達政策目標。

都市發展局為使市轄內青年及弱勢租屋族群能獲得更好之租屋協助與保障，並提升民間空餘屋之活化使用情形，自 106 年起配合內政部開辦社會住宅包租代管計畫，委由租賃服務業者以「包租包管」及「代租代管」等方式提供租屋媒合及管理服務，減輕租賃雙方繁瑣之租用、管理作業，俾提升社宅承租者及房東之參與意願。迄 113 年都市發展局已續辦 4 期計畫（計畫期間自 106 年 12 月至 117 年 9

表 1　高雄市各行政區租金補貼申請及包租代管媒合成功情形

序號	行政區	租金補貼申請件數	包租代管媒合件數	序號	行政區	租金補貼申請件數	包租代管媒合件數
1	三民區	20,918	581	20	梓官區	322	5
2	楠梓區	14,109	426	21	大樹區	466	4
3	鳳山區	9,387	361	22	旗山區	1,303	4
4	左營區	6,243	332	23	湖內區	1,152	3
5	苓雅區	7,982	309	24	阿蓮區	253	2
6	鼓山區	5,133	199	25	路竹區	703	2
7	前鎮區	5,507	162	26	彌陀區	64	2
8	小港區	5,153	161	27	美濃區	379	1
9	新興區	3,924	144	28	旗津區	394	—
10	鹽埕區	2,450	90	29	茄萣區	263	—
11	前金區	2,162	84	30	六龜區	88	—
12	橋頭區	1,110	70	31	甲仙區	61	—
13	大寮區	3,377	66	32	永安區	56	—
14	燕巢區	1,137	63	33	杉林區	53	—
15	鳥松區	1,141	50	34	內門區	39	—
16	仁武區	1,770	41	35	田寮區	7	—
17	大社區	4,123	24	36	桃源區	4	—
18	岡山區	2,022	23	37	茂林區	3	—
19	林園區	1,088	22	38	那瑪夏區	2	—


註：1. 租金補貼件數係 112 年 9 月至 113 年 9 月間之中央 300 億租金補貼，及 111 至 113 年間高雄市增額租金補貼申請件數（含核定及未核定件數）。
2. 包租代管媒合件數係截至 113 年 9 月底之包租代管計畫第 1 至 4 期媒合件數（第 4 期尚在執行中）。
3. 資料來源：整理自高雄市政府都市發展局提供資料。

月），獲中央核定補助預算計 9 億 7,421 萬餘元，預計辦理包租、代管兩方案之目標案件數共 5,640 件（含後續擴充案件數），截至 113 年底止，補助經費之執行數 3 億 4,229 萬餘元，已成功媒合社宅案件數自第 1 期之 595 戶增至第 3 期之 1,069 戶（第 4 期尚在執行中）。經查計畫辦理情形，核有：1.都市發展局推行社宅包租代管計畫逾 7 年，成功媒合案件逾 9 成集中於市區，而非市區之旗津區等 19 個行政區於 113 年度迭有租金補貼核定案件，確有租屋需求（表 1），惟相關行政區或無成功媒合案件或案件數偏低，顯示媒合成效未臻普及，且潛藏大量空餘屋尚待發掘；2.社宅包租代管業務由同一業者持續承辦多年，迄未依租屋服務事業認定及獎勵辦法對其辦理業務評鑑作業，允宜參考其他市縣政府作法，並採顧客導向方式評鑑業者，以提升服務品質增加民眾參與意願，俾達政策目標，經函請檢討改善。據復：1.偏鄉地區媒合率偏低係因建物未具合法性，致影響社會住宅包租代管之參與資格，後續將請業者多行銷、開發市轄內之低度使用（閒置）住宅，並增加各行政區房東之參與意願，以符市轄內青年及弱勢租屋族群之租屋需求；2.114 年度將參考內政部國土管理署及其他市縣政府之評鑑方式，辦理業者評鑑，以提升業者之服務品質。

（五） 為協助民眾安居辦理國宅貸款，未清償款項委由高雄銀行賡續列管清理債權憑證，惟未建立定期稽核檢查機制，致債權憑證久未清理盤點，相關資料間有錯漏，且遲未查調債務人財產所得，俾及時移送強制執行，不利保障債權，亟待強化債權控管機制，以維機關權益。

都市發展局為協助民眾購屋安居，透由高雄市住宅基金承辦國宅貸款業務，授予國宅承購戶購屋貸款及利息補貼，並委託高雄銀行辦理國宅承購戶之貸款簽約、欠款催收及追償等事項。對於承購戶積欠逾期貸款經移送強制執行法拍後，不足清償之款項即列為催收款，該基金於催收款取得債權憑證後，經審酌難以回收者則轉銷為呆帳，續由高雄銀行持續列管追償欠款及清理債權憑證。因該基金曾於以前年度將催收款沖轉為呆帳 6 億 5,940 萬餘元，截至 113 年底止，帳列催收款項已降至 3,391 萬餘元。經查相關債權管控情形，核有：1.都市發展局委由高雄銀行持續列管清理債權憑證，惟未建立定期稽核檢查機制，致該局存放於高雄銀行之債權憑證及相關案卷資

圖 3 高雄銀行代管債權憑證之查調情形



資料來源：整理自高雄市政府都市發展局提供資料。

料久未清理、盤點，且部分保管檔案及登載資料間有錯誤及缺漏情事，不利保全債權；2.歷年雖均函請高雄銀行催收、清理保管之債權憑證，惟經請該行提供距 113 年 11 月底止之最近 2 次對債務人查調財產所得結果，僅 6 成餘之債權憑證能提供查調資料，且其中近 8 成之查調日間隔逾 3 年（圖 3），甚有部分案件已逾 16 年之久，顯示債權追償作業未盡積極，且曾辦理 2 次查調作業之案件中，有 6 成以上案件之查調、清理期程間隔超逾 3 年，因久未追償債務人財產所得狀況，難以確保債權，亟待就債權憑證之定期查調、清理及轉銷呆帳之債權管理，研謀控管機制，以維護機關權益，經函請檢討改善。據復：將研擬建立定期查訪與盤點機制，訂定查訪計畫及提高查調債務人財產所得清單頻率，以確保債權憑證控管，並檢討現行管理流程，進行必要之調整，增設或強化稽核機制，以確保債權管理完整性，及資金收回作業順利進行。

（六） 為減輕市民居住負擔，運用囤房稅財源辦理租金補貼業務，惟折減社宅租金計畫未妥適衡酌補助標的之公平原則及相關補貼業務亦未訂定檢核機制，且執行成效未如預期，影響居住正義政策之嘉惠範疇，允待檢討評估精進。

市政府為減輕市民居住負擔，保障更多市民之居住權益，於 111 年 5 月修正高雄市房屋稅徵收自治條例，調整市轄非自住住宅之房屋稅稅率（下稱囤房稅），都市發展局亦於同年 6 月訂定「111 年度增額租金補貼實施計畫」，增額補貼家庭所得未符中央政府補助條件之租屋需求者，惟執行成效欠佳，遂於 112 年 3 月底訂定「運用囤房稅辦理住宅及租金補貼計畫」（下稱囤房稅補貼計畫），除原有增額租金補貼範疇外，又增訂育兒租金補貼、折減社會住宅租金及首購族購屋貸款利息補貼等分支計畫（圖 4），期減輕市民居住負擔。經查囤房稅補貼計畫執行情形，核有：1.辦理折減社會住宅租金計畫未妥適衡酌補貼標的之公平原則，因社會住宅承租戶之租金行情已低於市價，再給予租金折減優惠，恐有福利疊加之虞，影響政策資源之分配效益，不利擴大造福市民；2.自辦增額租金補貼及首購族購屋貸款利息補貼等計畫，雖訂有申請限制及違反者應繳回溢領款項等規定，惟未訂定具體檢核機制，亦未參照中央之住宅補貼查核督導計畫，針對貸款利息補貼之核貸戶，每年定期查核有無違反補貼要件，難以確保福利政策之有效執行；3.運用囤房稅辦理住宅及租金補貼計畫，然除育兒租金補貼計畫之執行率達 94.59%外，其餘均未達 1 成，執行成效未如預期。又明定囤房稅為相

圖 4 囤房稅補貼計畫之分支計畫




資料來源：整理自高雄市政府都市發展局網站資料。

關居住正義政策之財源，卻無相關稅收統計資料，僅以既有執行成果編列預算，不利財政平衡穩妥及政策推展等情事，經函請檢討改善。據復：1. 為避免福利疊加，將依高雄市社會住宅出租辦法規定，於公辦社宅滿 3 年後重新檢討租金、管理維護費等收費標準及優惠方式；2. 因增額租金補貼係採逐年申請模式，將於每年申請時透由內政部國土管理署之各類補貼查詢系統確認，首購族購屋貸款利息補貼之檢核，已分別函洽戶政及稅捐機關，同意逐年提供核貸戶是否設籍高雄市及名下住宅幢數等查詢資料，並據以擬定檢核機制；3. 業於 115 年度預算先期作業，將挹注興建社宅經費納入囤房稅補貼計畫，後續仍就該計畫進行檢討與改善，另爾後每年函洽財政局提供囤房稅稅收預估數，作為編列預算及計畫調整之參據。

（七） 持續辦理岡山區大鵬九村社會住宅興建計畫，滿足民眾居住需求及帶動地區性發展，惟社會住宅統包工程採購多次流標，採減少興建樓層方式因應，大幅減少容積率及戶數，影響日後租金收入及降低自償能力，允待研謀因應措施。

臺灣永續發展核心目標 11 揭示：「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，亦列有確保所有的人都享有適當、安全及可負擔的住宅及基本生活所需的服務，並改善弱勢棲所等具體目標。市政府為落實居住正義，滿足青年、租屋民眾及弱勢族群之居住需求，積極推動社會住宅興建計畫，並以人口密集優先、大眾運輸導向及配合產業發展作為選址考量，讓入住社會住宅之民眾能夠享有便捷完善之生活機能，及提供鄰近社區居民優質公共與社福服務。截至 113 年底，市政府自行興建中之社會住宅包含岡山區大鵬九村社會住宅、三民區新都段社會住宅、大寮社會住宅、前鎮亞灣智慧公宅（第一期）等 4 處，其中岡山區大鵬九村社會住宅座落於岡山區第 87 期重劃區，使用土地面積約 1.3 公頃，所需興建經費採高雄市住宅基金融資方式，計畫經費匡列 35 億 8,407 萬餘元（非自償性部分申請內政部補助），由都市發展局委託專案管理廠商辦理工程之規劃、基本設計及研擬統包需求作業，並委由新建工程處代辦統包工程採購招標及後續履約管理事宜。經查辦理情形，核有：1. 都市發展局原規劃興建 708 戶，經基本設計後之統包需求為 764 戶，係市政府歷年來新建社會住宅計畫中規劃最多戶數，然因工程採購數度流標，採下修樓層數、戶數、建蔽率與容積率方式因應，樓層數自地上 15 層減為 12 層，戶數自 764 戶減為 625 戶，

圖 5 原規劃與興建使用容積率差異

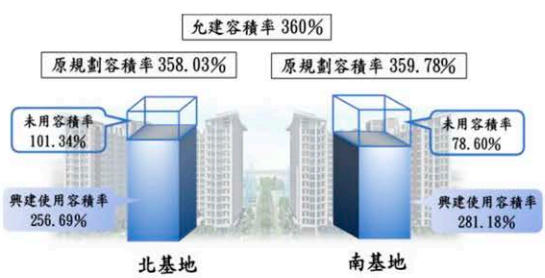

資料來源：整理自高雄市政府都市發展局提供資料。

南、北基地之建蔽率由 38.02%及 38.15%，減少為 36.52%及 36.75%，容積率由 359.78%及 358.03%，減少為 281.18%及 256.69%，減幅為 21.85%及 28.30%，與該基地允建容積率 360%差異甚大（圖 5），惟該社會住宅興建完成後，應無再予增建之可能，且新建社會住宅之用地不易取得，其減少之戶數差額達 139 戶，允待研謀因應措施，以確保新建社會住宅目標量能之達成；2.新建該社會住宅所需經費，包含以高雄市住宅基金融資方式籌措自償性經費及中央補助興建期間非自償性經費，嗣興建完成後償還銀行借款及支應後續年度營運費用之經費來源為其住宅、店鋪、社福設施及停車場之租金收入，惟該計畫工程採購多次流標，下修樓層數為 12 層、戶數減為 625 戶，影響日後租金收入及降低自償性償還能力，允待及時檢討評估營運期間之現金流，並研謀因應措施，以確保社會住宅財務計畫健全等情事，經函請檢討改善。據復：1.刻與內政部、國家住宅及都市更新中心攜手合作興建 2 萬 9 千餘戶社會住宅，未來將配合中央社會住宅政策及內政部分配目標，持續滾動評估擴大興建戶數，以確保達成新建社會住宅政策量能；2.刻辦理修正自償性債務舉借及償還計畫，業已函請經濟發展局提高每年償還積欠基金之額度，並依「內政部社會住宅興辦計畫補助直轄市縣（市）政府業務推動費土地租金融資利息及非自償性經費作業須知」向中央申請地方政府社會住宅非自償性經費補助，以減輕基金融資負擔。

四、112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見 4 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表 2）。

表 2　112 年度審核報告所列都市發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題	說明
已研謀改善或依改善措施持續辦理	
（一）劃定及推動都市更新區域，首創行政中心新舊基地採公辦都市更新模式招商，惟部分區域歷經多年仍未辦理都市更新，或執行策略微求實施者計畫進度未如預期，有待積極強化計畫執行管控，健全都市機能，並營造低碳永續之整體環境品質。	
（二）賡續稽查都市計畫用地使用情形，惟部分行政區之農業用地未供農業用途使用，已逾都市計畫容許範疇，亦未主動規劃查察，以有效遏止土地違規使用，亟待研議善策並善用相關資訊，以強化都市計畫土地使用效能。	
（三）因應施政需要，賡續檢討變更都市計畫，惟部分都市計畫區逾 5 年未研議辦理通盤檢討作業及公共設施用地面積未達規定比率，允宜研謀改善，以提升居民生活環境品質及促進城鄉均衡發展。	
（四）賡續辦理社區營造實施計畫及閒置空間活化，以改善社區雜亂並增進地方特色，惟部分社區營造點環境維護管理未落實、督導考核機制及營運管理未臻周全，有待檢討改善，以達計畫執行效益。	

貳拾貳、法制局主管

法制局主管僅法制局 1 個機關，掌理人民訴願案件、國家賠償事件之處理及市法規之研擬、解釋、審議、諮詢等法制業務。茲將 113 年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一） 計畫實施之查核

業務計畫 5 項，下分工作計畫 5 項，包括審議國家賠償案件、保障人民合法權益、促進性別平權及提升法制專業知能等重要施政項目，其中已執行完成者 4 項，尚在執行者 1 項，係 731 石化氣爆損害賠償第三審民事訴訟案尚未定讞，須保留續予執行。

（二） 預算執行之審核

1. 歲入預算數未編列，決算審核結果，修正增列應收保留數 20 萬元，係增列應收國家賠償案件求償收入；審定實現數 157 萬餘元，應收保留數 20 萬元，係國家賠償案件求償款尚待收繳；合計決算審定數為 177 萬餘元，較預算增加 177 萬餘元，主要係國家賠償案件求償收入較預計增加。

2. 以前年度歲入轉入數計 155 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 155 萬餘元（100.00%）。

3. 歲出原編列預算數 7,786 萬餘元，因辦理 731 石化氣爆損害賠償第三審民事訴訟案所需經費不足等事由，經動支第二預備金 256 萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備 99 萬餘元，合計 8,142 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 7,085 萬餘元（87.01%），應付保留數 29 萬餘元（0.36%），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 7,114 萬餘元，預算賸餘 1,028 萬餘元（12.63%），主要係國家賠償準備金結餘。

4. 以前年度歲出轉入數計 12 萬元，決算審核結果，審定實現數 12 萬元（100.00%）。

貳拾參、觀光局主管

觀光局主管僅觀光局 1 個機關，掌理觀光行銷與觀光產業管理、觀光活動推展、風景區規劃建設與維護管理、動物園管理等業務。茲將 113 年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核

報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一） 計畫實施之查核

業務計畫 7 項，下分工作計畫 7 項，包括觀光推廣與拓展客源，輔導觀光旅遊業、旅館及民宿，提升遊憩及服務品質；推動旅遊景點休憩設施與維護管理，完善風景區旅遊品質；動物園維護管理及動物生態、保育教育之推廣等重要施政項目，其中已執行完成者 1 項，尚在執行者 6 項，主要係內門觀光休閒園區等工程尚未完工，須保留續予執行。

（二） 預算執行之審核

1. 歲入預算數 7,720 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 5,200 萬餘元，應收保留數 1,118 萬餘元，主要係違反發展觀光條例之行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為 6,319 萬餘元，較預算減少 1,401 萬餘元（18.15%），主要係受風災影響，動物園、貝殼館等園區多次休園，門票收入較預計減少。

2. 以前年度歲入轉入數計 5,216 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 3,080 萬餘元（59.05%）；減免（註銷）數 233 萬餘元（4.48%），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數 1,902 萬餘元（36.47%），主要係中央補助辦理觀音湖內埤生態廊道營造工程計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

3. 歲出原編列預算數 10 億 6,432 萬餘元，因辦理壽山動物園接駁服務等事由，經動支第二預備金 119 萬餘元，暨因人事費不足等事由，動支各類員工待遇準備 1,950 萬餘元，合計 10 億 8,502 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 9 億 8,484 萬餘元（90.77%），應付保留數 9,569 萬餘元（8.82%），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 10 億 8,053 萬餘元，預算賸餘 448 萬餘元（0.41%），主要係人事費結餘。

4. 以前年度歲出轉入數計 2 億 6,842 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 8,898 萬餘元（70.41%）；減免（註銷）數 39 萬餘元（0.15%），主要係 2023 高雄演唱會經濟團體旅遊補助計畫賸餘款；應付保留數 7,903 萬餘元（29.45%），主要係內門觀光休閒園區等工程尚未完工，須保留續予執行。


（三） 重要審核意見

1. 開發內門觀光休閒園區，營造友善生態及休閒遊憩場域，惟區內土地以私有地居多，前期規劃作業未臻周延，復因委外招商政策反覆，影響園區新建

計畫進度及營運期程，亟待研謀改善，俾發揮預期綜效。

高雄市縣合併改制後，觀光局鑑於壽山動物園腹地不足發展受限，擬定 10 年動物園遷建計畫，101 年辦理「動物園新建評估規劃」，103 年擇定內門區紫竹寺南側土地作為「動物園物種繁育基地－內門觀光環境教育區」。嗣依高雄市區域計畫規劃成果重新檢討，改朝生態觀光與體驗休閒性質發展，爰調整計畫為「內門觀光休閒園區」，仍沿用繁育基地作為園區場址，經內政部區域計畫委員會於 106 年 8 月定位為生態教育性質。該計畫歷經 2 次修正後，總經費達 7 億 2,759 萬餘元（含中央補助 8,904 萬元），計畫期程 10 年（104 至 113 年），園區面積 11.56 公頃，分 3 期辦理新建工程，期利用現有埤塘及谷地，營造友善動植物棲息之生態環境，並結合陣藝地方特色文化，提供遊客親近體驗自然生態及休閒遊憩機能之場域。經查動物園遷建及內門觀光休閒園區計畫執行情形，核有：(1) 選定內門紫竹寺南側土地作為遷建新址，惟土地面積規模不大，多數為私有土地，屬山坡地保育區之農牧及林業用地，開發使用受限，且聯外道路亦未符法令規定，又先期可行性評估作業未臻周延，無法提報整體計畫，雖於 100 年至 106 年間數次調整計畫方向，遷建計畫仍於規劃階段遂告終止，未能發揮預期效益；(2) 市政府於 108 年 9 月核定內門觀光休閒園區新建工程整體計畫書，原定總經費 3 億 3,674 萬元，辦理期程 9 年，採 OT 模式招商，惟自 104 年 1 月啟動計畫，因前期作業未進行整體可行性通盤評估，亦未辦理備選方案之成本效益分析，僅以地方支持及觀光潛力等資料即予推動，致需另籌經費開闢聯外道路，歷時逾 2 年於 110 年完工，相關用地變更及地上權取得等規劃作業至 111 年始完成。又該局原擬採 OT 模式招商，因政策調整於 110 年改以有償 BTO 模式，最終於 113 年公告以 ROT 方式辦理，114 年始甄選出最優申請人，且因規劃期程冗長，適逢疫情，計畫經費因物價上漲調增至 5 億 6,472 萬元，增幅達 67.70%，截至 114 年 3 月底止，多項工程仍未完工，耽延預定營運期程（圖 1）；(3) 園區促參政策歷經 3 次變更，辦理過程欠缺完整風險評估及財務分析報告，最終由政府先行投入鉅額建設經費再進行 ROT 方式招商，大幅增加政府財政負擔，與促進民間參與公共建設法「減輕政府負擔、加速建設」目的未符等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 嗣後審慎檢討先期作業之妥適性，精進規劃與決策機制，以防類此情事再生：

圖 1　動物園遷建及內門觀光園區計畫大事記

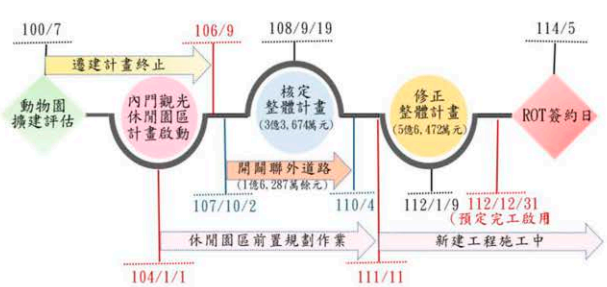


資料來源：整理自高雄市政府觀光局提供資料。

（2）本案涉觀光遊憩及動物管理範疇，無廠商具投資意願，故滾動調整決定促參辦理方式，另園區採低度開發保留原有地景及生態環境，營造具親子體驗之可愛動物區，將加強宣導動物保護與環境教育，以落實計畫公益性；（3）已於 114 年 5 月完成 ROT 案簽約作業，後續將與營運業者共同推動行銷，提升園區營收，透過固定及變動權利金回饋方式改善財政收支。

2. 積極辦理旅宿業輔導與稽查作業，惟間有作業流程、稽查方式及次數，或業者住宿廣告刊登訊息未符規定，允宜研謀改善，保障遊客住宿安全及旅宿業秩序。

觀光局為有效管理及輔導合法與非法旅宿業，訂有「高雄市旅館暨民宿輔導及管理工作計畫」，據以執行旅館、民宿、日租套房等檢查及管理工作。113 年底列管高雄市合法一般旅館（民宿）及非法旅宿分別為 510 家及 119 家，113 年度經交通部觀光署核定補助「協助地方政府執行違法旅宿管理工作」經費，辦理合法及非法旅宿業檢查分別為 264 家次及 733 家次，並獲交通部辦理之輔導績效考核為特優之殊榮，惟查旅宿業輔導與稽查業務辦理情形，核有：（1）雖訂定前揭輔導及管理工作計畫，惟辦理作業流程及稽查方式與計畫規定未符，又部分旅宿業近 3 年度均採書面審查，或前次稽核結果為不合格，或自主管理檢查表未如實查填，且經實際檢查不符而裁處在案，惟未將該等業者列入優先稽查對象，逕依其填列之檢查表評斷為合格，允宜檢討妥處，並參酌其他市縣自主管理計畫增、修檢查項目及建立退場機制；（2）經統計，近 5 年度（109 至 113 年度）非法旅宿業檢查次數介於 74 至 1,183 家次不等，雖列管家數由 109 年底 172 家下降至 113 年底 119 家（圖 2），惟稽查次數未符計畫規定，或稽查日未見營業情形，亦未再排定稽查，然實際仍有旅客發表消費評論，顯示未能及時發現及遏止違法營業情事；（3）合法旅宿業刊登住宿廣告未載明登記證編號，或非法旅宿業違法刊登營業訊息；（4）為輔導具在地特色之偏遠地區旅宿業者申設民宿，公告高雄市具人

圖 2 近 5 年度非法旅宿業檢查及列管情形

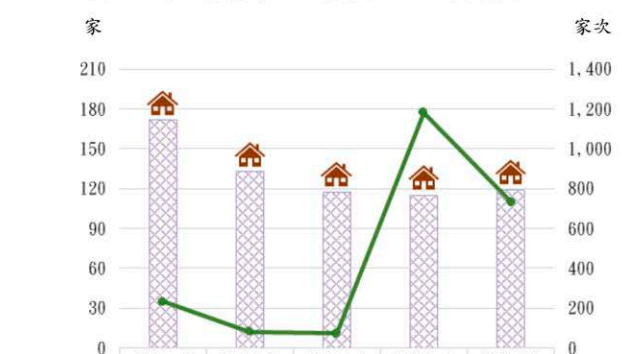

	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
家數	172	133	117	115	119
檢查次數	234	81	74	1,183	733


資料來源：整理自高雄市政府觀光局提供資料。

文或歷史風貌及偏遠地區範疇，惟尚有位於偏遠地區之民宿疑似尚未取得合法登記證；(5) 列管旅宿業個人資料且檢查合格家數僅占高雄市旅宿業總數約 3.32%，顯示落實個資保護作為比率偏低，亟待有效掌握並督促轄內旅宿業落實個人資料檔案安全維護計畫等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 研議修正「高雄市旅館暨民宿輔導及管理工作計畫」及新增自主管理紀錄表檢查項目，並參考桃園市政府規範訂定檢查頻率，建置分級管理制度；(2) 爾後積極落實依作業規定辦理旅宿業管理稽查作業，並依業務實際執行情況滾動式調整稽查裁罰作業流程。另為確保執行時效及正確度，設立專責監控人員，針對列管案件加強稽查管控；(3) 將持續督請合法旅宿業者於訂房網站刊登旅宿業登記證編號，另疑似非法旅宿刊登營業訊息，已錄案辦理，如查有事證，將依法裁處；(4) 對疑似未合法旅宿已錄案辦理，如查有事證，將依法裁處；(5) 已將觀光產業個人資料檔案安全維護納入自主管理及實地稽查內容。

3. 為帶動北高雄整體觀光發展，建設崗山之眼園區，惟遊客人次逐年下降，且經蒐集涉及園區輿論，遊客多有反映交通不便，又既已爭取經費改善園區相關設施之品質，允宜檢討改善，研謀相關交通配套措施，提升景點交通之易行性及可及性，促進觀光地區發展。

觀光局為帶動北高雄整體觀光發展，105 年度辦理崗山之眼園區及周邊環境整建工程，經費支出 1 億 2,830 萬元，建造全長 88 公尺之天空迴道，107 年 2 月 14 日正式開幕。因通往該處之山區道路狹窄蜿蜒，爰除身障人士可憑證件通行至園區無障礙停車場停放外，均管制私人運具上山停放，並設置大莊公園站等接駁轉乘站，提供前往崗山之眼遊客巴士接駁及計程車共乘服務，營運初期吸引大批遊客前往，107 年度遊客人數達 68 萬餘人次，惟至 109 年度已下降至 38 萬餘人次，該園區於 110 年間即為議員所關注，並於議會質詢遊客人數每況愈下，雖據該局加強

圖 3 崗山之眼園區歷年遊客人次



	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
遊客人數	687,990	546,648	389,981	240,330	296,575	297,575	128,344

資料來源：整理自高雄市政府觀光局提供資料。

行銷及檢視局內人力辦理活動以吸引人潮，惟執行結果 110 至 112 年度遊客人數仍下降至 24 萬至 29 萬餘人次，113 年度僅 12 萬餘人次（圖 3），復因園區遊客人數減少，巴士接駁服務陸續取消大莊公園及阿公店水庫站點，僅存水庫路停車場至崗山之眼之接駁服務。另蒐集崗山之眼近 2 年度涉及園區輿論，遊客多有反映交通不便、捷運岡山高醫站往大莊公園公車班次少、接駁等待時間長、共乘計程車僅載人數較多之遊客等情事，均影響遊客前往意願。又該局為改善園區服務設施之品質，已申請交通部觀光署 113 至 114 年度「景點優化體驗加值計畫」，並獲該署核定總計畫經費 4,200 萬元（含補助款 2,268 萬元），改善園區相關設施之品質及落實無障礙旅遊環境，期重塑崗山之眼風貌，提升整體觀光價值，經建請研謀相關交通配套措施，提升景點交通之易行性及可及性，促進觀光地區發展。據復：交通局已規劃公車路線，每日行駛 10 車次，由「岡山高醫站」行駛至「大莊公園」，提供遊客轉乘園區接駁車或共乘計程車進入園區，另園區接駁相關配套措施，觀光局刻正研議規劃中。

（四） 112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見 5 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表 1）。

表 1　112 年度審核報告所列觀光局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題	說明
已研謀改善或依改善措施持續辦理	
1. 積極辦理新動物園運動改造計畫，提升遊客入園人次及動物福祉，惟遊客多集中於年節活動期間，且未持續配合多元行銷活動吸引遊客，允宜研謀改善，俾達營運成效。	
2. 持續推動內門觀光休閒園區計畫，期帶動山區觀光發展，惟園區新建工程相關作業未臻完善，且未研擬開園後相關大眾交通運輸配套方案，允待研謀改善。	
3. 持續辦理觀光遊憩區環境清潔維護工作，提供民眾優質遊憩環境，惟清潔維護督導、環境檢查及評分作業未臻落實，有待研謀改善。	
4. 持續辦理觀光行銷及活動推展，期成為國際旅遊熱點，惟間有參與活動人次遞減、或高雄好玩卡部分套票銷售期程偏短，或未規劃相關遊程，或欠缺大數據分析資料，允宜檢討改善。	
5. 積極與友善店家合作設立「借問站」，營造優質觀光旅遊環境，惟間有借問站公開資訊未更新、或部分行政區尚未設立據點、或辦理行銷活動尚難達成預期效益，允宜檢討改善，充分提供在地旅遊資訊。	

貳拾肆、水利局主管

水利局主管僅水利局 1 個機關，掌理城市水域治理、河川整治與疏濬、河川復育、污水處理、水岸整治、水患治理、集水區內雨水下水道、市區排水、區域排水及坡地水土保持等事項。茲將 113 年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一） 計畫實施之查核

業務計畫 4 項，下分工作計畫 7 項，包括辦理雨水下水道規劃及興建、建置或改善抽水站功能、提升智慧防汛系統、山坡地防災及自主演練等重要施政項目，其中已執行完成者 2 項，尚在執行者 5 項，主要係擴建路污水主幹管（第二過港段）暨中華路污水主幹管（第一區）新建等工程尚未完成，須保留續予執行。

（二） 預算執行之審核

1. 歲入預算數 65 億 5,028 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 57 億 1,986 萬餘元，應收保留數 3 億 5,135 萬餘元，主要係中央補助辦理前鎮漁港下水道系統整建統包等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為 60 億 7,122 萬餘元，較預算減少 4 億 7,905 萬餘元（7.31%），主要係中央補助辦理污水下水道系統建設等計畫，實際核撥補助款較預計減少。

2. 以前年度歲入轉入數計 5 億 1,252 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 2 億 7,627 萬餘元（53.90%）；減免（註銷）數 3,494 萬餘元（6.82%），主要係中央補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善等計畫，依實際執行情形核撥，無須撥付數辦理註銷；應收保留數 2 億 130 萬餘元（39.28%），主要係中央補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

3. 歲出原編列預算數 85 億 6,360 萬餘元，因辦理慰助凱米颱風泡水車輛實施計畫所需經費等事由，經動支第二預備金 1 億 3,262 萬餘元，及因人事費不足暨應風災，動支各類員工待遇準備並移緩濟急 8,523 萬餘元，合計 87 億 8,146 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 67 億 1,565 萬餘元（76.48%），應付保留數 13 億 7,801 萬餘元（15.69%），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 80 億 9,366 萬餘元，預算賸餘 6 億 8,780 萬餘元（7.83%），主要係污水下水道系統建設等計畫賸餘。


4. 以前年度歲出轉入數計 8 億 219 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 7 億 847 萬餘元（88.32%）；減免（註銷）數 2,480 萬餘元（3.09%），主要係縣市管河川及區域排水整體改善等計畫賸餘；應付保留數 6,891 萬餘元（8.59%）主要係彌陀區鹽埕排水（中正西路 150 巷上游）箱涵改建應急等工程尚未完成，須保留續予執行。

（三） 重要審核意見

1. 為降低城市積淹水風險，積極規劃建置排水設施，惟近年致災性降雨重現週期縮短，允宜考量氣候變遷因素檢討保護標準，以提升防洪排水功能，強化城市韌性以因應極端氣候考驗。

水利局為降低水患風險，往年依經濟部水利署 95 年度出版之「河川治理及環境營造規劃參考手冊」及 106 年 7 月「前瞻基礎建設計畫－水環境建設縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，訂定區域排水防洪設施保護標準為通過 10 年重現期頻率洪水，及滿足 25 年重現期頻率洪水不溢堤等防洪目標，截至 113 年底止，總計公告區域排水 121 條及建置滯洪池 25 座；又所轄 38 行政區，其中三民等 30 區建設雨水下水道系統之保護標準為重現期 5 年，永安等 8 區因非都市計畫區，尚無雨水下水道系統規劃，截至 113 年底雨水下水道系統規劃總面積 6 萬 1,265 餘公頃、長度 958 餘公里，已建設長度 754 餘公里，實施率 78.73%。然高雄市於 107 至 110 年度間曾發生 5 次豪雨，及 113 年度之凱米（圖 1）、山陀兒颱風等皆測得超過 10 年重現期之雨量，顯示近年氣候逐漸極端，強降雨已成常態，甚於凱米颱風已逾 100 年重現期，既有保護標準已難以有效防洪。另 107 年 8 月因豪雨造成高雄市多處積淹水，該局邀請治水專家學者提出水患因應策略，盤點 68 處高雄市下水道易淹水位置進行改善，惟迄凱米颱風後仍有 13 處改善工程尚未完工，或完工後仍有通報積淹水情形，經分析積淹水原因，多為豪大雨超過防洪標準導致排水不及。鑑於近年來極端氣候日益明顯，致災性降雨事件頻生，經函請該局將氣候變遷因素納入整體檢討規劃，分析現行

圖 1 凱米颱風 7 月 24 至 28 日雨量累積情形

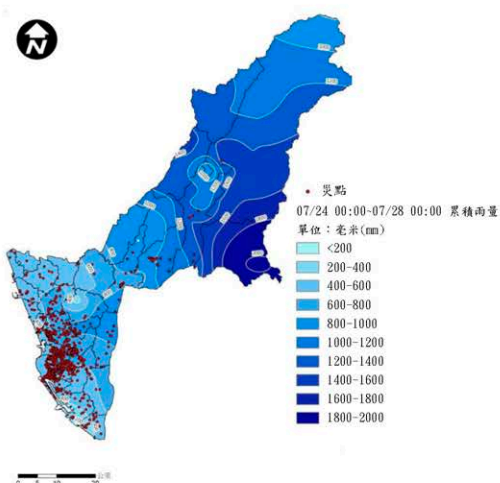


資料來源：整理自高雄市政府水利局提供資料。

防洪保護標準之合宜性，並儘速完成區域排水改善及雨水下水道之建置，以減低異常豪大雨帶來之衝擊，保障民眾生命及財產安全。據復：因應目前極端氣候變化，區域排水有必要再次全面檢討相關防洪措施功能提升，並針對近期有溢淹之流域，辦理改善工程；另持續檢討各行政區雨水下水道系統規劃，分階段向中央爭取經費辦理，打造韌性城市以因應極端氣候考驗。

2. 持續辦理水利建造物管理及維護作業，以維持防洪功能，惟部分水利建造物缺失改善情形或建置作業未臻周妥，且部分雨水下水道智慧監測系統長期呈現警戒狀態，允宜檢討改善。

水利局為確保轄管之河川及區域排水各項水利建造物安全，依據經濟部頒定水利建造物檢查及安全評估辦法規定，委外辦理水利建造物定期檢查工作；另據該局建構之「智慧水利監測密網平台」網站資料，截至 114 年 5 月 28 日止，介接 391 處路面及雨水下水道淹水感測器、92 處水位站、91 處雨量站等即時水位資訊，以掌握水情動態，並建置 99 處抽水站，以防止城市集水區積淹水。經查辦理情形，核有：（1）辦理水利建造物檢查及維修工作，以維持防洪功能，惟部分檢查發現缺失未即時改善，或未持續追蹤改善情形；（2）建置智慧監測系統以預警水災發生，惟部分感測地點長期為二級或一級警戒未予以改善，未能發揮預警防洪功能；（3）建置排水網路地理資訊系統控管區域排水治理與清淤工程，惟相關資訊未及時滾動更新，影響資料正確性及使用效益；（4）部分抽水站周遭地區仍有淹水情形（圖 2），且抽水站建置久遠，未依內政部營建署（112 年 9 月 20 日改制為內政部國土管理署，下稱國土署）建議辦理延壽健檢計畫，以評估抽水站既有規劃及現有功能之效益；（5）已陸續辦理抽水站興建及功能提升計畫，惟部分抽水站未依規劃設置足量抽水機，以確保抽水站於汛期時有效發揮排水疏洪功能等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將確實管控每年度水利建造物定期檢查結果，並積極改善，以確保水利建造物充分發揮應有防洪功能；（2）刻正針對受潮汐影響之位置評估水位警戒值調整，滾動式檢討雨水下水道水位計位置合宜性；（3）已由廠商協助進行資料格式調整，簡化填報作業並優化圖

圖 2 使用年限逾 20 年抽水站位於淹水點範圍情形

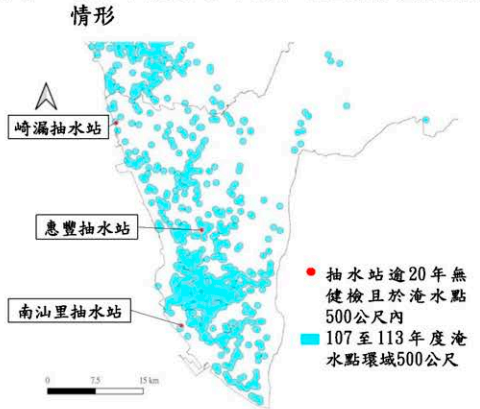

資料來源：整理自高雄市政府水利局提供資料及政府開放平臺資料。

台，輔助清疏作業區域規劃；（4）持續定期維護與檢測作業，針對老舊設備提出汰換更新計畫，另同步檢視同區域排水系統，以研擬全面之防洪對策；（5）已提報國土署補助經費，完工後將符合原規劃之抽水量需求。

3. 為改善都市開發所衍生水文地理環境改變問題，持續辦理區域排水系統規劃檢討計畫，惟仍有部分沿岸之堤防、護岸或橋梁梁底高程不足，排水功能受限，允宜積極檢討改善，以降低沿岸淹水風險。

近年經濟發展快速，都市計畫區土地開發利用衍生都市化效應，導致水文地文環境遽變，轄內都市計畫地區因屬早期完成之規劃，未能充分考量都市快速發展所增加之逕流量，導致原規劃集水範圍與目前發展現況不相符，部分河川水系及區域排水幹支線承受排洪量超過原規劃容量，造成既有河川水系及區域排水系統負荷增加。水利局為規劃各區域排水綜合治水措施，運用前瞻基礎建設計畫經費辦理典寶溪排水及其支流等排水系統規劃檢討計畫，以提升區域排水防洪能力，迄 113 年度已申請辦理 10 件排水系統規劃檢討計畫（表 1）。經查辦理情形，核有：（1）部分排水系統沿岸堤防高程未達 10 年降雨重現期保護標準之計畫提案高程，一旦遭遇颱風暴雨，恐有溢堤引發水患之風險；（2）部分橋梁梁底高程低於 10 年降雨量河川計畫水位，影響排水功能等情事，經函請檢討改善。據復：（1）典寶溪排水及其支流系統，部分未達 10 年降雨量保護標準之排水，將賡續爭取補助經費辦理治理工程，以降低淹水風險；（2）後勁溪排水系統 6 處瓶頸段，已陸續完工、施工中，或辦理細部設計，俟完成設計後向中央爭取經費以續辦工程。

表 1 辦理排水系統規劃檢討計畫情形

單位：新臺幣千元

序號	計畫名稱	核定金額
合　計		42,870
1	典寶溪排水及其支流規劃檢討委託技術服務案	5,670
2	高雄市管區域排水後勁溪排水系統—委託規劃檢討技術服務案	3,370
3	竹子門排水系統規劃檢討委託技術服務案	3,090
4	愛河排水及其支流規劃檢討委託技術服務案	6,800
5	高雄市管區域排水清水、東門、羌子寮溪排水系統規劃	3,500
6	高雄市管區域排水福安排水系統規劃檢討	2,100
7	高雄市管區域排水楠梓排水系統規劃檢討	2,800
8	高雄市管區域排水鹽水港溪排水系統規劃	4,000
9	高雄市管區域排水大遼、牛食坑、潭子底排水系統規劃檢討	5,790
10	高雄市管區域排水林園排水系統規劃檢討及治理計畫	5,750

資料來源：整理自高雄市政府水利局提供資料。

4. 為維持雨水下水道暢通，辦理下水道清疏、橫越管淨空及纜線附掛管


理等作業，惟橫越管斷管處壁體未切實修繕、箱涵損壞嚴重尚未修繕，及未依限審查纜線附掛許可申請，亟待研謀改善，以確保箱涵排洪效能。

水利局為維持雨水下水道暢通以確保排水功能，加強雨水下水道使用管理，辦理雨水下水道修繕及清疏、橫越管遷改淨空管理等作業，且依據高雄市雨水下水道纜線附掛管理辦法，受理纜線事業機關（構）申請纜線附掛許可。經查辦理情形，核有：（1）監造單位未依契約規定於修繕工程案件通知後儘速簽發派工單限期承商施工，延宕雨水下水道之修繕暨清疏工作；（2）部分橫越管已函報完成遷改作業，惟據竣工報告顯示，斷管處壁體仍有鋼筋裸露未確實修復；（3）107 至 110 年度間辦理雨水下水道設施普查，查核結果破損計 9,272 筆，截至 113 年底僅修繕完成 767 筆，約 8.27%，未及 1 成；（4）未依限審查纜線附掛許可申請，致纜線事業機關（構）於未獲許可之狀態下附掛營運等情事，經函請檢討改善。據復：（1）監造單位逾期未提送派工單，已依契約規定扣罰；（2）已修繕完畢，嗣後將要求承商定期匯報，若未積極追蹤遷改完成情形，將依契約裁處；（3）配合逐年施工改善解除列管，並針對損壞嚴重程度較高者優先修復，以降低路基掏空危害公共安全之風險；（4）因抽驗點眾多且距離甚遠，抽驗階段耗費人力及時間，將研議調整申請程序，以符合管理規定。

5. 為落實山坡地保育治理與防災作業，積極辦理巡查及災防訓練，惟保育利用管理工作績效考核成效落後、巡查作業未臻確實，且災防宣導未顯著抑減山坡地違規使用，亟待研謀改善。

高雄市土地總面積 29 萬 5,185 公頃，其中山坡地面積 22 萬 2,236 公頃，占 75.29%，因颱風、暴雨、地震及人為不當開墾等因素，可能發生土壤沖蝕、崩塌、地滑，或土石流現象，進而造成民眾生命、經濟與生態環境等危害。水利局為落實山坡地保育治理與災害防救工作，減少災害發生，每年辦理自主防災訓練管理計畫，並委請區公所協助辦理山坡地巡查、違規使用查報制止取締等作業。經查辦理情形，核有：（1）藉由分析違規熱點及導入空拍科技，增進自主巡查率及查證時效，惟山坡地保育利用管理工作績效考核成績仍未臻理想；（2）為提升土石流及大規模崩塌潛勢地區保全對象資訊之準確性，每年協助區公所更新保全對象資訊及實施電訪作業，惟間有訪查資料錯漏或聯繫未果等情，致未能於防汛期前更新；（3）積極推廣社區、校園及跨地區主題聯展等多元形式水土保持及防災知識教育宣導，109 至 113 年度辦理 29 至 87 場教育宣導，吸引民眾 2,842 人次至 5 萬 1,650 人次參與（圖 3），惟山坡地違規開發使用裁罰案仍有近百件，且部分裁處對象屢次違規，尚未顯著抑減山坡地違規使用等情

圖 3　教育宣導及山坡地違規裁罰情形

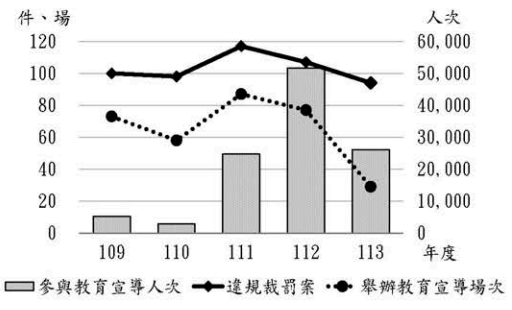

資料來源：整理自高雄市政府水利局提供資料。

事，經函請檢討改善。據復：(1) 將積極導入科技運用改進相關作為，並增加與各直轄市交流，以利研擬有效因應對策，提升管理成效；(2) 將於歷次演練活動時加強宣導並採滾動式檢核方式，以提升保全清冊妥善率，協助區公所土石流防災業務順行並應緊急避難所需；(3) 114 年度宣導對象預定擴大邀請違規義務人、地政士公會等相關職類從業人員參與，加強對水土保持法規之瞭解與重視，將運用主計處針對高雄市水土保持法違規裁罰案件分析及水土保持違規概況等應用統計資料，加入課程講解，協助調整山坡地管理策略。

（四） 112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見 7 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表 2）。

表 2　112 年度審核報告所列水利局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題	說明
已研謀改善或依改善措施持續辦理	
1. 加速推動污水下水道建設，用戶接管普及率達 5 成，惟部分污水區用戶接管進度落後，允宜研謀妥處，以改善居家環境衛生及河川品質。	
2. 積極推動污水處理廠放流水回收再利用相關計畫，有效落實水資源循環再利用，惟設置高效測試中心興建完成後未予啟用，及水資源中心營運管理作業欠周妥，有待研謀改善。	
3. 賡續推動北高雄再生水計畫，規劃興建橋頭及楠梓再生水廠，提供產業發展用水需求，惟未能有效掌握需求資訊，影響規劃時程及執行作業未臻完善，允待研謀改善，避免影響民生用水。	
4. 中區污水處理廠透過公私協力引進民間專業技術代為操作，惟污水水質處理效能欠佳、污泥餅含水率檢測規範未明確，允宜檢討改善。	
5. 賡續推動大高雄海岸治理計畫，改善茄萣海岸景觀及串連人行與自行車道，提升環境品質，惟後續設施維管未盡完善，亟待研謀改善。	
6. 辦理前瞻基礎建設計畫之水環境建設採購案件，惟工程保險附加條款限縮承保範圍、部分工程人員設置與契約規定或核定提報資料不符，及工程契約部分項目數量編列未盡覈實，允宜檢討改善。	
7. 受託代辦幼兒園統包工程，提供優質學前教育教學空間，及提升公共化教保服務量能，惟工程履約管理情形未臻周延，允宜研謀改善。	

貳拾伍、毒品防制局主管

毒品防制局主管僅毒品防制局 1 個機關，掌理高雄市毒品防制整合及規劃工作，並統籌市政府各局處相關毒品防制及政策規劃等業務。茲將 113 年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一） 計畫實施之查核

業務計畫 2 項，下分工作計畫 4 項，包括統籌規劃高雄市毒品防制工作、強化前端預防，推行「反毒、拒毒新運動」、落實輔導處遇服務，協助藥癮者復歸社會等重要施政項目，均已執行完成。

（二） 預算執行之審核

1. 歲入預算數 7,531 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 7,523 萬餘元，應收保留數 55 萬元，主要係違反毒品危害防制條例之行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為 7,578 萬餘元，較預算增加 47 萬餘元（0.62%），主要係違反毒品危害防制條例之罰鍰收入較預計增加。

2. 以前年度歲入轉入數計 5 萬元，決算審核結果，審定實現數 5 萬元（100.00%）。

3. 歲出原編列預算數 1 億 5,411 萬餘元，因人事費不足，動支各類員工待遇準備 313 萬餘元，合計 1 億 5,725 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 5,148 萬餘元（96.34%），決算審定數為 1 億 5,148 萬餘元，預算賸餘 576 萬餘元（3.66%），主要係人事費賸餘。

（三） 重要審核意見

1. 積極推動毒品防制策略，訂定毒防措施作業要點據予執行，惟對查獲特定營業場所之通報與列管作業期程冗長，及運用科技系統進行跨網絡勾稽，未妥善研訂個資安全維護計畫，亟待檢討改善，以提升防制成效及資訊安全。

毒品防制局設置市政府毒品防制會報，統籌規劃高雄市毒防策略及工作方針與目標，為強化高雄市法定八類休閒娛樂場所執行毒品防制措施，依毒品危害防制條例第 31 條之 1 規定及特定營業場所執行毒品防制措施辦法，訂定「高雄市政府推動特定營業場所執行毒品防制措施作業要點」（下稱高雄市特定場所毒防措施要點），該要點所謂「特定營業場所」係指實際從事視聽歌唱、舞廳、酒吧等休閒業務場所，曾遭查獲有人在內施用或持有毒品，而場所人員又未事先向警察機關通報者，相關場所自遭查獲翌日起算列管 3 年，列管期間應依法執行毒品防制措

施。截至113年底止，毒品防制局依法列管之法定八類休閒娛樂場所計66家，令限期改善42家、裁罰 18 家（表 1），復為打造智慧城市，以創新科技、數位治理，建置 AI 大數據「科技智慧毒防系統」，強化風險預防及毒防網、治安網、社安網之跨網絡連結合作，並透過毒品防制局自媒體平台、電視等多元廣宣管道，強化民眾防毒知能，以提升毒防施政及輔導效能。經查辦理情形，核有：(1) 依高雄市特定場所毒防措施要點規定查獲場所或特定營業場所違反毒品危害防制條例情事者，惟屢未能依限辦理相關通報及列管作業，且執行期程長達數月，不利毒品防制宣導及輔導改善，允宜研謀妥處；(2) 辦理特定營業場所違反毒品危害防制條例裁罰作業，保有相對處分人姓名、身分證字號等個人資料檔案，惟迄未依個人資料保護法相關規定，公開違反毒品危害防制條例辦理裁罰作業之資料檔案名稱；(3) 首創建置 AI 大數據「科技智慧毒防系統」，運用巨量輔導資料分析藥癮個案風險因子與保護因子，協助判斷個案輔導方向，並可由藥癮個案資料運用多維度立體科技家系圖，勾稽個案家庭成員之關聯性，以發掘各家系隱藏藥癮之風險，避免世代複製，惟截至 113 年底止，「科技智慧毒防系統」迄未列入資通安全維護計畫，且運用藥癮個案機敏資料辦理輔導處遇業務，迄未訂定個人資料安全維護相關規定等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 已修訂高雄市特定場所毒防措施要點，後續將依新修訂之規定辦理特定營業場所違反毒品危害防制條例之通報及列管作業；(2) 已依規定於機關官網公開特定營業場所違反毒品危害防制條例辦理裁罰作業之資料檔案名稱，以供民眾及利害關係人查閱；(3) 已修訂資通安全維護計畫並納入個人資料保護管理相關規定。

表 1　休閒娛樂場所管制情形

單位：家

年度	列管家數	限期改善家數	裁罰家數
109	60	—	—
110	66	21	3
111	83	27	5
112	84	36	13
113	66	42	18

資料來源：整理自高雄市政府毒品防制局提供資料。

2.　首創「社區及里辦毒品防制關懷站」與推動貫穿式保護機制，建構毒品防制綿密網絡，強化物質濫用之預防與治療成效，惟毒品防制資源跨域整合及貫穿式保護轉介個案之開案量尚有精進空間，亟待檢討改善，俾提升藥癮防治識能及輔導處遇效益。

毒品防制局為落實全面性毒品防制宣導，及踐行臺灣永續發展核心目標 3.5 揭示：「強化物質濫用的預防與治療，包括麻醉藥品濫用以及酗酒。」自 108 年起與社區藥局、診所、衛生所及里辦公室等建置社區及里辦毒品防制關懷站（下稱社區關懷站），以強化布建防毒網，截至

113 年底止，已建置社區關懷站計 1,025 站（圖 1），辦理即時轉介輔導業務。復與高雄市保全商業同業公會等攜手合作辦理「保全守護通　防毒好安居」防毒守護員培育計畫，使社區保全或管理人員成為社區防毒守護員，發揮立即通報、及時協助功能。毒品防制局因應相關業務，於「衛生業務－輔導處遇業務」計畫項下，辦理藥癮者入監銜接輔導與出監社區處遇、緩起訴戒癮機制及多元社區輔導等業務，截至 113 年底止，該計畫輔導個案數計 4,705 人。經查辦理情形，核有：(1) 統籌規劃市轄毒品防制策略，首創設置社區關懷站，期整合民間組織等多元網絡力量共同阻絕毒品危害，擴大毒防知識之普及率及反毒成效，惟查社會局為落實新住民家庭照顧服務，截至 113 年底止，已為市轄 5 萬餘人之新住民設置 5 個新住民家庭服務中心，並補助 30 個新住民社區服務據點等，然毒品防制局遲未將該等新住民服務據點納入毒品防制宣導領域，不利新住民毒品防制之宣導成效，亟待加強機關橫向跨域溝通，以提升即時轉介輔導及協助功能，強化毒品防制網絡之全面性及普及率；(2) 配合新世代反毒策略行動綱領 2.0（110 至 113 年度），推行貫穿式保護策略，期於偵查階段配合個案意願提前轉介毒防中心，及早提供戒癮資訊與追蹤輔導出監或社區處遇等相關服務，以達成抑制毒品再犯終極目標。截至 113 年底止，警察機關及地方檢察署檢察官轉介量計 185 案，惟該等個案實際接受評估並開案治療者僅 120 案，開案率僅為 64.86%，轉介個案開案量尚待強化等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 已結合社會局、勞工局等單位辦理多場外國人健康關懷活動及毒品防制衛教宣導等活動，提供新住民與外籍移工有關新興毒品之危害風險資訊，復為消弭語言隔閡而造成毒品防制宣導斷層，已印製 4 國語言宣導單置於新住民家庭服務中心，供新住民索取諮詢；(2) 已於臺灣橋頭地方檢察署設立司法處遇藥癮個案關懷服務據點提供一站式服務，並於毒品戒癮治療說明會時派員說明多元輔導措施及收案，提升個案及早接受輔導意願，期達到提早介入輔導發揮抑制毒品再犯效益。

圖 1　毒品防制關懷站建置情形



資料來源：整理自高雄市政府毒品防制局提供資料。

（四）　112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見 3 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼

續改善者 2 項、已依改善措施持續辦理者 1 項（表 2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見 1 項通知檢討改善。

表 2　112 年度審核報告所列毒品防制局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題	說明
仍待繼續改善	
1. 協同合作辦理毒品防制作業，惟相關通報及列管作業期程冗長，不利及時輔導改善，允宜強化跨機關協力合作並建立橫向通報機制，提升毒品防制效能。	因查獲特定營業場所相關通報作業，及運用「高雄市科技智慧毒防系統」等情未臻完善，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見 1.」。
2. 創新運用 AI 大數據分析技術，建置「高雄市科技智慧毒防系統」，惟資通安全防護與管理措施未臻周妥，亟待檢討改善，俾提升系統防制運用成效及資訊安全。	
已依改善措施持續辦理	
積極設置毒品防制關懷站及家庭社區支持服務據點，惟設置關懷站數量與服務藥癮個案數未能契合，或官網資訊未適時更新，不利資源利用可近性，允宜檢討改善，俾提升藥癮防治識能及輔導處遇效益。	

貳拾陸、運動發展局主管

運動發展局主管計有公務機關 1 個，非營業特種基金單位 1 個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

運動發展局主管僅運動發展局 1 個機關，掌理運動產業之推動、輔導與管理、運動設施規劃、整建、營運管理、競技及全民運動之推動等業務。茲將 113 年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫 3 項，下分工作計畫 5 項，包括新建運動場館及改善運動環境、發展運動觀光、選手培訓獎勵與生涯發展等重要施政項目，其中已執行完成者 1 項，尚在執行者 4 項，主要係三民區全民運動館興建計畫等期程跨年度，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數 1 億 642 萬元，決算審核結果，審定實現數 1 億 1,132 萬餘元，

應收保留數 89 萬餘元，主要係中央補助辦理澄清湖棒球場民間自提 OT 案前置作業計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為 1 億 1,222 萬餘元，較預算增加 580 萬餘元（5.45%），主要係各運動場館出租或委外營運之租金及權利金收入較預計增加。

2. 以前年度歲入轉入數計 1 億 5,552 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 9,699 萬餘元（62.37%）；減免（註銷）數 188 萬餘元（1.21%），主要係楠梓文中足球場新建計畫等結餘；應收保留數 5,663 萬餘元（36.42%），係中央及台灣中油股份有限公司補助辦理小港區全民運動館興建計畫等工程，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

3. 歲出原編列預算數 13 億 7,311 萬餘元，因辦理全民運動會績優選手獎助、高雄國家體育場設施（備）改善計畫等事由，經動支第二預備金 897 萬元，合計 13 億 8,208 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 11 億 1,152 萬餘元（80.42%），應付保留數 2 億 6,605 萬餘元（19.25%），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 13 億 7,757 萬餘元，預算賸餘 450 萬餘元（0.33%），主要係人事費賸餘。

4. 以前年度歲出轉入數計 7 億 630 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 3 億 8,580 萬餘元（54.62%）；減免（註銷）數 211 萬餘元（0.30%），主要係楠梓文中足球場新建計畫等結餘；應付保留數 3 億 1,838 萬餘元（45.08%），主要係楠梓區全民運動館興建計畫等工程期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

運動發展局主管僅作業基金－高雄市運動發展基金 1 個單位。茲將 113 年度決算審核結果說明如次：

（一） 計畫實施之查核

營運計畫主要為基層選手及教練培訓 1 項，實施結果，因申請補助案件數較預計增加，已達預計目標。

（二） 餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀 243 萬餘元，與預算賸餘 118 萬餘元，相距 362 萬餘元，主要係配合市政府政策辦理大型運動賽事，相關支出較預計增加所致。


三、重要審核意見

（一） 持續改（興）建及營運轄管市立游泳池，提供民眾安全舒適之休閒運動空間，惟場域管理未臻完善，允宜研謀改善。

運動發展局配合政府推動海洋國家親水政策，辦理改（興）建轄管市立游泳池相關設施業

務，以提供民眾安全舒適之休閒運動空間，並依游泳池管理規範等相關規定，對自營及委託代管營運之市立游泳池場域，進行維護、修繕、保養及更新、定期考核等工作，暨聘任救生員維持場所秩序與安全檢查、維護現場運動人員安全、環境清潔及水質檢測等事宜，有效維持各場域運作。該局近 5 年度（109 至 113 年度）配合游泳池設施工程期程，開放游泳池供民眾使用介於 9 至 15 處，累計使用人數 130 萬餘人次（圖 1），另投入轄管市立游泳池等體育設施（備）之養護及管理相關預算合計 6 億 4,875 萬元。經查辦理情形，核有：1. 甲仙、大寮、大社及小港等游泳池，間有於 COVID－19 疫後未妥為研謀重啟或活化方案，設施損壞且閒置逾 3 年，影響偏鄉學校游泳課程便利性，或終止委外營運，未落實場域點交作業，續由原營運單位持續使用，或委外營運單位逕行停止營運，卻未督促依約改善；2. 東門、大樹、旗津及鳳山等游泳池，間有部分場域欠缺過濾設備，或水道阻塞、夜間照明等相關設施（備）故障，遲未修復，仍開放使用，增加運動民眾受傷及疾病傳染風險，或部分游泳池派員長駐督導委外營運狀況，惟設施長期損壞停用，卻未督促營運單位依約通報並積極釐清責任歸屬；3. 國際、大樹、大寮、東門等游泳池，間有消防安全設備檢修缺失，遲未完成改善，或未申報公共建築物安全檢查及消防安全設備檢修作業，卻開放民眾使用，或相關救生器材欠缺，緊急醫療設備逾有效期限甚久等，亦未能檢修及適時更新等情事，經函請檢討改善。據復：1. 待確認甲仙游泳池場地電力相關設備勘用狀況，及評估該場域是否賡續作游泳池使用；通知大寮游泳池之終止委託營運單位，將非屬運動發展局財產搬離該游泳池場域，並告知不得擅自進入；對逕行停止營運之大社游泳池委外單位處以違約金，並視經費儘速評估辦理修繕作業；另辦理小港游泳池建築物安全評估工作，並拆除池體作為停車場使用；2. 對自營或委託學校代管營運之場域，陸續辦理照明設備修復工作，餘待修繕設施（備），將視經費續辦改善事宜，另委外營運之游泳池場域，責請委外單位依契約規定落實設施設備損壞之通報作業並加速改善工作；3. 消防設備缺失，業已陸續完成改善工作，另救生器材及緊急醫療設備等財產及物品，將確認是否堪用，如無法使用者，依規定辦理報廢並視經費儘速申購，保障民眾使用游泳池之安全性。

圖 1　高雄市立游泳池使用人次



資料來源：整理自高雄市政府運動發展局資訊公開專區網站資料。

（二） 為持續推展國民運動風氣，辦理運動 i 臺灣 2.0 計畫，培養民眾規律運動習慣，惟執行成效與民眾期待存有落差，或計畫執行過程未臻周妥，亟待檢討精進。

運動發展局為持續推展國民運動風氣，培養民眾規律運動習慣，113 年度獲教育部體育署（下稱體育署）核定補助 2,785 萬餘元辦理運動 i 臺灣 2.0 計畫，截至 113 年底止，由該局自辦、接受其他機關或民間機構申請辦理運動推廣相關活動計 112 案，按體育署公布全國運動場館資訊，截至 114 年 3 月 17 日止，高雄市運動場館之設施項目數合計 1,581 處，僅次於新北市。經查計畫執行情形，核有：1.按體育署委外辦理運動 i 臺灣 2.0 之 113 年運動現況調查結案報告載述，民眾對高雄市運動推廣現況看法面向計有 4 項低於全國平均值（表 1），且民眾認為住家附近運動場所設置不充足，或對當地公眾運動場所設施滿意度比率分別高於或低於全國平均值，顯示計畫執行成效與民眾期待尚有落差；2.遴聘專家學者擔任訪視委員，期能輔導活動並提供諮詢建議，惟部分計畫執行單位未獲悉委員所提意見，致未提供回饋或改善作為，不利提升計畫執行成效；3.未落實執行補助經費採就地審計之訪視計畫，或允待檢討增列查核項目；4.間有公共意外責任險未涵蓋整個賽事活動，或結案報告檢附保險收據之投保日期及地點錯誤，或採購數量規範及驗收方式欠妥適；5.因颱風來襲延後賽事活動，廠商要求增列支出，惟契約未規範應提供適當佐證單據，致履約爭議遲未處理完結等情事，經函請檢討改善。據復：1.近年已規劃設置運動中心，另 114 年度將透由大型活動現場擺設宣傳攤位、設置臉書粉絲專頁、Line@社群、短影音、主題式行銷等加強宣傳；2.已訂定輔導運動 i 臺灣 2.0 計畫執行計畫單位注意及管理事項，另將於定期會議宣導執行單位可至系統查閱訪視紀錄，並於會議中討論訪視結果，提出具體建議，以落實輔導措施；3.將全面檢討增加訪視頻率，並於訪視計畫檢核項目欄增列查核保險額度及險種，給予賽事活動參與者權益保障；4.爾後將所有賽事活動納入投保範圍，加強驗收文件審查，另標案規格中明確列出可量化品項之預估數量，於活動當日指派人員逐項點收確認，並要求廠商須於結案報告檢附可量化項目之點收單據，備供核銷查驗；5.業與廠商協商採洽詢比價較低者估算應給付價金，爾後加強契約履約

表 1 民眾對高雄市運動推廣現況看法與全國平均值比較

單位：%

項次	項　　目	高雄市	全國平均值
1	民眾認為居住縣市經常或偶爾舉辦體育活動之比率	32.4	34.6
2	經常或偶爾接收宣傳運動訊息之比率	25.3	26.3
3	聽過政府或民間團體所舉辦運動 i 台灣 2.0 體育活動之比率	18.0	19.9
4	參與過政府或民間團體所舉辦運動 i 台灣 2.0 體育活動之比率	5.6	8.0


資料來源：整理自教育部體育署 113 年度運動現況調查結案報告書。

管理及佐證文件之審查機制。

（三） 為提供澄清湖棒球場更優質觀賽環境及節省營運成本，辦理民間自提營運移轉案前置作業計畫，惟執行進度落後，且迄未確定委外營運策略，允待檢討精進。

運動發展局為提升澄清湖棒球場公共服務水準，給予民眾更優質之棒球運動觀賽環境，吸引職棒球隊進駐，營造屬地主義專屬球場，以節省人事成本及營運維護費用，112 年 4 月獲財政部核定補助經費 127 萬餘元，加計自籌款 75 萬元，合計 202 萬餘元，用以辦理高雄市澄清湖棒球場民間自提營運移轉案前置作業計畫，112 年 5 月委商辦理「高雄市澄清湖棒球場民間自提 OT 促參前置作業委託專業服務」契約，金額 190 萬元。經查辦理情形，核有：1.OT 促參案第 1 次公告後無民間投資人提出申請，即以政策規劃為由通知廠商暫緩執行，迄 114 年 5 月底止仍未通知廠商恢復計畫執行，業較原定委商營運完成日落後逾 1 年，顯有計畫執行進度落後情形。另未考量球場位於「變更澄清湖特定區計畫（部分公園用地、社教用地、機關用地、停車場用地、車站用地為運動休閒專用區、捷運開發區）（配合澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線 Y3 站建設計畫）」範圍內，營運方式應配合都市計畫之規劃構想、發展策略及土地使用管制內容等，俟屆補助款核銷期限，始以配合都市計畫重新評估委外營運方式為由申請展延，耗費人力及前置作業費，為避免長久虧損（圖 2），亟待積極檢討營運方式；2. 未依規定提供甄審前各階段之審查資料予財政部，並邀請列席協助審查等情事，經函請檢討改善。據復：1. 已依預定變更之土地管制條件，併整體運動休閒園區發展策略研擬球場未來經營策略方向，預計 114 年 7 月前函報市政府，據以評定執行方向及營運方式，儘速依規定完成相關作業，辦理經費核銷及結案；2. 已告誡業管單位相關人員，爾後確實依規定辦理審查。

圖 2 澄清湖棒球場近 3 年度收支短絀情形

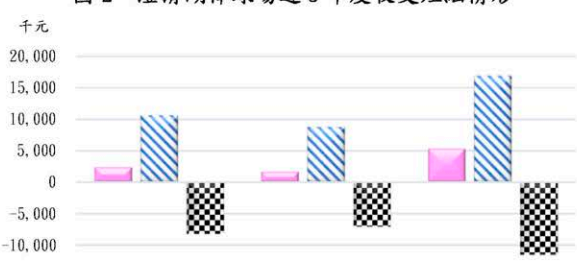

	111年度	112年度	113年度
收入	2,358	1,650	5,288
支出	10,582	8,731	16,810
短絀	-8,223	-7,081	-11,522

資料來源：整理自高雄市政府運動發展局提供資料。

（四） 考量建物耐震能力不足，委商辦理拆除工程，惟拆除前未依規定完成報廢程序且工程採購執行過程未臻周妥，允待檢討改善。

運動發展局經管高雄市楠梓運動園區楠梓射擊場選手預備室（下稱楠梓射擊場預備室）為

75 年 10 月 24 日建造完成，面積 227.64 平方公尺，價值 168 萬餘元之建物。該局考量楠梓射擊場預備室耐震能力不足，111 年 11 月 25 日檢送「高雄市楠梓運動園區射擊場選手預備室拆除需求計畫」向教育部體育署申請補助款，112 年 2 月 9 日獲核定計畫經費 95 萬餘元，嗣委商辦理拆除工程。經查辦理情形，核有：1.未經權責機關審查同意擅自拆除未達使用年限之建物，且盤點作業未臻確實，致遲未發現帳物不符，延宕辦理報廢程序；2.迄完工驗收階段始發現工程契約之各類保險額度不足（表 2）；3.廠商未依契約條款辦理職業安全衛生人員登錄並報勞動檢查機關備查，仍核定開工申請，開工審查作業欠覈實；4.未於廠商執行混凝土澆置作業前取得生產來源符合契約規範之證明文件；5.未督促廠商完成拆除執照申請程序，致遭權責機關裁罰等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後辦理建物拆除報廢作業將依規定辦理，另業於 114 年度財產盤點作業啟動前運用高雄市地籍圖資查詢系統調閱建物測量成果圖，責派現場管理人陪同盤點以逐一確認建物配置與現況，避免類案再生；2.爾後將請廠商注意工程契約之保險額度，並責派專人確實審查投保情形；3.爾後將請廠商依契約提供職業安全衛生人員登錄，及報請勞動檢查機關備查資料；4.將要求廠商於施工前提供證明文件；5.辦理類案將於契約及工程會議中提醒廠商應辦事項。

表 2　工程各類保險額度及投保情形

單位：新臺幣元

保險種類/保險標的	契約規定保險金額（A）	實際保險金額（B）	差異金額（C=B-A）
營造工程財物損失險－合約金額	780,000	598,000	-182,000
營造工程財物損失險－拆除清理費用	39,000	—	-39,000
第三人意外責任險－每一個人體傷或死亡	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
第三人意外責任險－每一事故體傷或死亡	50,000,000	20,000,000	-30,000,000
第三人意外責任險－保險期間內最高累積責任	100,000,000	50,000,000	-50,000,000
雇主意外責任保險－每一個人體傷責任	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
雇主意外責任保險－每一事故體傷或死亡	50,000,000	25,000,000	-25,000,000
雇主意外責任保險－保險期間內最高累積責任	100,000,000	50,000,000	-50,000,000

資料來源：整理自高雄市政府運動發展局提供資料。

（五）　為保障民眾運動安全，建構友善之優質運動環境，委商辦理各運動場館建築物公共安全、消防設備之檢查簽證及申報作業，惟執行作業尚未周妥，允待檢討改善。

運動發展局截至 113 年底止轄管之運動場館合計 70 處，為符合法令規定，保障民眾運動安全，建構友善之優質運動環境，113 年度委商辦理各運動場館建築物公共安全、消防設備之檢

查簽證及申報作業。經查辦理情形，核有：1.間有逾主管機關通知限期改善期限仍未完成建築物公共安全檢查申報缺失，或遲未改善消防安全設備檢查結果之待修理或更新項目；2.屬 D1 類且樓地板面積未達 300 平方公尺之建物應每 2 年辦理 1 次公共安全檢查簽證及申報，惟未確實管控申辦期程，致遭權責機關以未達申報年度為由退件（表 3），相關申報簽證費及審查規費形同虛擲；3.以完成消防設備檢修申報作為履約條件，惟以廠商提供申報進度查詢之畫面擷圖作為驗收依據，且擷圖畫面顯示部分場館尚未完成申報，仍同意驗收等情事，經函請檢討改善。據復：1.已循預算編列程序籌編經費，預計 115 年度完成缺失改善或設備更新；2.因經管場館眾多且分屬不同科室管理，爾後將橫向溝通各科室經管場館之建築物公共安全檢查申報進度，避免類案再生；3.廠商已提供消防機關核發之申報受理單，嗣後將於契約條款內增訂該內容。

表 3　申報建築物公共安全檢查簽證遭退件情形

單位：平方公尺

項次	場館名稱	樓地板面積	前次申報日期	下次申報日期	113 年度申報日期
1	高雄市大坪頂壘球場	298.75	112.12.26	114 年第 3 季	113.8.28
2	高雄市路竹運動園區	168.99	112.8.10	114 年第 3 季	113.8.27
3	高雄市大寮區游泳池	232.44	112.10.11	114 年第 3 季	113.8.2

資料來源：整理自高雄市政府運動發展局提供資料。

四、112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見 6 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表 4）。

表 4　112 年度審核報告所列運動發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題	說明
已研謀改善或依改善措施持續辦理	
（一）推動國際游泳池設施改善計畫，提供完善國際賽事及選手訓練場地，惟跳水台設計變更方案遲未確定，延遲工程執行期程逾年餘，且相關採購作業未臻周妥，有待檢討改善。	
（二）為行銷高雄，促進觀光經濟，提供跨局處之行政支援，採免收場地使用費及門票收入費以吸引知名團體舉辦演唱會，惟高雄國家體育場營運經年入不敷出產生短絀，允待審慎衡酌展演活動帶來經濟或觀光擴散效益，並適時考量使用者付費公平原則，俾利場館永續經營。	
（三）為推廣棒球運動，提供球團場地或設施（備）使用費減免或優惠價，並辦理球場整修工程，惟使用管理情形未盡完善，允待檢討精進。	

表 4　112 年度審核報告所列運動發展局主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

重要審核意見標題	說明
已研謀改善或依改善措施持續辦理	
（四）持續推動全民運動中心興建計畫，建置多元運動設施，提供民眾便利、優質、安全之運動場域，惟計畫執行及營運招商前置作業未臻周妥，有待研謀改善。	
（五）辦理茄萣運動公園整體改造計畫，期提供符合市民需求之運動環境，惟計畫執行過程未臻周妥，亟待檢討精進。	
（六）設置各類運動場館，建構安全友善之優質運動環境，惟場館用電效率及電費管控情形未臻周妥，允宜督促研謀改善。	

貳拾柒、青年局主管

青年局主管計有公務機關 1 個，非營業特種基金單位 1 個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

青年局主管僅青年局 1 個機關，掌理青年職涯發展規劃、創業輔導與創業資源整合等業務。茲將 113 年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫 3 項，下分工作計畫 3 項，包括青年職涯發展輔導、創業財務與管理等重要施政項目，其中已執行完成者 1 項，尚在執行者 2 項，主要係青創產業輔導等案期程跨年度，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入預算數 1,764 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1,622 萬餘元，應收保留數 16 萬元，主要係駁二 8 號倉庫委託經營管理暨活動規劃執行案期程跨年度，權利金尚待驗收結算後收繳；合計決算審定數為 1,638 萬餘元，較預算減少 126 萬餘元（7.17%），主要係中央補助辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫，依實際執行情形核撥。

2.　以前年度歲入轉入數計 21 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 16 萬元

（73.34%）；減免（註銷）數 5 萬餘元（26.66%），主要係依會計師簽證報告註銷溢列駁二 8 號倉庫委託經營管理權利金。

3. 歲出原編列預算數 1 億 6,714 萬餘元，因人事費不足，動支各類員工待遇準備 276 萬餘元，合計 1 億 6,991 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 5,808 萬餘元（93.04%），應付保留數 730 萬餘元（4.30%），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 1 億 6,539 萬餘元，預算賸餘 452 萬餘元（2.66%），主要係補助創業育成計畫等案之結餘。

4. 以前年度歲出轉入數計 1,429 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1,420 萬餘元（99.40%）；減免（註銷）數 8 萬餘元（0.60%），主要係高雄青創產業輔導等計畫執行賸餘數，辦理註銷。

二、附屬單位決算非營業部分

青年局主管僅作業基金－高雄市青年創業發展基金 1 個單位。茲將 113 年度決算審核結果說明如次：

（一） 計畫實施之查核

營運計畫係辦理推展青年創就業相關業務，實施結果，因青年創業補助計畫採雙軌制補助，其中競爭型補助申請門檻較高，支出較預計減少。

（二） 餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀 2,692 萬餘元，較預算短絀 3,971 萬餘元，減少 1,279 萬餘元，約 32.22%，主要係青年創業補助計畫採雙軌制補助，其中競爭型補助申請門檻較高，補助件數較預期減少所致。

三、重要審核意見

（一） 為打造青年創業友善環境，設置青年創業發展基金，惟財源籌措能力有限，且部分資源未集中協助青年創業，允宜積極研謀開發基金自有財源，並適時檢討整體營運績效。

青年局為打造青年創業友善環境，設置高雄市青年創業發展基金（下稱青創基金），辦理青年創業相關投資、補助、青年創業貸款履約保證金及利息補貼、創業育成及基地建置營運等相關業務。依附屬單位預算執行要點規定，作業基金應本財務自給自足原則，設法提高業務績效，達成年度法定預算賸餘目標；主管機關應適時檢討基金整體營運績效。該基金近 4 年度

（110 至 113 年度）總收入 4 億 8,543 萬餘元，其中政府挹注之補助收入 4 億 6,000 萬元，比率達 94.76%，又 113 年度總收入計 6,374 萬餘元，而政府挹注之補助收入 6,000 萬元，比率亦達 94.13%（表 1），其餘收入 374 萬餘元，扣除其他機關繳回補助賸餘款、委託案違約金、專戶利息、民眾捐款等業務外收入計 351 萬餘元後，業務收入僅 22 萬餘元，係設置之雄校聯養成實驗室 1、2 樓店面及 8 樓辦公室租予 2 家青創團隊之租金收入，本處前於 111 年間抽查青創基金運作情形，就財源籌措能力不足情事函請研謀改善，雖經該局函復將研擬開發自有財源，卻未能落實執行，112 及 113 年度補助收入占比仍達 87.10%及 94.13%；又該局辦理大港青年實習媒合計畫，為在學青年媒合實習機會，截至 113 年底止，分別動支公務及基金經費 300 萬元及 1,164 萬餘元，青創基金資源未集中協助青年創業，或與青年局公務預算業務重疊，且青創基金財源籌措能力仍未符合作業基金應自給自足原則，允宜積極研謀開發自有財源，並適時檢討基金整體營運績效，俾利基金存續運作，經函請檢討改善。據復：已針對專案投資、股權投資、協助青創事業上架募資平台集資之可行性進行評估，並儘速研議拓展財源方向；另未來將持續檢視並滾動修正相關業務，以更加符合青創基金設置目的。

表 1　高雄市青年創業發展基金收入統計情形

單位：新臺幣千元、%

年　度	總收入（A）	政府挹注之補助收入（B）	占比（B/A×100）
合　計	**485,437**	**460,000**	**94.76**
110	101,359	100,000	98.66
111	205,525	200,000	97.31
112	114,809	100,000	87.10
113	63,742	60,000	94.13

資料來源：整理自高雄市政府青年局提供資料。

（二）　為培育青年創業創新能力，提供雄校聯社團養成實驗室青創空間，惟收入不敷支應成本且整體閒置率近 5 成，允宜檢討租賃場域執行效益，俾使政府資源有效運用。

青年局為厚植青年多元創新職能，並達成活絡商圈之目的，於新堀江商圈一帶以每月租金 40 萬元承租地上 8 樓地下 1 樓之空間設置雄校聯社團養成實驗室，租期自 110 年 3 月至 115 年 3 月止，提供大專院校或高中職學生及創業青年舞蹈空間、多功能使用室、展演攝影空間、社團成果發展與創業團隊場地租（借）用等服務。經查該實驗室自 110 年 3 月至 113 年底

表 2　雄校聯社團養成實驗室經費執行情形

單位：新臺幣千元

項目／年度	合　計	租賃場域經費	委外服務計畫經費	維運經費
合　計	**42,125**	**18,400**	**20,800**	**2,925**
110	**10,000**	4,000	6,000	—
111	**11,200**	4,800	6,400	—
112	**11,200**	4,800	6,400	—
113	**9,725**	4,800	2,000	2,925

資料來源：整理自高雄市政府青年局提供資料。

相關支出總計約 4,212 萬餘元（表 2），其中 113 年度支出 972 萬餘元，惟同期間收入僅有 2 家進駐團隊租金 22 萬餘元，占支出 2.36%，且上述團隊已陸續離駐，收入更不敷支應成本；另經統計 113 年度各空間使用情形，對外開放借用時數合計 1 萬 1,700 小時，其中無人借用計 5,586 小時，整體閒置率 47.74%（表 3），其中多功能使用室閒置率近 8 成，顯示各空間使用率仍有待提升，以達成活絡商圈之目的及符合場域租賃之目標。鑑於該場域租期將屆，允宜盤整分析青年學習成長、職涯探索、創業就業等目的達成情形，探究強化創就業潛能與職場競爭力成效，衡酌評估該租賃案投入成本執行效益，俾使政府資源有效運用，經函請檢討改善。據復：設置雄校聯社團養成實驗室主要係負責提供本市社團學生安全練習之環境，將持續加強校園推廣，提高學生社團對場域之認識及使用，另多功能教室將開發更多元用途，吸引不同領域青年使用，以降低空間閒置率，並評估雄校聯場館租用相關成效及盤點其他可能之場域，以增進政府資源有效運用。

表 3　113 年度雄校聯社團養成實驗室各空間借用情形

單位：小時、%

使用空間	對外開放借用時數 (A)	無人借用時數 (B)	閒置率 (B/A×100)
合　　計	**11,700**	**5,586**	**47.74**
四樓教室	1,272	506	39.78
五樓舞蹈教室	2,766	727	26.28
五樓多功能使用室	2,130	1,630	76.53
六樓舞蹈教室	2,766	923	33.37
七樓專業導師教室	2,766	1,800	65.08


資料來源：整理自高雄市政府青年局提供資料。

（三）　掌理青年發展規劃業務，全方位協助青年取得相關資源，惟間有多數計畫服務之對象侷限在學青年，對未在學青年之協助仍有不足，或未針對長期失業青年提供所需協助或關懷服務，允宜研謀改善。

據行政院主計總處調查，100 個長期失業者中，青年占比 5 成左右，其中 4 分之 1 為初次找工作之長期失業青年，面臨「畢業即失業」之窘境，又據該處發布人力資源調查統計表，高雄市近5年度（109至113年度）整體失業率由3.8%上升至3.9%後，逐年下降至3.3%（圖1），惟 113 年度 15 至 24 歲及 25 至 29 歲之青年失業率分別為 8.5%及 6.1%，仍遠高於全市整體失業率；另依高雄市113年下半年15歲以上民間人口勞動力狀況統計，15至19歲失業者約1,000人、20 至 24 歲及 25 至 29 歲失業者均約 8,000 人，顯示 20 至 29 歲青年於求職及就業過程相對遭遇較多困難，亟需政府協助。青年局為協助青年職涯發展，辦理大港青年實習媒合、大專青年學生公部門暑期工讀、大港青年職涯發展暨產業導航、新媒體職缺媒合活動等多項計畫，惟上開計畫除新媒體職缺媒合活動之服務對象不限資格外，餘多限定為高中（職）及大專院

校、研究所在校學生或應屆畢業生等，針對未在學青年之協助仍有不足；另新媒體職缺媒合活動未針對失業率較高之潛存目標加以限定資格並提升參與度，亦不利增加目標族群就業率，允宜研謀善策以協助青年順利尋職並穩定就業，經函請檢討改善。據復：持續整合各界實習資源，辦理大港青年實習媒合計畫，規劃 114 年度申請資格由「高中、大學及研究所等在學或應屆畢業生」擴大為「15 至 29 歲在高雄設籍或就讀之青年參與」，並持續加強開發各產業實習職缺，提高實習媒合平台曝光度，協助青年積極參與實習，及早進入職場就業，另新媒體人才培育中心亦持續針對有職缺需求者提供職缺及進行後續關懷服務，以協助青年穩定就業。

圖 1　高雄市失業率趨勢



資料來源：整理自行政院主計總處發布人力資源統計表。

四、112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度總決算審核報告內列重要審核意見 3 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者 1 項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者 2 項（表 4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見 1 項通知檢討改善。

表 4　112 年度審核報告所列青年局主管重要審核意見覆核辦理情形

重要審核意見標題	說明
仍待繼續改善	
青創團隊逐漸進駐轄管大港青年創新能力培育基地及駁二 8 號倉庫等青創空間，惟部分空間使用率仍低或未訂定場地租金收費標準，允待研謀改善，提升青創場域使用率。	因雄校聯社團養成實驗室青創空間使用率仍有待提升，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。
已研謀改善或依改善措施持續辦理	
（一）為強化青年對職場實務認識及職涯探索，辦理青年實習媒合與職場體驗活動，惟間有實習工作行業類別欠缺多元性、公部門見習機關工作內容與見習大專生所學或興趣不相契合，允待檢討改善。	
（二）為提升青年在地創業成功率，辦理青年創業補助、貸款利息補貼等工作，惟辦理情形未臻周妥，允宜研謀改善。	

貳拾捌、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金及各類員工待遇準備等業務。茲將 113 年度決算審核結果說明如次（歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一） 計畫實施之查核

業務計畫 4 項，下分工作計畫 5 項，已執行完成者 4 項，尚在執行者 1 項，主要係水利局辦理各區水利災害搶險搶修等工程尚未完工，須保留續予執行。

（二） 預算執行之審核

1. 歲出原編列預算數 97 億 5,780 萬餘元，因各機關人事費不足及應風災，經申請動支各類員工待遇準備並移緩濟急 10 億 2,466 萬餘元，併入機關預算執行後，預算數為 87 億 3,313 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 78 億 6,158 萬餘元（90.02%），應付保留數 4 億 4,133 萬餘元（5.05%），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 83 億 291 萬餘元，預算賸餘 4 億 3,021 萬餘元（4.93%），主要係各機關公務人員退休及撫卹給付依實際需要支用之結餘。

2. 以前年度歲出轉入數計 7 億 9,822 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 7 億 409 萬餘元（88.21%）；減免（註銷）數 4,150 萬餘元（5.20%），係各項災害搶修工程結餘；應付保留數 5,262 萬餘元（6.59%），主要係水利局辦理 D11、DN14 截流井及中區污水處理廠進流閘門等工程尚未完工，須保留續予執行。

貳拾玖、第二預備金

（一） 預算執行之審核

第二預備金預算數 4 億元，計有市政府等 17 個主管機關，依預算法第 70 條規定申請動支，經市政府核准動支 3 億 9,867 萬餘元（99.67%），未動支數 132 萬餘元（0.33%）。市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之 0.24%，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，市政府並依預算法第 70 條規定編具第二預備金動支數額表，於 114 年 3 月 4 日以高市府主公統字第 11430199000 號函送請市議會審議。有關第二預備金動支事由及數額等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱。

（二） 重要審核意見

第二預備金執行情形雖漸有改善，惟保留比率仍偏高，且有動支案全數保留情形，又間有長期推動之重要施政計畫未於年度預算妥適編列經費或連續 2 年度以相同事由申請動支第二預備金情事，有待檢討改善。

依預算法第 70 條規定，各機關原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷，或因增加業務量致增加經費，或因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時，得經核准動支第二預備金。及各機關單位預算執行要點第 31 點及第 32 點規定，各機關動支第二預備金，應衡酌執行能力，避免於年度結束申請保留，並應避免每年以相同事由申請動支第二預備金；經核准辦理之案件，各機關應依規定程序確實積極辦理。本處前抽查各機關動支第二預備金情形，發現部分機關連年以同一事由申請動支第二預備金，或動支案保留金額與比率偏高等情事，經函請市政府督促檢討改善，據復將持續督請各機關衡酌執行能力辦理動支，避免年度結束申請保留。案經追蹤執行情形，核有：(1) 近 5 年度（109 至 113 年度）第二預備金保留比率介於 25.68%至 45.30%間（表 1），其中 113 年度動支第二預備金計 81 案，執行結果，合計應付保留數 1 億 1,937 萬餘元，雖較 112 年度下降，惟保留比率仍近 3 成，又動支案保留數逾核准動支金額 7 成以上者計 11 案，占總件數 13.58%，其中甚有 8 案全數保留；(2) 部分機關連續 2 年度以相同事由動支第二預備金，或間有如世運主場館維護管理等長期推動之重要施政計畫未於年度預算妥適編列經費，卻動支第二預備金辦理等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 持續督請機關衡酌執行能力並儘速完備預算配置流程，避免年度結束申請保留；(2) 將持續透由預算編列檢討，儘量避免相同情事發生。

表 1 第二預備金編列、動支及保留情形

單位：新臺幣千元、%

年度	預算編列數 (A)	核准動支數 (B)	動支比率 (B/A×100)	應付保留數 (C)	保留比率 (C/B×100)
109	400,000	392,964	98.24	104,329	26.55
110	400,000	397,654	99.41	180,144	45.30
111	400,000	397,606	99.40	102,098	25.68
112	400,000	398,824	99.71	144,997	36.36
113	400,000	398,677	99.67	119,376	29.94

資料來源：整理自高雄市政府主計處提供資料。

（三） 112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見，計有動支預備金案件數下降，惟動支案保留金額與比率較上年度增加，又部分機關以相關事由連年或多次動支，卻未妥為檢討業務長年預算編列不足情形，有待督促檢討因應 1 項，因動支及保留情形仍未周妥，業再研提審核意見詳「(二) 重要審核意見」。

丙、最終審

壹、中華民國 113 年度高雄市總決算

科目	預算數	決算數	決算審金額
一、歲入合計	163,881,732,000	170,029,691,070	170,019,920,582
1.稅課收入	88,186,899,000	98,136,469,834	98,136,469,834
2.罰款及賠償收入	2,546,171,000	3,239,789,680	3,239,989,680
3.規費收入	6,025,791,000	6,363,163,227	6,363,163,227
4.財產收入	1,589,925,000	1,603,698,025	1,593,727,537
5.營業盈餘及事業收入	4,919,495,000	2,252,453,048	2,252,453,048
6.補助及協助收入	53,896,728,000	51,627,340,200	51,627,340,200
7.捐獻及贈與收入	1,678,615,000	1,567,619,392	1,567,619,392
8.其他收入	5,038,108,000	5,239,157,664	5,239,157,664
二、歲出合計	169,571,535,000	164,102,632,667	164,102,632,667
1.一般政務支出	26,072,718,440	25,362,443,058	25,362,443,058
2.教育科學文化支出	62,096,250,574	62,052,663,535	62,052,663,535
3.經濟發展支出	24,610,216,953	23,150,733,061	23,150,733,061
4.社會福利支出	31,814,924,867	30,275,274,794	30,275,274,794
5.社區發展及環境保護支出	12,925,822,436	12,027,683,194	12,027,683,194
6.退休撫卹支出	6,720,492,000	6,366,228,683	6,366,228,683
7.債務支出	3,300,329,000	2,923,917,199	2,923,917,199
8.補助及其他支出	2,030,780,730	1,943,689,143	1,943,689,143
三、歲入歲出餘絀	- 5,689,803,000	5,927,058,403	5,917,287,915

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

定數		決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
占總數%		金額	%	金額	%
100.00		6,138,188,582	3.75	- 9,770,488	- 0.01
57.72		9,949,570,834	11.28	—	—
1.91		693,818,680	27.25	200,000	0.01
3.74		337,372,227	5.60	—	—
0.94		3,802,537	0.24	- 9,970,488	- 0.62
1.32		- 2,667,041,952	- 54.21	—	—
30.37		- 2,269,387,800	- 4.21	—	—
0.92		- 110,995,608	- 6.61	—	—
3.08		201,049,664	3.99	—	—
100.00		- 5,468,902,333	- 3.23	—	—
15.46		- 710,275,382	- 2.72	—	—
37.81		- 43,587,039	- 0.07	—	—
14.11		- 1,459,483,892	- 5.93	—	—
18.45		- 1,539,650,073	- 4.84	—	—
7.33		- 898,139,242	- 6.95	—	—
3.88		- 354,263,317	- 5.27	—	—
1.78		- 376,411,801	- 11.41	—	—
1.18		- 87,091,587	- 4.29	—	—
100.00		11,607,090,915	--	- 9,770,488	- 0.16

貳、中華民國 113 年度高雄市總決算審定後收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項目	預算數		決算數		決算審定數		決算審定數與預算數比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、收入合計	174,221,535,000	100.00	170,029,691,070	100.00	170,019,920,582	100.00	- 4,201,614,418	- 2.41
（一）歲入	163,881,732,000	94.07	170,029,691,070	100.00	170,019,920,582	100.00	6,138,188,582	3.75
（二）債務之舉借	10,339,803,000	5.93	—	—	—	—	- 10,339,803,000	- 100.00
二、支出合計	174,221,535,000	100.00	171,162,632,667	100.67	171,162,632,667	100.67	- 3,058,902,333	- 1.76
（一）歲出	169,571,535,000	97.33	164,102,632,667	96.51	164,102,632,667	96.52	- 5,468,902,333	- 3.23
（二）債務之償還	4,650,000,000	2.67	7,060,000,000	4.15	7,060,000,000	4.15	2,410,000,000	51.83
三、收支短絀	—	—	- 1,132,941,597	- 0.67	- 1,142,712,085	- 0.67	- 1,142,712,085	--

參、中華民國 113 年度高雄市融資調度決算審定表

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	決算審定數			決算審定數與預算數比較增減	
			實現數	保留數	合計	金額	%
一、債務之舉借	10,339,803,000	－	－	－	－	- 10,339,803,000	- 100.00
二、債務之償還	4,650,000,000	7,060,000,000	7,060,000,000	－	7,060,000,000	2,410,000,000	51.83

肆、中華民國 113 年度高雄市營業

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
收入部分			
合計	200,088,000	177,011,760	177,011,760
財政局主管	29,284,000	32,992,620	32,992,620
高雄市政府財政局動產質借所	29,284,000	32,992,620	32,992,620
交通局主管	170,804,000	144,019,140	144,019,140
高雄市輪船股份有限公司	170,804,000	144,019,140	144,019,140
支出部分			
合計	243,207,000	229,756,263	229,756,263
財政局主管	23,879,000	23,938,551	23,938,551
高雄市政府財政局動產質借所	23,879,000	23,938,551	23,938,551
交通局主管	219,328,000	205,817,712	205,817,712
高雄市輪船股份有限公司	219,328,000	205,817,712	205,817,712
淨利（淨損）部分			
合計	- 43,119,000	- 52,744,503	- 52,744,503
財政局主管	5,405,000	9,054,069	9,054,069
高雄市政府財政局動產質借所	5,405,000	9,054,069	9,054,069
交通局主管	- 48,524,000	- 61,798,572	- 61,798,572
高雄市輪船股份有限公司	- 48,524,000	- 61,798,572	- 61,798,572

註：1. 營業總收入決算審定數含營業收入 174,200,389 元及營業外收入 2,811,371 元。
2. 營業總支出決算審定數含營業成本 174,860,724 元、營業費用 31,696,994 元、營業外費用 20,935,028 元及所得稅費用 2,263,517 元。

基金損益計算審定數額綜計表（基金別）

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	23,076,240	- 11.53	—	—	—
3,708,620	—	12.66	—	—	—
3,708,620	—	12.66	—	—	—
—	26,784,860	- 15.68	—	—	—
—	26,784,860	- 15.68	—	—	—
—	13,450,737	- 5.53	—	—	—
59,551	—	0.25	—	—	—
59,551	—	0.25	—	—	—
—	13,510,288	- 6.16	—	—	—
—	13,510,288	- 6.16	—	—	—
—	9,625,503	22.32	—	—	—
3,649,069	—	67.51	—	—	—
3,649,069	—	67.51	—	—	—
—	13,274,572	27.36	—	—	—
—	13,274,572	27.36	—	—	—

伍、中華民國 113 年度高雄市非營業特種基金

收入部分

基金名稱	業務及業務外收入		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	12,917,036,000	16,262,721,064	16,288,283,056
民政局主管	163,670,000	343,260,808	345,983,008
高雄市殯葬事業管理基金	163,670,000	343,260,808	345,983,008
財政局主管	216,315,000	217,972,639	217,972,639
高雄市市有財產開發基金	216,315,000	217,972,639	217,972,639
經濟發展局主管	462,921,000	380,935,901	380,935,901
高雄市產業園區開發管理基金	462,921,000	380,935,901	380,935,901
衛生局主管	5,381,386,000	5,596,691,081	5,596,691,081
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	5,381,386,000	5,596,691,081	5,596,691,081
地政局主管	3,614,125,000	4,745,072,377	4,763,771,232
高雄市實施平均地權基金	3,614,125,000	4,745,072,377	4,763,771,232
捷運工程局主管	493,851,000	2,308,358,906	2,312,499,843
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	493,851,000	2,308,358,906	2,312,499,843
文化局主管	302,281,000	295,395,857	295,395,857
高雄市文化創意產業園區發展基金	302,281,000	295,395,857	295,395,857
交通局主管	1,630,423,000	1,755,516,252	1,755,516,252
高雄市停車場作業基金	1,630,423,000	1,755,516,252	1,755,516,252
都市發展局主管	497,580,000	453,981,907	453,981,907
高雄市城鄉發展及都市更新基金	178,352,000	183,149,981	183,149,981
高雄市住宅基金	319,228,000	270,831,926	270,831,926
運動發展局主管	94,199,000	101,792,802	101,792,802
高雄市運動發展基金	94,199,000	101,792,802	101,792,802
青年局主管	60,285,000	63,742,534	63,742,534
高雄市青年創業發展基金	60,285,000	63,742,534	63,742,534

收支餘絀審定數額綜計表－作業基金（基金別）

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
3,371,247,056	－	26.10	25,561,992	－	0.16
182,313,008	－	111.39	2,722,200	－	0.79
182,313,008	－	111.39	2,722,200	－	0.79
1,657,639	－	0.77	－	－	－
1,657,639	－	0.77	－	－	－
－	81,985,099	- 17.71	－	－	－
－	81,985,099	- 17.71	－	－	－
215,305,081	－	4.00	－	－	－
215,305,081	－	4.00	－	－	－
1,149,646,232	－	31.81	18,698,855	－	0.39
1,149,646,232	－	31.81	18,698,855	－	0.39
1,818,648,843	－	368.26	4,140,937	－	0.18
1,818,648,843	－	368.26	4,140,937	－	0.18
－	6,885,143	- 2.28	－	－	－
－	6,885,143	- 2.28	－	－	－
125,093,252	－	7.67	－	－	－
125,093,252	－	7.67	－	－	－
－	43,598,093	- 8.76	－	－	－
4,797,981	－	2.69	－	－	－
－	48,396,074	- 15.16	－	－	－
7,593,802	－	8.06	－	－	－
7,593,802	－	8.06	－	－	－
3,457,534	－	5.74	－	－	－
3,457,534	－	5.74	－	－	－

伍、中華民國 113 年度高雄市非營業特種基金

支出部分

基金名稱	業務及業務外支出		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	21,629,236,000	23,540,523,963	23,541,470,877
民政局主管	7,878,000	18,121,943	19,068,857
高雄市殯葬事業管理基金	7,878,000	18,121,943	19,068,857
財政局主管	66,656,000	45,438,203	45,438,203
高雄市市有財產開發基金	66,656,000	45,438,203	45,438,203
經濟發展局主管	559,399,000	471,665,078	471,665,078
高雄市產業園區開發管理基金	559,399,000	471,665,078	471,665,078
衛生局主管	5,161,161,000	5,588,386,903	5,588,386,903
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	5,161,161,000	5,588,386,903	5,588,386,903
地政局主管	1,012,396,000	1,091,916,635	1,091,916,635
高雄市實施平均地權基金	1,012,396,000	1,091,916,635	1,091,916,635
捷運工程局主管	12,447,722,000	13,912,048,281	13,912,048,281
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	12,447,722,000	13,912,048,281	13,912,048,281
文化局主管	301,728,000	357,963,008	357,963,008
高雄市文化創意產業園區發展基金	301,728,000	357,963,008	357,963,008
交通局主管	1,387,346,000	1,454,121,561	1,454,121,561
高雄市停車場作業基金	1,387,346,000	1,454,121,561	1,454,121,561
都市發展局主管	491,935,000	405,966,482	405,966,482
高雄市城鄉發展及都市更新基金	172,085,000	141,219,813	141,219,813
高雄市住宅基金	319,850,000	264,746,669	264,746,669
運動發展局主管	93,015,000	104,232,800	104,232,800
高雄市運動發展基金	93,015,000	104,232,800	104,232,800
青年局主管	100,000,000	90,663,069	90,663,069
高雄市青年創業發展基金	100,000,000	90,663,069	90,663,069

收支餘絀審定數額綜計表－作業基金（基金別）（續）

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
1,912,234,877	－	8.84	946,914	－	0.00
11,190,857	－	142.05	946,914	－	5.23
11,190,857	－	142.05	946,914	－	5.23
－	21,217,797	- 31.83	－	－	－
－	21,217,797	- 31.83	－	－	－
－	87,733,922	- 15.68	－	－	－
－	87,733,922	- 15.68	－	－	－
427,225,903	－	8.28	－	－	－
427,225,903	－	8.28	－	－	－
79,520,635	－	7.85	－	－	－
79,520,635	－	7.85	－	－	－
1,464,326,281	－	11.76	－	－	－
1,464,326,281	－	11.76	－	－	－
56,235,008	－	18.64	－	－	－
56,235,008	－	18.64	－	－	－
66,775,561	－	4.81	－	－	－
66,775,561	－	4.81	－	－	－
－	85,968,518	- 17.48	－	－	－
－	30,865,187	- 17.94	－	－	－
－	55,103,331	- 17.23	－	－	－
11,217,800	－	12.06	－	－	－
11,217,800	－	12.06	－	－	－
－	9,336,931	- 9.34	－	－	－
－	9,336,931	- 9.34	－	－	－

伍、中華民國 113 年度高雄市非營業特種基金

餘絀部分

基金名稱	賸餘或短絀		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	**- 8,712,200,000**	**- 7,277,802,899**	**- 7,253,187,821**
民政局主管	**155,792,000**	**325,138,865**	**326,914,151**
高雄市殯葬事業管理基金	155,792,000	325,138,865	326,914,151
財政局主管	**149,659,000**	**172,534,436**	**172,534,436**
高雄市市有財產開發基金	149,659,000	172,534,436	172,534,436
經濟發展局主管	**- 96,478,000**	**- 90,729,177**	**- 90,729,177**
高雄市產業園區開發管理基金	- 96,478,000	- 90,729,177	- 90,729,177
衛生局主管	**220,225,000**	**8,304,178**	**8,304,178**
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	220,225,000	8,304,178	8,304,178
地政局主管	**2,601,729,000**	**3,653,155,742**	**3,671,854,597**
高雄市實施平均地權基金	2,601,729,000	3,653,155,742	3,671,854,597
捷運工程局主管	**- 11,953,871,000**	**- 11,603,689,375**	**- 11,599,548,438**
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	- 11,953,871,000	- 11,603,689,375	- 11,599,548,438
文化局主管	**553,000**	**- 62,567,151**	**- 62,567,151**
高雄市文化創意產業園區發展基金	553,000	- 62,567,151	- 62,567,151
交通局主管	**243,077,000**	**301,394,691**	**301,394,691**
高雄市停車場作業基金	243,077,000	301,394,691	301,394,691
都市發展局主管	**5,645,000**	**48,015,425**	**48,015,425**
高雄市城鄉發展及都市更新基金	6,267,000	41,930,168	41,930,168
高雄市住宅基金	- 622,000	6,085,257	6,085,257
運動發展局主管	**1,184,000**	**- 2,439,998**	**- 2,439,998**
高雄市運動發展基金	1,184,000	- 2,439,998	- 2,439,998
青年局主管	**- 39,715,000**	**- 26,920,535**	**- 26,920,535**
高雄市青年創業發展基金	- 39,715,000	- 26,920,535	- 26,920,535

收支餘絀審定數額綜計表－作業基金（基金別）（續）

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
1,459,012,179	－	- 16.75	24,615,078	－	- 0.34
171,122,151	－	109.84	1,775,286	－	0.55
171,122,151	－	109.84	1,775,286	－	0.55
22,875,436	－	15.29	－	－	－
22,875,436	－	15.29	－	－	－
5,748,823	－	- 5.96	－	－	－
5,748,823	－	- 5.96	－	－	－
－	211,920,822	- 96.23	－	－	－
－	211,920,822	- 96.23	－	－	－
1,070,125,597	－	41.13	18,698,855	－	0.51
1,070,125,597	－	41.13	18,698,855	－	0.51
354,322,562	－	- 2.96	4,140,937	－	- 0.04
354,322,562	－	- 2.96	4,140,937	－	- 0.04
－	63,120,151	--	－	－	－
－	63,120,151	--	－	－	－
58,317,691	－	23.99	－	－	－
58,317,691	－	23.99	－	－	－
42,370,425	－	750.58	－	－	－
35,663,168	－	569.06	－	－	－
6,707,257	－	--	－	－	－
－	3,623,998	--	－	－	－
－	3,623,998	--	－	－	－
12,794,465	－	- 32.22	－	－	－
12,794,465	－	- 32.22	－	－	－

陸、中華民國 113 年度高雄市非營業特種基金來源用途及餘絀審定

來源部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	241,921,650,000	229,776,966,361	229,777,566,361
債務基金	145,111,480,000	135,662,803,398	135,662,803,398
財政局主管	145,111,480,000	135,662,803,398	135,662,803,398
高雄市債務基金	145,111,480,000	135,662,803,398	135,662,803,398
特別收入基金	63,355,484,000	66,676,165,447	66,676,765,447
教育局主管	59,340,011,000	61,594,360,598	61,594,360,598
高雄市教育發展基金	59,340,011,000	61,594,360,598	61,594,360,598
經濟發展局主管	633,334,000	699,144,575	699,144,575
高雄市促進產業發展基金	633,334,000	699,144,575	699,144,575
工務局主管	225,555,000	219,953,449	219,953,449
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	11,164,000	8,384,705	8,384,705
高雄市永續綠建築經營基金	163,391,000	162,772,012	162,772,012
高雄市道路挖掘管理基金	51,000,000	48,796,732	48,796,732
社會局主管	1,165,972,000	2,011,044,964	2,011,044,964
高雄市公益彩券盈餘基金	1,165,972,000	2,011,044,964	2,011,044,964
環境保護局主管	1,645,298,000	1,713,133,130	1,713,733,130
高雄市環境保護基金	1,645,298,000	1,713,133,130	1,713,733,130
農業局主管	186,631,000	293,704,352	293,704,352
高雄市農業發展基金	186,631,000	293,704,352	293,704,352
勞工局主管	142,783,000	138,613,871	138,613,871
高雄市勞工權益基金	7,858,000	8,460,831	8,460,831
高雄市身心障礙者就業基金	134,925,000	130,153,040	130,153,040
文化局主管	15,900,000	6,210,508	6,210,508
高雄市公共藝術基金	15,900,000	6,210,508	6,210,508
資本計畫基金	33,454,686,000	27,437,997,516	27,437,997,516
捷運工程局主管	33,454,686,000	27,437,997,516	27,437,997,516
高雄市捷運建設基金	33,454,686,000	27,437,997,516	27,437,997,516

數額綜計表－債務基金、特別收入基金及資本計畫基金（基金別）

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
－	12,144,083,639	- 5.02	600,000	－	0.00
－	9,448,676,602	- 6.51	－	－	－
－	9,448,676,602	- 6.51	－	－	－
－	9,448,676,602	- 6.51	－	－	－
3,321,281,447	－	5.24	600,000	－	0.00
2,254,349,598	－	3.80	－	－	－
2,254,349,598	－	3.80	－	－	－
65,810,575	－	10.39	－	－	－
65,810,575	－	10.39	－	－	－
－	5,601,551	- 2.48	－	－	－
－	2,779,295	- 24.90	－	－	－
－	618,988	- 0.38	－	－	－
－	2,203,268	- 4.32	－	－	－
845,072,964	－	72.48	－	－	－
845,072,964	－	72.48	－	－	－
68,435,130	－	4.16	600,000	－	0.04
68,435,130	－	4.16	600,000	－	0.04
107,073,352	－	57.37	－	－	－
107,073,352	－	57.37	－	－	－
－	4,169,129	- 2.92	－	－	－
602,831	－	7.67	－	－	－
－	4,771,960	- 3.54	－	－	－
－	9,689,492	- 60.94	－	－	－
－	9,689,492	- 60.94	－	－	－
－	6,016,688,484	- 17.98	－	－	－
－	6,016,688,484	- 17.98	－	－	－
－	6,016,688,484	- 17.98	－	－	－

陸、中華民國 113 年度高雄市非營業特種基金來源用途及餘絀審定

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	243,506,373,000	228,736,436,719	228,736,436,719
債務基金	145,111,568,000	135,662,719,420	135,662,719,420
財政局主管	145,111,568,000	135,662,719,420	135,662,719,420
高雄市債務基金	145,111,568,000	135,662,719,420	135,662,719,420
特別收入基金	65,072,068,000	66,896,757,381	66,896,757,381
教育局主管	60,062,872,000	61,938,818,603	61,938,818,603
高雄市教育發展基金	60,062,872,000	61,938,818,603	61,938,818,603
經濟發展局主管	572,204,000	428,275,956	428,275,956
高雄市促進產業發展基金	572,204,000	428,275,956	428,275,956
工務局主管	191,462,000	266,983,878	266,983,878
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	11,062,000	8,065,454	8,065,454
高雄市永續綠建築經營基金	148,967,000	233,930,709	233,930,709
高雄市道路挖掘管理基金	31,433,000	24,987,715	24,987,715
社會局主管	1,634,152,000	1,635,032,574	1,635,032,574
高雄市公益彩券盈餘基金	1,634,152,000	1,635,032,574	1,635,032,574
環境保護局主管	2,219,772,000	2,277,039,498	2,277,039,498
高雄市環境保護基金	2,219,772,000	2,277,039,498	2,277,039,498
農業局主管	232,784,000	201,597,676	201,597,676
高雄市農業發展基金	232,784,000	201,597,676	201,597,676
勞工局主管	142,963,000	132,743,297	132,743,297
高雄市勞工權益基金	6,321,000	3,812,328	3,812,328
高雄市身心障礙者就業基金	136,642,000	128,930,969	128,930,969
文化局主管	15,859,000	16,265,899	16,265,899
高雄市公共藝術基金	15,859,000	16,265,899	16,265,899
資本計畫基金	33,322,737,000	26,176,959,918	26,176,959,918
捷運工程局主管	33,322,737,000	26,176,959,918	26,176,959,918
高雄市捷運建設基金	33,322,737,000	26,176,959,918	26,176,959,918

註：本表高雄市教育發展基金、高雄市促進產業發展基金、高雄市永續綠建築經營基金、高雄市道路挖掘管理基金、度預算數、報准先行辦理數及以前年度保留數等之執行數。

數額綜計表－債務基金、特別收入基金及資本計畫基金（基金別）（續）

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
－	14,769,936,281	- 6.07	－	－	－
－	9,448,848,580	- 6.51	－	－	－
－	9,448,848,580	- 6.51	－	－	－
－	9,448,848,580	- 6.51	－	－	－
1,824,689,381	－	2.80	－	－	－
1,875,946,603	－	3.12	－	－	－
1,875,946,603	－	3.12	－	－	－
－	143,928,044	- 25.15	－	－	－
－	143,928,044	- 25.15	－	－	－
75,521,878	－	39.44	－	－	－
－	2,996,546	- 27.09	－	－	－
84,963,709	－	57.04	－	－	－
－	6,445,285	- 20.50	－	－	－
880,574	－	0.05	－	－	－
880,574	－	0.05	－	－	－
57,267,498	－	2.58	－	－	－
57,267,498	－	2.58	－	－	－
－	31,186,324	- 13.40	－	－	－
－	31,186,324	- 13.40	－	－	－
－	10,219,703	- 7.15	－	－	－
－	2,508,672	- 39.69	－	－	－
－	7,711,031	- 5.64	－	－	－
406,899	－	2.57	－	－	－
406,899	－	2.57	－	－	－
－	7,145,777,082	- 21.44	－	－	－
－	7,145,777,082	- 21.44	－	－	－
－	7,145,777,082	- 21.44	－	－	－

高雄市環境保護基金、高雄市農業發展基金、高雄市公共藝術基金、高雄市捷運建設基金決算審定數，包含 113 年

陸、中華民國 113 年度高雄市非營業特種基金來源用途及餘絀審定

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	**- 1,584,723,000**	**1,040,529,642**	**1,041,129,642**
債務基金	**- 88,000**	**83,978**	**83,978**
財政局主管	**- 88,000**	**83,978**	**83,978**
高雄市債務基金	- 88,000	83,978	83,978
特別收入基金	**- 1,716,584,000**	**- 220,591,934**	**- 219,991,934**
教育局主管	**- 722,861,000**	**- 344,458,005**	**- 344,458,005**
高雄市教育發展基金	- 722,861,000	- 344,458,005	- 344,458,005
經濟發展局主管	**61,130,000**	**270,868,619**	**270,868,619**
高雄市促進產業發展基金	61,130,000	270,868,619	270,868,619
工務局主管	**34,093,000**	**- 47,030,429**	**- 47,030,429**
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	102,000	319,251	319,251
高雄市永續綠建築經營基金	14,424,000	- 71,158,697	- 71,158,697
高雄市道路挖掘管理基金	19,567,000	23,809,017	23,809,017
社會局主管	**- 468,180,000**	**376,012,390**	**376,012,390**
高雄市公益彩券盈餘基金	- 468,180,000	376,012,390	376,012,390
環境保護局主管	**- 574,474,000**	**- 563,906,368**	**- 563,306,368**
高雄市環境保護基金	- 574,474,000	- 563,906,368	- 563,306,368
農業局主管	**- 46,153,000**	**92,106,676**	**92,106,676**
高雄市農業發展基金	- 46,153,000	92,106,676	92,106,676
勞工局主管	**- 180,000**	**5,870,574**	**5,870,574**
高雄市勞工權益基金	1,537,000	4,648,503	4,648,503
高雄市身心障礙者就業基金	- 1,717,000	1,222,071	1,222,071
文化局主管	**41,000**	**- 10,055,391**	**- 10,055,391**
高雄市公共藝術基金	41,000	- 10,055,391	- 10,055,391
資本計畫基金	**131,949,000**	**1,261,037,598**	**1,261,037,598**
捷運工程局主管	**131,949,000**	**1,261,037,598**	**1,261,037,598**
高雄市捷運建設基金	131,949,000	1,261,037,598	1,261,037,598

數額綜計表－債務基金、特別收入基金及資本計畫基金（基金別）（續）

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
2,625,852,642	－	--	600,000	－	0.06
171,978	－	--	－	－	－
171,978	－	--	－	－	－
171,978	－	--	－	－	－
1,496,592,066	－	- 87.18	600,000	－	- 0.27
378,402,995	－	- 52.35	－	－	－
378,402,995	－	- 52.35	－	－	－
209,738,619	－	343.10	－	－	－
209,738,619	－	343.10	－	－	－
－	81,123,429	--	－	－	－
217,251	－	212.99	－	－	－
－	85,582,697	--	－	－	－
4,242,017	－	21.68	－	－	－
844,192,390	－	--	－	－	－
844,192,390	－	--	－	－	－
11,167,632	－	- 1.94	600,000	－	- 0.11
11,167,632	－	- 1.94	600,000	－	- 0.11
138,259,676	－	--	－	－	－
138,259,676	－	--	－	－	－
6,050,574	－	--	－	－	－
3,111,503	－	202.44	－	－	－
2,939,071	－	--	－	－	－
－	10,096,391	--	－	－	－
－	10,096,391	--	－	－	－
1,129,088,598	－	855.70	－	－	－
1,129,088,598	－	855.70	－	－	－
1,129,088,598	－	855.70	－	－	－

丁、決算修正

壹、中華民國 113 年度高雄市

科目				修正內容	修		
					實現數		應收
款	項	目	名稱		增	減	增
			總計		－	－	200,000
2			**罰款及賠償收入**		－	－	200,000
	84		法制局		－	－	200,000
		1	賠償收入	增列應收國家賠償求償收入。	－	－	200,000
4			**財產收入**		－	－	－
	46		財政局		－	－	－
		2	財產售價	減列溢保留應收土地價款。	－	－	－

數明細表

總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

正數			數			
數	保留數		合計		應繳回市庫數	備註
減	增	減	增	減		
9,970,488	－	－	200,000	9,970,488	200,000	
－	－	－	200,000	－	200,000	
－	－	－	200,000	－	200,000	
－	－	－	200,000	－	200,000	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
9,970,488	－	－	－	9,970,488	－	
9,970,488	－	－	－	9,970,488	－	
9,970,488	－	－	－	9,970,488	－	

貳、中華民國 113 年度高雄市

科目				修正內容	修		
					實現數		應
款	項	目	名稱		增	減	增
			總計		－	2,398,171	－
2			**市政府主管**		－	2,398,171	－
	10		鹽埕區公所		－	50,117	－
			民政支出		－	50,117	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	50,117	－
	11		鼓山區公所		－	85,855	－
			民政支出		－	85,855	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	85,855	－
	12		左營區公所		－	163,148	－
			民政支出		－	163,148	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	163,148	－
	13		楠梓區公所		－	9,530	－
			民政支出		－	9,530	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	9,530	－
	14		三民區公所		－	333,371	－
			民政支出		－	333,371	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	333,371	－
	15		新興區公所		－	53,513	－
			民政支出		－	53,513	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	53,513	－
	16		前金區公所		－	72,061	－
			民政支出		－	72,061	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	72,061	－
	17		苓雅區公所		－	97,782	－
			民政支出		－	97,782	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	97,782	－
	18		前鎮區公所		－	130,063	－

總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

正數					應繳回市庫數		備註
付數	保留數		合計				
減	增	減	增	減	剔除數	減列數	
－	2,398,171	－	2,398,171	2,398,171	－	－	
－	2,398,171	－	2,398,171	2,398,171	－	－	
－	50,117	－	50,117	50,117	－	－	
－	50,117	－	50,117	50,117	－	－	
－	50,117	－	50,117	50,117	－	－	
－	85,855	－	85,855	85,855	－	－	
－	85,855	－	85,855	85,855	－	－	
－	85,855	－	85,855	85,855	－	－	
－	163,148	－	163,148	163,148	－	－	
－	163,148	－	163,148	163,148	－	－	
－	163,148	－	163,148	163,148	－	－	
－	9,530	－	9,530	9,530	－	－	
－	9,530	－	9,530	9,530	－	－	
－	9,530	－	9,530	9,530	－	－	
－	333,371	－	333,371	333,371	－	－	
－	333,371	－	333,371	333,371	－	－	
－	333,371	－	333,371	333,371	－	－	
－	53,513	－	53,513	53,513	－	－	
－	53,513	－	53,513	53,513	－	－	
－	53,513	－	53,513	53,513	－	－	
－	72,061	－	72,061	72,061	－	－	
－	72,061	－	72,061	72,061	－	－	
－	72,061	－	72,061	72,061	－	－	
－	97,782	－	97,782	97,782	－	－	
－	97,782	－	97,782	97,782	－	－	
－	97,782	－	97,782	97,782	－	－	
－	130,063	－	130,063	130,063	－	－	

貳、中華民國 113 年度高雄市

科目				修正內容	修		
					實現數		應
款	項	目	名稱		增	減	增
			民政支出		—	130,063	—
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	130,063	—
	19		旗津區公所		—	54,424	—
			民政支出		—	54,424	—
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	54,424	—
	20		小港區公所		—	124,028	—
			民政支出		—	124,028	—
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	124,028	—
	21		鳳山區公所		—	178,163	—
			民政支出		—	178,163	—
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	178,163	—
	22		林園區公所		—	38,915	—
			民政支出		—	38,915	—
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	38,915	—
	23		大寮區公所		—	42,716	—
			民政支出		—	42,716	—
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	42,716	—
	24		大樹區公所		—	40,130	—
			民政支出		—	40,130	—
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	40,130	—
	25		大社區公所		—	58,190	—
			民政支出		—	58,190	—
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	58,190	—
	26		仁武區公所		—	26,717	—
			民政支出		—	26,717	—
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	26,717	—
	27		鳥松區公所		—	20,049	—

總決算歲出決算修正數明細表（續）

單位：新臺幣元

正數					應繳回市庫數		備註
付數	保留數		合計				
減	增	減	增	減	剔除數	減列數	
－	130,063	－	130,063	130,063	－	－	
－	130,063	－	130,063	130,063	－	－	
－	54,424	－	54,424	54,424	－	－	
－	54,424	－	54,424	54,424	－	－	
－	54,424	－	54,424	54,424	－	－	
－	124,028	－	124,028	124,028	－	－	
－	124,028	－	124,028	124,028	－	－	
－	124,028	－	124,028	124,028	－	－	
－	178,163	－	178,163	178,163	－	－	
－	178,163	－	178,163	178,163	－	－	
－	178,163	－	178,163	178,163	－	－	
－	38,915	－	38,915	38,915	－	－	
－	38,915	－	38,915	38,915	－	－	
－	38,915	－	38,915	38,915	－	－	
－	42,716	－	42,716	42,716	－	－	
－	42,716	－	42,716	42,716	－	－	
－	42,716	－	42,716	42,716	－	－	
－	40,130	－	40,130	40,130	－	－	
－	40,130	－	40,130	40,130	－	－	
－	40,130	－	40,130	40,130	－	－	
－	58,190	－	58,190	58,190	－	－	
－	58,190	－	58,190	58,190	－	－	
－	58,190	－	58,190	58,190	－	－	
－	26,717	－	26,717	26,717	－	－	
－	26,717	－	26,717	26,717	－	－	
－	26,717	－	26,717	26,717	－	－	
－	20,049	－	20,049	20,049	－	－	

貳、中華民國 113 年度高雄市

科目				修正內容	修		
					實現數		應
款	項	目	名稱		增	減	增
			民政支出		－	20,049	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	20,049	－
	28		岡山區公所		－	85,578	－
			民政支出		－	85,578	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	85,578	－
	29		橋頭區公所		－	78,821	－
			民政支出		－	78,821	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	78,821	－
	30		燕巢區公所		－	44,430	－
			民政支出		－	44,430	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	44,430	－
	31		田寮區公所		－	51,178	－
			民政支出		－	51,178	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	51,178	－
	32		阿蓮區公所		－	15,746	－
			民政支出		－	15,746	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	15,746	－
	33		路竹區公所		－	85,978	－
			民政支出		－	85,978	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	85,978	－
	34		湖內區公所		－	28,411	－
			民政支出		－	28,411	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	28,411	－
	35		茄萣區公所		－	53,685	－
			民政支出		－	53,685	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	53,685	－
	36		永安區公所		－	46,252	－

總決算歲出決算修正數明細表（續）

單位：新臺幣元

正數					應繳回市庫數		備註
付數	保留數		合計				
減	增	減	增	減	剔除數	減列數	
－	20,049	－	20,049	20,049	－	－	
－	20,049	－	20,049	20,049	－	－	
－	85,578	－	85,578	85,578	－	－	
－	85,578	－	85,578	85,578	－	－	
－	85,578	－	85,578	85,578	－	－	
－	78,821	－	78,821	78,821	－	－	
－	78,821	－	78,821	78,821	－	－	
－	78,821	－	78,821	78,821	－	－	
－	44,430	－	44,430	44,430	－	－	
－	44,430	－	44,430	44,430	－	－	
－	44,430	－	44,430	44,430	－	－	
－	51,178	－	51,178	51,178	－	－	
－	51,178	－	51,178	51,178	－	－	
－	51,178	－	51,178	51,178	－	－	
－	15,746	－	15,746	15,746	－	－	
－	15,746	－	15,746	15,746	－	－	
－	15,746	－	15,746	15,746	－	－	
－	85,978	－	85,978	85,978	－	－	
－	85,978	－	85,978	85,978	－	－	
－	85,978	－	85,978	85,978	－	－	
－	28,411	－	28,411	28,411	－	－	
－	28,411	－	28,411	28,411	－	－	
－	28,411	－	28,411	28,411	－	－	
－	53,685	－	53,685	53,685	－	－	
－	53,685	－	53,685	53,685	－	－	
－	53,685	－	53,685	53,685	－	－	
－	46,252	－	46,252	46,252	－	－	

貳、中華民國 113 年度高雄市

科目				修正內容	修		
					實現數		應
款	項	目	名稱		增	減	增
			民政支出		－	46,252	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	46,252	－
	37		彌陀區公所		－	69,109	－
			民政支出		－	69,109	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	69,109	－
	38		梓官區公所		－	34,916	－
			民政支出		－	34,916	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	34,916	－
	39		旗山區公所		－	66,558	－
			民政支出		－	66,558	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	66,558	－
	40		美濃區公所		－	66,306	－
			民政支出		－	66,306	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	66,306	－
	41		六龜區公所		－	15,878	－
			民政支出		－	15,878	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	15,878	－
	42		甲仙區公所		－	17,436	－
			民政支出		－	17,436	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	17,436	－
	43		杉林區公所		－	18,438	－
			民政支出		－	18,438	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	18,438	－
	44		內門區公所		－	40,679	－
			民政支出		－	40,679	－
		1	一般行政	減列未合規定之私人門號電信費。	－	40,679	－

總決算歲出決算修正數明細表（續）

單位：新臺幣元

正數					應繳回市庫數		備註
付數	保留數		合計				
減	增	減	增	減	剔除數	減列數	
－	46,252	－	46,252	46,252	－	－	
－	46,252	－	46,252	46,252	－	－	
－	69,109	－	69,109	69,109	－	－	
－	69,109	－	69,109	69,109	－	－	
－	69,109	－	69,109	69,109	－	－	
－	34,916	－	34,916	34,916	－	－	
－	34,916	－	34,916	34,916	－	－	
－	34,916	－	34,916	34,916	－	－	
－	66,558	－	66,558	66,558	－	－	
－	66,558	－	66,558	66,558	－	－	
－	66,558	－	66,558	66,558	－	－	
－	66,306	－	66,306	66,306	－	－	
－	66,306	－	66,306	66,306	－	－	
－	66,306	－	66,306	66,306	－	－	
－	15,878	－	15,878	15,878	－	－	
－	15,878	－	15,878	15,878	－	－	
－	15,878	－	15,878	15,878	－	－	
－	17,436	－	17,436	17,436	－	－	
－	17,436	－	17,436	17,436	－	－	
－	17,436	－	17,436	17,436	－	－	
－	18,438	－	18,438	18,438	－	－	
－	18,438	－	18,438	18,438	－	－	
－	18,438	－	18,438	18,438	－	－	
－	40,679	－	40,679	40,679	－	－	
－	40,679	－	40,679	40,679	－	－	
－	40,679	－	40,679	40,679	－	－	

參、高雄市營業基金及非營業

中華民國

基金名稱	修正事項	修正收入（基金來源）	
		增列金額	減列金額
非營業部分	**總計**	**26,161,992**	**－**
作業基金	**合計**	**25,561,992**	**－**
高雄市殯葬事業管理基金	**小計**	**2,722,200**	**－**
	修正增列勞務收入	2,722,200	－
	修正增列、減列管理及總務費用	－	－
高雄市實施平均地權基金	**小計**	**18,698,855**	**－**
	修正增列其他業務外收入	18,698,855	－
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	**小計**	**4,140,937**	**－**
	修正增列勞務收入	4,140,937	－
特別收入基金	**合計**	**600,000**	**－**
高雄市環境保護基金	**小計**	**600,000**	**－**
	修正增列其他收入	600,000	－

註：營業基金無修正事項。

特種基金修正事項明細表

113 年度

單位：新臺幣元

修正支出（基金用途）		盈虧（餘絀）增減數	
增列金額	減列金額	增列淨利或賸餘（減列淨損或短絀）	減列淨利或賸餘（增列淨損或短絀）
960,220	13,306	26,175,298	960,220
960,220	13,306	25,575,298	960,220
960,220	13,306	2,735,506	960,220
－	－	2,722,200	－
960,220	13,306	13,306	960,220
－	－	18,698,855	－
－	－	18,698,855	－
－	－	4,140,937	－
－	－	4,140,937	－
－	－	600,000	－
－	－	600,000	－
－	－	600,000	－

戊、附　　錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

113 年度高雄市總決算市庫年度出納終結報告表，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一） 公庫收支餘絀

113 年度收入部分，繳付公庫數 1,706 億 7,938 萬餘元；支出部分，公庫撥入數 1,799 億 9,943 萬餘元，收支相抵計短絀 93 億 2,004 萬餘元，其餘絀情形如次：

1. **113 年度總決算部分**：歲入實收數 1,590 億 3,257 萬餘元，歲出實支數 1,599 億 8,491 萬餘元，收支相抵計短絀 9 億 5,234 萬餘元。

2. **不屬於 113 年度總決算部分**：總決算以前年度收入計收 116 億 4,474 萬餘元，高雄市高坪特定區開發計畫特別決算以前年度收入計收 206 萬餘元；總決算以前年度支出計支 81 億 7,995 萬餘元，高雄市高坪特定區開發計畫特別決算以前年度支出計支 241 萬餘元，墊付款 47 億 7,213 萬餘元。收支相抵計短絀 13 億 770 萬餘元。

3. **債務之舉借及償還部分**：總決算 113 年度無債務舉借收入，債務償還支出 70 億 6,000 萬元，收支相抵後短絀 70 億 6,000 萬元。

上述短絀合計 93 億 2,004 萬餘元，即為 113 年度市庫短絀。

（二） 公庫結存

113 年度市庫短絀 93 億 2,004 萬餘元，加計 112 年度市庫結存轉入數 40 億 1,642 萬餘元、

特種基金淨增保管款存放餘額 80 億 8,837 萬餘元、各機關淨增保管款存放餘額 130 億 699 萬餘元，113 年度結存轉入 114 年度之市庫結存數為 157 億 9,174 萬餘元。

二、113 年度總決算及特別決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一） 總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113 年度總決算及特別決算收入實現審定數 1,705 億 8,234 萬餘元，與繳付公庫數 1,706 億 7,938 萬餘元相較，差異 9,704 萬餘元，其差異原因僅有加項 9,704 萬餘元，包括：

1. 以前年度撥款於 113 年度繳還數 9,686 萬餘元。

2. 預收款 17 萬餘元。

上述加項數額 9,704 萬餘元，即為總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二） 總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113 年度總決算及特別決算支出實現審定數 1,735 億 8,858 萬餘元，與公庫撥入數 1,799 億 9,943 萬餘元相較，差異 64 億 1,084 萬餘元，其差異原因如次：

1. 加項 92 億 4,406 萬餘元，包括：

（1） 預付款 12 億 7,203 萬餘元。

（2） 材料 182 萬餘元。

（3） 存出保證金 338 萬餘元。

（4） 退還收入（預收）款 9 億 8,715 萬餘元。

（5） 其他應收款 79 萬餘元。

（6） 墊付數 69 億 7,646 萬餘元。

（7） 本處修正數 239 萬餘元。

2. 減項 28 億 3,321 萬餘元，包括：

（1） 以前年度撥款於 113 年度實現數 5 億 3,108 萬餘元。

（2） 以前年度撥款墊付轉正數 23 億 212 萬餘元。

3. 上述加項與減項數額相抵後，差額 64 億 1,084 萬餘元，即為總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、113 年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

113 年度審定歲入決算數 1,700 億 1,992 萬餘元，歲出決算數 1,641 億 263 萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘 59 億 1,728 萬餘元；繳付公庫數 1,706 億,7,938 萬餘元，公庫撥入數 1,799 億 9,943 萬餘元，相抵後市庫收支短絀 93 億 2,004 萬餘元。113 年度市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數差異 152 億 3,733 萬餘元，其差異情形分析如次：

（一） 加項 309 億 4,063 萬餘元，包括：

1. 113 年度市庫已列支，而不屬 113 年度總決算歲出部分 199 億 3,728 萬餘元。

（1） 支付各機關以前年度支出 71 億 9,279 萬餘元。

（2） 退還以前年度歲入 9 億 8,715 萬餘元。

（3） 113 年度總決算債務償還支出 70 億 6,000 萬元。

（4） 高雄市高坪特定區開發計畫特別決算以前年度支出 241 萬餘元。

（5） 市庫撥付各機關墊付款（淨額）46 億 9,463 萬餘元。

（6） 調整市庫 113 年度支出 27 萬餘元。

2. 總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 109 億 9,729 萬餘元。

3. 各機關尚未繳庫款 585 萬餘元，係 113 年度支出賸餘尚未繳庫款。

4. 本處修正數 20 萬元。

（二） 減項 157 億 330 萬餘元，包括：

1. 113 年度市庫已列收，而不屬 113 年度總決算歲入部分 115 億 6,975 萬餘元。

（1） 各機關解繳以前年度歲入 115 億 4,787 萬餘元。

（2） 各機關解繳以前年度歲出賸餘 1,964 萬餘元。

（3） 預收款 17 萬餘元。

（4） 高雄市高坪特定區開發計畫特別決算以前年度收入 206 萬餘元。

2. 總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 41 億 2,357 萬餘元。

3. 本處修正數 997 萬餘元。

（三） 上述加項與減項數額相抵後，差額 152 億 3,733 萬餘元，即為市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將 113 年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與

中華民國

項目	收入實現審定數	減項			加項
		收入待納庫數	修正數	合計	以前年度待納庫繳庫數
收入合計數	**170,582,345,988**	—	—	—	—
113 年度收入	**159,032,399,431**	—	—	—	—
稅課收入	92,612,025,192	—	—	—	—
罰款及賠償收入	2,652,219,578	—	—	—	—
規費收入	6,301,577,508	—	—	—	—
財產收入	1,262,402,375	—	—	—	—
營業盈餘及事業收入	202,453,048	—	—	—	—
補助及協助收入	49,536,854,491	—	—	—	—
捐獻及贈與收入	1,449,873,220	—	—	—	—
其他收入	5,014,994,019	—	—	—	—
以前年度收入	**11,547,877,013**	—	—	—	—
以前年度應收（保留）數	11,547,877,013	—	—	—	—
以前年度歲入納庫款	—	—	—	—	—
收回以前年度支出賸餘款	—	—	—	—	—
收回剔除經費	—	—	—	—	—
以前年度特別決算收入	**2,069,544**	—	—	—	—
高雄市高坪特定區開發計畫特別決算	2,069,544	—	—	—	—
債務舉借收入	**—**	—	—	—	—
總決算－113 年度	—	—	—	—	—
總決算－以前年度	—	—	—	—	—

戊－5

繳付公庫數分析表

113 年度

單位：新臺幣元

項							
以前年度撥款於 113 年度繳還數			預收款	剔除經費	修正數	合計	繳付公庫數
材料	存出保證金	其他應收款					
1,845,672	1,340,075	93,682,996	171,550	－	－	97,040,293	170,679,386,281
－	－	－	171,550	－	－	171,550	159,032,570,981
－	－	－	－	－	－	－	92,612,025,192
－	－	－	－	－	－	－	2,652,219,578
－	－	－	－	－	－	－	6,301,577,508
－	－	－	－	－	－	－	1,262,402,375
－	－	－	－	－	－	－	202,453,048
－	－	－	171,550	－	－	171,550	49,537,026,041
－	－	－	－	－	－	－	1,449,873,220
－	－	－	－	－	－	－	5,014,994,019
1,845,672	1,340,075	93,682,996	－	－	－	96,868,743	11,644,745,756
－	－	－	－	－	－	－	11,547,877,013
－	－	－	－	－	－	－	－
1,845,672	1,340,075	93,682,996	－	－	－	96,868,743	96,868,743
－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	2,069,544
－	－	－	－	－	－	－	2,069,544
－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－

戊－6

支出實現審定數與

中華民國

項目	支出實現審定數	加				
		預付款	材料	存出保證金	退還收入（預收）款	其他應收款
支出合計數	**173,588,586,966**	**1,272,033,128**	**1,828,443**	**3,383,499**	**987,157,628**	**799,481**
113年度支出	**158,956,417,146**	**1,020,244,554**	**1,828,443**	**3,383,499**	**—**	**647,040**
市議會主管	749,253,785	—	—	—	—	—
市政府主管	6,734,226,966	38,212,467	—	1,882,000	—	—
民政局主管	1,434,073,518	7,344,000	—	—	—	—
財政局主管	3,705,631,748	—	—	400	—	—
教育局主管	57,878,808,725	—	—	—	—	—
經濟發展局主管	830,672,922	—	—	—	—	—
工務局主管	6,800,736,622	210,018,441	—	—	—	112,352
社會局主管	19,686,932,932	50,050,000	—	1,099	—	—
警察局主管	11,300,185,698	—	—	—	—	—
衛生局主管	7,819,804,998	9,700,215	—	—	—	—
環境保護局主管	5,480,202,218	964,347	1,828,443	—	—	—
地政局主管	1,174,143,181	—	—	—	—	—
新聞局主管	215,822,497	85,866	—	—	—	—
農業局主管	2,314,845,085	276,123	—	—	—	—
勞工局主管	859,062,509	—	—	—	—	—
捷運工程局主管	5,620,150,562	—	—	—	—	—
消防局主管	2,979,865,818	3,679,222	—	—	—	—
文化局主管	2,312,526,718	—	—	—	—	—
交通局主管	2,731,580,248	—	—	—	—	—
海洋局主管	954,271,933	—	—	—	—	—
都市發展局主管	319,586,841	—	—	—	—	—
法制局主管	70,851,275	—	—	—	—	—
觀光局主管	984,846,919	180,973	—	—	—	—
水利局主管	6,715,651,241	555,603,657	—	1,500,000	—	363,138
毒品防制局主管	151,488,616	—	—	—	—	171,550
運動發展局主管	1,111,524,737	144,129,243	—	—	—	—
青年局主管	158,087,935	—	—	—	—	—
統籌支撥科目	7,861,580,899	—	—	—	—	—

公庫撥入數分析表

113 年度

單位：新臺幣元

增項			減項				公庫撥入數
墊付數	修正數	合計	以前年度撥款於113年度實現數	墊付轉正數	修正數	合計	
6,976,462,038	2,398,171	9,244,062,388	531,087,977	2,302,126,978	－	2,833,214,955	179,999,434,399
－	2,398,171	1,028,501,707	－	－	－	－	159,984,918,853
－	－	－	－	－	－	－	749,253,785
－	2,398,171	42,492,638	－	－	－	－	6,776,719,604
－	－	7,344,000	－	－	－	－	1,441,417,518
－	－	400	－	－	－	－	3,705,632,148
－	－	－	－	－	－	－	57,878,808,725
－	－	－	－	－	－	－	830,672,922
－	－	210,130,793	－	－	－	－	7,010,867,415
－	－	50,051,099	－	－	－	－	19,736,984,031
－	－	－	－	－	－	－	11,300,185,698
－	－	9,700,215	－	－	－	－	7,829,505,213
－	－	2,792,790	－	－	－	－	5,482,995,008
－	－	－	－	－	－	－	1,174,143,181
－	－	85,866	－	－	－	－	215,908,363
－	－	276,123	－	－	－	－	2,315,121,208
－	－	－	－	－	－	－	859,062,509
－	－	－	－	－	－	－	5,620,150,562
－	－	3,679,222	－	－	－	－	2,983,545,040
－	－	－	－	－	－	－	2,312,526,718
－	－	－	－	－	－	－	2,731,580,248
－	－	－	－	－	－	－	954,271,933
－	－	－	－	－	－	－	319,586,841
－	－	－	－	－	－	－	70,851,275
－	－	180,973	－	－	－	－	985,027,892
－	－	557,466,795	－	－	－	－	7,273,118,036
－	－	171,550	－	－	－	－	151,660,166
－	－	144,129,243	－	－	－	－	1,255,653,980
－	－	－	－	－	－	－	158,087,935
－	－	－	－	－	－	－	7,861,580,899

支出實現審定數與

中華民國

項目	支出實現審定數	加				
		預付款	材料	存出保證金	退還收入（預收）款	其他應收款
以前年度支出	7,569,750,112	153,985,204	—	—	987,157,628	152,441
以前年度應付（保留）數	7,569,750,112	153,985,204	—	—	—	152,441
退還以前年度收入數	—	—	—	—	987,157,628	—
債務償還支出	7,060,000,000	—	—	—	—	—
以前年度特別決算支出	2,419,708	—	—	—	—	—
高雄市高坪特定區開發計畫特別決算	2,419,708	—	—	—	—	—
墊付款	—	97,803,370	—	—	—	—
收支餘絀	—	—	—	—	—	—
112 年度市庫結存數	—	—	—	—	—	—
特種基金淨增保管款存放餘額	—	—	—	—	—	—
各機關淨增保管款存放餘額	—	—	—	—	—	—
113 年度市庫結存數	—	—	—	—	—	—

註：截至 113 年度止，市庫分別向特種基金及各機關保管款調度 298 億 711 萬 9,877 元及 332 億 6,499 萬 505 元，合計 630 億

公庫撥入數分析表（續）

113 年度

單位：新臺幣元

增項			減項				公庫撥入數
墊付數	修正數	合計	以前年度撥款於113年度實現數	墊付轉正數	修正數	合計	
－	－	1,141,295,273	531,087,977	－	－	531,087,977	8,179,957,408
－	－	154,137,645	531,087,977	－	－	531,087,977	7,192,799,780
－	－	987,157,628	－	－	－	－	987,157,628
－	－	－	－	－	－	－	7,060,000,000
－	－	－	－	－	－	－	2,419,708
－	－	－	－	－	－	－	2,419,708
6,976,462,038	－	7,074,265,408	－	2,302,126,978	－	2,302,126,978	4,772,138,430
－	－	－	－	－	－	－	-9,320,048,118
－	－	－	－	－	－	－	4,016,422,991
－	－	－	－	－	－	－	8,088,376,474
－	－	－	－	－	－	－	13,006,997,603
－	－	－	－	－	－	－	15,791,748,950

7,211 萬 382 元（不含已納入集中支付之高雄市教育發展基金 82 億 1,050 萬 3,093 元）。

公庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	金額		
	小計	合計	總計
甲、113 年度市庫收支餘絀			- 9,320,048,118
乙、加項			30,940,638,363
一、113 年度市庫列支而不屬 113 年度總決算歲出部分		19,937,287,742	
（一）支付各機關以前年度支出	7,192,799,780		
（二）退還以前年度歲入	987,157,628		
（三）113 年度總決算債務償還支出	7,060,000,000		
（四）高雄市高坪特定區開發計畫特別決算以前年度支出	2,419,708		
（五）市庫撥付各機關墊付款（淨額）	4,694,635,287		
（六）調整市庫 113 年度支出	275,339		
二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款		10,997,291,639	
三、各機關尚未繳庫款		5,858,982	
四、修正數		200,000	
丙、減項			15,703,302,330
一、113 年度市庫列收而不屬 113 年度總決算歲入部分		11,569,759,046	
（一）各機關解繳以前年度歲入	11,547,877,013		
（二）各機關解繳以前年度歲出賸餘	19,640,939		
（三）預收款	171,550		
（四）高雄市高坪特定區開發計畫特別決算以前年度收入	2,069,544		
二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款		4,123,572,796	
三、修正數		9,970,488	
丁、113 年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙）			5,917,287,915

貳、平衡表之查核

113 年度高雄市總決算平衡表（113 年 12 月 31 日）計列資產 3 兆 5,331 億 3,778 萬餘元、負債 3,041 億 1,083 萬餘元、淨資產 3 兆 2,290 億 2,695 萬餘元。茲將市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一） **流動資產**：包括現金、應收款項、應收其他基金款、應收其他政府款、存貨、預付款、其他流動資產，合計 393 億 6,034 萬餘元，較 112 年底之 283 億 1,742 萬餘元，增加 110 億 4,292 萬餘元，茲分析如次：

1. 「現金」科目 193 億 2,100 萬餘元，較 112 年底增加 118 億 5,523 萬餘元，主要係各機關納集中支付金額增加所致。

2. 「應收款項」科目 128 億 6,131 萬餘元，較 112 年底減少 16 億 8,956 萬餘元，主要係應收中央統籌分配稅款減少等所致。

3. 「應收其他基金款」科目 51 億元，較 112 年底增加 20 億 5,000 萬元，主要係地政局應收高雄市實施平均地權基金賸餘繳庫數增加等所致。

4. 「應收其他政府款」科目 6 億 3,691 萬餘元，較 112 年底減少 18 億 241 萬餘元，主要係捷運工程局應收中央補助辦理岡山路竹延伸線（第二階段）及環狀輕軌捷運建設計畫款已實現等所致。

（二） **長期投資**：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計 763 億 8,127 萬餘元，較 112 年底之 762 億 7,674 萬餘元，增加 1 億 452 萬餘元，主要係地政局認列高雄市實施平均地權基金採權益法之投資評價調整增加等所致。

（三） **固定資產**：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計 3 兆 4,130 億 7,763 萬餘元，較 112

年底之 3 兆 3,098 億 3,939 萬餘元，增加 1,032 億 3,824 萬餘元，主要係道路養護工程處經管之土地價值依公告現值調整增加等所致。

（四） **無形資產**：該科目金額 2 億 7,623 萬餘元，較 112 年底之 2 億 8,773 萬餘元，減少 1,149 萬餘元，主要係工務局提列電腦軟體攤銷費用增加等所致。

（五） **其他資產**：包括暫付款、存出保證金，合計 40 億 4,228 萬餘元，較 112 年底之 38 億 3,093 萬餘元，增加 2 億 1,134 萬餘元，主要係地政局土地開發處暫付 CC－11－28 營區土壤及地下水污染改善工程款增加等所致。

二、負債類

（一） **流動負債**：包括應付款項、應付其他基金款、應付其他政府款、預收款、預收其他政府款，合計 446 億 6,176 萬餘元，較 112 年底之 324 億 7,859 萬餘元，增加 121 億 8,316 萬餘元，主要係預收 114 年度一般性補助款等所致。

（二） **長期負債**：包括應付債券、長期借款，合計 2,155 億 1,700 萬元，較 112 年底之 2,225 億 7,700 萬元，減少 70 億 6,000 萬元，主要係公債發行數較到期償還數減少所致。

（三） **其他負債**：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計 439 億 3,206 萬餘元，較 112 年底之 354 億 2,695 萬餘元，增加 85 億 511 萬餘元，主要係特種基金保管款納集中支付金額增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目 3 兆 2,290 億 2,695 萬餘元，較 112 年底之 3 兆 1,280 億 6,967 萬餘元，增加 1,009 億 5,727 萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將 113 年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

高 雄 市 總 決 算 平 衡 表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**3,533,137,781,859**	**100.00**	**3,418,552,232,431**	**100.00**	**114,585,549,428**	**3.35**
流動資產	39,360,346,878	1.11	28,317,426,549	0.83	11,042,920,329	39.00
現金	19,321,006,525	0.55	7,465,766,876	0.22	11,855,239,649	158.79
應收款項	12,861,311,122	0.36	14,550,873,051	0.43	- 1,689,561,929	- 11.61
應收其他基金款	5,100,000,000	0.14	3,050,000,000	0.09	2,050,000,000	67.21
應收其他政府款	636,913,649	0.02	2,439,328,433	0.07	- 1,802,414,784	- 73.89
存貨	8,946,363	0.00	8,977,592	0.00	- 31,229	- 0.35
預付款	1,381,112,687	0.04	751,424,065	0.02	629,688,622	83.80
其他流動資產	51,056,532	0.00	51,056,532	0.00	—	—
長期投資	76,381,272,541	2.16	76,276,743,843	2.23	104,528,698	0.14
採權益法之投資	71,689,733,244	2.03	71,585,189,648	2.09	104,543,596	0.15
其他長期投資	4,691,539,297	0.13	4,691,554,195	0.14	- 14,898	0.00
固定資產	3,413,077,637,093	96.60	3,309,839,390,431	96.82	103,238,246,662	3.12
土地	3,347,046,870,653	94.73	3,247,377,815,128	94.99	99,669,055,525	3.07
土地改良物	10,364,158,373	0.29	10,795,242,769	0.32	- 431,084,396	- 3.99
房屋建築及設備	26,887,141,500	0.76	27,207,605,017	0.80	- 320,463,517	- 1.18
機械及設備	4,616,638,001	0.13	4,885,178,494	0.14	- 268,540,493	- 5.50
交通及運輸設備	2,977,232,349	0.08	2,728,295,036	0.08	248,937,313	9.12
雜項設備	928,875,041	0.03	818,516,598	0.02	110,358,443	13.48
收藏品及傳承資產	4,015,990,112	0.11	2,275,461,104	0.07	1,740,529,008	76.49
購建中固定資產	16,240,731,064	0.46	13,751,276,285	0.40	2,489,454,779	18.10
無形資產	276,239,116	0.01	287,732,550	0.01	- 11,493,434	- 3.99
無形資產	276,239,116	0.01	287,732,550	0.01	- 11,493,434	- 3.99
其他資產	4,042,286,231	0.11	3,830,939,058	0.11	211,347,173	5.52
暫付款	4,033,685,155	0.11	3,824,443,206	0.11	209,241,949	5.47
存出保證金	8,601,076	0.00	6,495,852	0.00	2,105,224	32.41

高 雄 市 總 決 算 平 衡 表（ 續 ）

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**304,110,830,255**	**8.61**	**290,482,552,893**	**8.50**	**13,628,277,362**	**4.69**
流動負債	44,661,760,586	1.26	32,478,595,848	0.95	12,183,164,738	37.51
應付款項	27,542,837,716	0.78	27,752,346,471	0.81	- 209,508,755	- 0.75
應付其他基金款	14,008,821	0.00	90,136,437	0.00	- 76,127,616	- 84.46
應付其他政府款	8,408,563	0.00	26,260,032	0.00	- 17,851,469	- 67.98
預收款	1,966,739	0.00	57,288,612	0.00	- 55,321,873	- 96.57
預收其他政府款	17,094,538,747	0.48	4,552,564,296	0.13	12,541,974,451	275.49
長期負債	215,517,000,000	6.10	222,577,000,000	6.51	- 7,060,000,000	- 3.17
應付債券	116,600,000,000	3.30	126,800,000,000	3.71	- 10,200,000,000	- 8.04
長期借款	98,917,000,000	2.80	95,777,000,000	2.80	3,140,000,000	3.28
其他負債	43,932,069,669	1.24	35,426,957,045	1.04	8,505,112,624	24.01
遞延收入	657,524,467	0.02	582,865,830	0.02	74,658,637	12.81
存入保證金	2,666,214,445	0.08	2,524,349,014	0.07	141,865,431	5.62
應付保管款	40,402,778,873	1.14	31,905,357,435	0.93	8,497,421,438	26.63
暫收款	205,551,884	0.01	414,384,766	0.01	- 208,832,882	- 50.40
淨資產	**3,229,026,951,604**	**91.39**	**3,128,069,679,538**	**91.50**	**100,957,272,066**	**3.23**
負債及淨資產合計	**3,533,137,781,859**	**100.00**	**3,418,552,232,431**	**100.00**	**114,585,549,428**	**3.35**

本處審核 113 年度高雄市總決算、附屬單位決算及綜計表、特別決算以前年度轉入數決算表結果，計修正總決算淨減列歲入決算應收數 9,770,488 元、減列歲出決算實現數 2,398,171 元；修正附屬單位決算及綜計表，淨增加「長期投資」之評價調整 20,474,141 元，決算審核修正後之資產總額 3 兆 5,331 億 5,088 萬餘元、負債總額 3,041 億 1,083 萬餘元、淨資產為 3 兆 2,290 億 4,005 萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表（請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）。

附：財產目錄之查核

113 年度高雄市總決算財產總目錄，計列市有財產總值 3 兆 8,429 億 1,540 萬餘元，經本處更正減列公用財產價值 122 萬餘元，市有財產總值計 3 兆 8,429 億 1,417 萬餘元（其中珍貴財產總值 40 億 4,387 萬餘元），分為公用財產、非公用財產 2 類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等 3 部分。有關市有財產業務之重要審核意見，已於「乙、決算審核結果」各主管篇項下列述，茲將財產總目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

113 年度總決算財產總目錄列公用財產總值 3 兆 7,607 億 3,313 萬餘元，經本處更正減列公務用財產價值 122 萬餘元，公用財產總值計 3 兆 7,607 億 3,191 萬餘元（其中珍貴財產總值 40 億 4,387 萬餘元），占市有財產總值 97.86%，較 112 年度決算列數 3 兆 6,546 億 7,394 萬餘元，增加 1,060 億 5,796 萬餘元，約 2.90%。茲按公務用、公共用及事業用財產 3 部分，分述如次：

（一） 公務用財產

113 年度總決算財產總目錄列公務用財產總值 5,678 億 6,086 萬餘元，經本處更正減列高雄市殯葬事業管理基金之什項設備價值 122 萬餘元，公務用財產總值計 5,678 億 5,963 萬餘元（其中珍貴財產總值 19 億 9,503 萬餘元），占市有財產總值 14.78%，較 112 年度決算列數 5,562 億 8,149 萬餘元，增加 115 億 7,813 萬餘元，約 2.08%，主要係高雄市教育發展基金經管土地依公告現值調整帳面價值等所致。

（二） 公共用財產

113 年度總決算財產總目錄列公共用財產總值 3 兆 1,928 億 3,709 萬餘元（其中珍貴財產總值 20 億 4,884 萬餘元），占市有財產總值 83.08%，較 112 年度決算列數 3 兆 983 億 5,700 萬餘元，增加 944 億 8,008 萬餘元，約 3.05%，主要係道路養護工程處經管土地依公告現值調整帳面價值等所致。

（三） 事業用財產

113 年度總決算財產總目錄列事業用財產總值 3,517 萬餘元，較 112 年度決算列數 3,544 萬餘元，減少 26 萬餘元，約 0.74%，主要係動產質借所提列房屋建築折舊費用所致。

二、非公用財產

113 年度總決算財產總目錄列非公用財產總值 821 億 8,226 萬餘元，占市有財產總值 2.14%，較 112 年度決算列數 787 億 9,818 萬餘元，增加 33 億 8,408 萬餘元，約 4.29%，主要係高雄市市有財產開發基金參與高雄銀行股份有限公司現金增資，有價證券價值增加所致。

參、特別決算以前年度轉入數決算表之查核

高雄市高坪特定區開發計畫特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算表

市政府為帶動大坪頂新市鎮之整體開發，編列高雄市高坪特定區開發計畫特別預算 136 億 174 萬餘元，執行期間自 78 年 7 月至 86 年 12 月，辦理大坪頂新市鎮第 1、2 期開發工程暨土地區段徵收等整體開發業務。113 年度繼續辦理設施改善、地上物、雜草清運等工程，暨土地點交、標售作業等事項。以前年度歲入保留轉入數為 38 億 5,739 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 206 萬餘元（0.05%）；應收保留數 38 億 5,738 萬餘元（100.00%），主要係開發土地部分尚未出售，須保留續予執行。以前年度歲出保留轉入數為 35 億 950 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 241 萬餘元（0.07%）；應付保留數 35 億 708 萬餘元（99.93%），主要係應付債務還本，須保留續予執行。

茲將該特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算之審定，及應付保留數原因分析，分別列表如次：

（一） 以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	
								金額	%
	合計	3,857,392	－	－	－	－	2,069	3,857,381	100.00
78-87	地政局主管	3,857,392	－	－	－	－	2,069	3,857,381	100.00
	罰款及賠償收入	－	－	－	－	－	2,058	－	－
	賠償收入	－	－	－	－	－	2,058	－	－
	信託管理收入	29,354	－	－	－	－	－	29,354	100.00
	管理收入	29,354	－	－	－	－	－	29,354	100.00
	財產收入	3,178,038	－	－	－	－	10	3,178,027	100.00
	財產售價	3,178,038	－	－	－	－	10	3,178,027	100.00
	公債及賒借收入	650,000	－	－	－	－	－	650,000	100.00
	賒借收入	650,000	－	－	－	－	－	650,000	100.00

（二） 以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	合計	3,509,507	－	－	－	－	2,419	3,507,087	99.93
78-87	地政局主管	3,509,507	－	－	－	－	2,419	3,507,087	99.93
	前土地開發總隊	3,509,507	－	－	－	－	2,419	3,507,087	99.93
	新市鎮開發	606,507	－	－	－	－	2,419	604,087	99.60
	債務還本	2,903,000	－	－	－	－	－	2,903,000	100.00

（三） 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣千元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	地政局				
78-87	管理收入	29,354	29,354	100.00	工程尚未執行，配合款尚待收繳，須保留續予執行。
	財產售價	3,178,038	3,178,027	100.00	財產尚未完成標售作業，須保留續予執行。
	賒借收入	650,000	650,000	100.00	配合歲出預算執行情形貸款，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（四） 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	地政局				
78-87	新市鎮開發	606,507	604,087	99.60	高坪特定區土地管理維護等相關項目，須保留續予執行。
	債務還本	2,903,000	2,903,000	100.00	償還債務本金，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

肆、行政法人年度決算之查核

行政法人法第 19 條規定，行政法人應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董（理）事會審議，並經監事或監事會通過後，報請監督機關備查，並送審計機關；前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。截至 113 年度止，市政府依法設立之行政法人計有高雄市專業文化機構、高雄市立圖書館及高雄流行音樂中心等 3 個單位，其年度執行成果及決算報告書均依法送本處審核。茲將審核情形分述如次：

市政府監督

（一） 高雄市專業文化機構

高雄市專業文化機構係依據 105 年 6 月 30 日公布之高雄市專業文化機構設置自治條例及市政府 105 年 8 月 11 日高市府文發字第 10531035800 號令，於 106 年 1 月 1 日由文化局所屬市立歷史博物館（下稱史博館）及電影館（下稱電影館）先行改制成立，同年 7 月 1 日再納入該局所屬市立美術館（下稱美術館），監督機關為市政府。業務範圍包括：1. 文化藝術活動之策劃、行銷、推廣、合作及交流；2. 經營管理美術館、史博館、電影館等文化機構及場域；3. 受託辦理文化藝術活動及營運管理文化設施等。該機構 113 年度執行成果及決算報告書，業經該機構委任國富浩華聯合會計師事務所蘇子云會計師查核簽證，提出查核報告，於 114 年 3 月 18 日提經該機構第 3 屆 114 年度第 1 次董事會議審議，並經監事通過後，依該機構設置自治條例第 24 條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如次：

1. 計畫實施之查核

113 年度各館業務計畫為：(1) 美術館：深耕大南方同心圓策略，多元關照在地創作能量；提升研究成果流通，開放展覽多元面貌；營造一日藝術生態生活圈，積極開發美術館新觀眾等，各項計畫執行結果，以大南方多元史觀為核心，購藏 47 件關鍵藝術家作品，且獲捐贈 75 件作品，價值金額 3,000 萬元以上；修復既有典藏品 19 件作品，類別包含：攝影、複合媒材、水墨、雕塑、水彩、油畫；館藏提借 261 件次及圖檔運用達 536 件次；年度出版「藝術認證」半年期刊 2 期，藝術認證專文共 21 篇；策辦戶外市集、園區生態導覽、生活美學體驗課程 52 場，參與人數逾 20 萬人等；(2) 史博館：運用科技拓延常設展觸角，打造高雄歷史學習場域；提供歷史教育

資源，建構多元共學基地；強化高雄史料詮釋，推廣高雄學參與成果等，並辦理文史獎助計畫，獎助出版計畫 2 案、文史調查研究計畫 7 案，計 9 案；完成 22 項典藏文物修復及維護工作、6 項無形文化資產保存維護計畫及協助保存者辦理 16 項傳習推廣計畫與 7 場無形文化資產推廣活動；完成開發 13 項館舍主題特色文創商品；官網點閱數及社群媒體觸及人數達 227 萬 76 人次等；(3)電影館：經營高雄電影品牌，擴大文化影響力；高雄影視永續經營，積極宣傳原創成果；跨域合作電影教育，實踐文化平權；打造專業電影博物館，積累文化資財等，113 年度執行成果包含投資具高雄城市意象的高雄人電影長片計 3 部、高雄劇影集共 3 部、獎助高雄拍短片 9 部；2024 高雄電影節共放映 198 部長短片、197 場次；44 部 XR 作品、高達 11,282 場次，超過 6 成節目完售；於國小進行影像美學教育體驗，計 12 校 24 場，參與人數總計 2,126 人等。

2. 收支營運之審核

113 年度收入預算數 4 億 6,009 萬餘元，執行結果，決算數 6 億 6,067 萬餘元，較預算增加 2 億 58 萬餘元，約 43.60%，主要係辦理政府行政委託收入及獲政府前瞻基礎建設等專案補助收入較預計增加；支出預算數 4 億 5,792 萬餘元，執行結果，決算數 6 億 3,346 萬餘元，較預算增加 1 億 7,553 萬餘元，約 38.33%，主要係獲文化部及文化局專案補助收入增加，致相關支出增加；收支相抵，賸餘 2,720 萬餘元，較預算賸餘 216 萬餘元，增加 2,504 萬餘元，主要原因如上開收入增加之說明。

3. 資產負債及淨值

113 年 12 月 31 日資產總額 36 億 5,469 萬餘元，其中流動資產 3 億 2,904 萬餘元，占 9.00%；不動產、廠房及設備 1,669 萬餘元，占 0.46%；無形資產 16 萬餘元，其他資產 33 億 879 萬餘元，占 90.54%。負債總額 35 億 2,643 萬餘元，占資產總額 96.49%，其中流動負債 2 億 498 萬餘元，占資產總額 5.61%；其他負債 33 億 2,145 萬餘元，占資產總額 90.88%。淨值 1 億 2,826 萬餘元，占資產總額 3.51%，均為累積賸餘。

4. 重要審核意見

為推動各項文化事務政策，積極協同專業文化機構策辦多元藝文展演活動等工作，惟採購制度之建立與落實情形未臻周妥，允宜督促檢討改善。

文化局職掌及推動高雄市各項文化事務政策，協同行政法人高雄市專業文化機構（下轄高

雄市立歷史博物館、高雄市立電影館、高雄市立美術館等 3 個場館，下稱專業文化機構、史博館、電影館及美術館），策辦多元藝文展演活動等工作。又專業文化機構為使採購作業有所依循，確保採購作業落實公開、公正之原則，依其設置自治條例第 31 條第 4 項規定訂定「高雄市專業文化機構採購作業實施規章」，據以實施該機構下轄各館之工程、財物及勞務等採購作業，以達到良好及有效控管機制。專業文化機構 113 年度接受各級政府獎補助、委託或代辦經費辦理各項採購案，總計契約金額 1 億 9,130 萬餘元。經查該法人採購制度之建立與落實情形，核有：（1）辦理非適用政府採購法未達一定金額（150 萬元）之採購，多採逕洽廠商取得報價方式，不利於促進採購競爭，且對於公開招標採購資訊公告未盡落實，及非公開招標之決標資訊，尚有增進公開透明之空間；（2）採購作業規章之監辦作業規範未臻完善；（3）美術館舉辦外國設計品牌特展，惟相關採購間有未覈實比較廠商履約實績及報價，即簽辦指定廠商議價、未依契約規定分工展品包裝及裝箱作業，及未於履約前辦妥相關保險事宜；（4）美術館辦理「『X 人稱-黃心健的元宇宙劇場』沉浸式體驗空間及投影拼接技術委託服務」採購，採購審查委員會不同委員評審結果有明顯差異，惟未提交議決或辦理複評；（5）史博館辦理「113 年空調設備汰換」採購開標作業，由未經指派之人員擔任主持人等情事，經函請市政府督促檢討改善。據復：(1)將督促史博館、電影館及美術館確實視個案採購需求擇定適切之辦理方式，以確保採購案件公平及公正，並對非適用政府採購法之採購案招、決標資訊公開作業與適用範圍，促請檢討及修訂專業文化機構採購作業實施規章，確實依規定辦理各案公開作業；（2）後續將研擬與修訂專業文化機構採購作業實施規章之監辦規定；（3）因應開展時程壓力與考量運輸效率，調整卸展後空運裝箱作業，實際執行情形與契約內容不符，未先行辦理契約變更，採購作業確有疏漏，後續加強採購作業教育訓練；（4）因沿用舊範本表格，未即時於評選總表與評選會議紀錄修改及增加議決事項，已請美術館檢討相關評選過程並加強內部訓練，避免類似情事再次發生；（5）對於非由指派人員擔任開標作業主持人情事，已請史博館檢討並加強內部人員採購訓練，避免類似情事再次發生。

5. 112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見，計有為強化博物館城市形象，成立行政法人專業文化機構，促進美術館、史博館及電影館有效經營管理，惟內部稽核制度、人事進用辦理情

形未臻周妥與美術館典藏品策展加值運用及作品曝光度偏低，有待督促檢討改善 1 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該行政法人 113 年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

高雄市專業文化機構收支營運表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目	預算數		決算數		決算數與預算數比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入合計	**460,095**	**100.00**	**660,676**	**100.00**	**200,581**	**43.60**
業務收入	453,926	98.66	625,968	94.75	172,042	37.90
業務外收入	6,169	1.34	34,707	5.25	28,538	462.61
支出合計	**457,928**	**99.53**	**633,467**	**95.88**	**175,539**	**38.33**
業務成本與費用	457,928	99.53	633,266	95.85	175,338	38.29
業務外費用	—	—	200	0.03	200	--
本期賸餘（短絀）	**2,167**	**0.47**	**27,209**	**4.12**	**25,042**	**1,155.61**

高雄市專業文化機構平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

科目	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**3,654,699**	**100.00**	**3,539,504**	**100.00**	**115,194**	**3.25**
流動資產	329,046	9.00	264,018	7.46	65,027	24.63
不動產、廠房及設備	16,695	0.46	15,927	0.45	767	4.82
無形資產	166	0.00	223	0.01	- 56	- 25.34
其他資產	3,308,790	90.54	3,259,334	92.08	49,455	1.52
負債及淨值	**3,654,699**	**100.00**	**3,539,504**	**100.00**	**115,194**	**3.25**
負債	**3,526,437**	**96.49**	**3,438,451**	**97.15**	**87,985**	**2.56**
流動負債	204,982	5.61	169,295	4.78	35,687	21.08
其他負債	3,321,454	90.88	3,269,156	92.36	52,298	1.60
淨值	**128,261**	**3.51**	**101,052**	**2.85**	**27,209**	**26.93**
累積餘絀	128,261	3.51	101,052	2.85	27,209	26.93

註：信託代理與保證資產（負債），113 年底及 112 年底各有 9,244,652 元及 7,521,176 元。

（二） 高雄市立圖書館

高雄市立圖書館（下稱圖書館）係依據 106 年 6 月 19 日公布之高雄市立圖書館設置自治條例及市政府 106 年 6 月 29 日高市府文發字第 10630937800 號令，於 106 年 9 月 1 日成立，監督機關為市政府。業務範圍包括：1.圖書館之經營管理；2.圖書資訊與教育文化活動之策劃、行銷、推廣、合作及交流；3.受託辦理教育文化活動及營運管理教育文化設施等。該館 113 年度執行成果及決算報告書，業經該館委任國富浩華聯合會計師事務所蔡淑滿會計師查核簽證，提出查核報告，於 114 年 3 月 14 日提經該館第 3 屆 114 年度第 1 次董事會議審議，並經監事通過後，依該館設置自治條例第 23 條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如次：

1. 計畫實施之查核

113 年度業務計畫為持續充實館藏資源，提供優質閱覽服務及環境；推動城市閱讀、落實文化平權、辦理多元推廣活動；經營專門主題圖書館，深化民眾閱讀體驗；鏈結繪本產業及創作繪本交流平台；串連外界資源投入閱讀推廣等。各項計畫執行結果，113 年度採購及受贈增加館藏資源共計 12 萬 939 冊；總借閱冊數突破 2,005 萬 7,745 冊，較 112 年度增加 227 萬 5,514 冊；人均借閱量達 7.34 冊，較 112 年成長 13.10%；電子資源推廣活動共計 1,305 場，計 2 萬 7,153 人次參與；電子書推廣種子教師訓練 16 場，深入高雄市 21 所學校，進行 168 場次校園推廣；辦理喜閱網服務，新增電子書 90 種、總藏書數達 1,416 冊，服務國小學童閱讀需求；推廣多元電子書平台如雲端書庫、HyRead 及 Hami Book 等，電子資源借閱量增幅達 87.88%，總使用達 97 萬 1,161 人次，推動文化部數位閱讀政策深入校園，全面提升民眾數位閱讀參與度。

2. 收支營運之審核

113 年度收入預算數 4 億 7,992 萬餘元，執行結果，決算數 5 億 1,770 萬餘元，較預算增加 3,778 萬餘元，約 7.87%，主要係與外部單位合作，勞務收入增加及政府公務專案補助等收入較預計增加所致；支出預算數 4 億 7,812 萬餘元，執行結果，決算數 5 億 1,768 萬餘元，較預算增加 3,955 萬餘元，約 8.27%，主要係與國家發展委員會合作辦理「113 年高雄市圖書館悅讀活動融入雙語元素推動計畫」及交通局委託辦理「內政部國土署『人本交通及教育宣導計畫案

—閱讀交通共好行 2.0』」相關服務成本增加所致；收支相抵，賸餘 2 萬餘元，較預算賸餘 180 萬元，減少 177 萬餘元，主要原因如上開支出增加之說明。

3. 資產負債及淨值

113 年 12 月 31 日資產總額 54 億 8,509 萬餘元，其中流動資產 2 億 2,097 萬餘元，占 4.03%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 200 萬元，占 0.04%；不動產、廠房及設備 1 億 4,862 萬餘元，占 2.71%；其他資產 51 億 1,350 萬餘元，占 93.23%。負債總額 54 億 5,198 萬餘元，占資產總額 99.40%，其中流動負債 9,117 萬餘元，占資產總額 1.66%；其他負債 53 億 6,081 萬餘元，占資產總額 97.73%。淨值 3,311 萬餘元，占資產總額 0.60%，均為累積賸餘。

4. 重要審核意見

為增進城市閱讀力特色，協同圖書館合作推動分齡分眾閱讀活動，惟採購制度之建立與落實情形未臻周妥，允宜督促檢討改善。

文化局為增進城市閱讀力特色，與行政法人高雄市立圖書館（下稱圖書館）合作推動分齡分眾閱讀活動等工作，又圖書館為使採購作業程序有所依循，確保採購作業落實公開、公正之原則，依其設置自治條例第 29 條第 4 項規定，訂定「高雄市立圖書館採購作業實施規章」，據以實施工程、財物及勞務等採購作業，以達到良好及有效控管機制。圖書館 113 年度接受各級政府獎補助、委託或代辦經費辦理各項採購案，總計契約金額 1 億 3,937 萬餘元。經查該法人採購制度之建立與落實情形，核有：(1)辦理非適用政府採購法未達一定金額(150 萬元)之採購，多採逕洽廠商取得報價方式，不利於促進採購競爭；(2) 採購作業規章之監辦作業規範未臻完善；(3)辦理非適用政府採購法之採購及決標資訊，容有增進公開透明度之空間等情事，經函請市政府督促檢討改善。據復：(1) 因採購作業規章施行多年，將函請該行政法人參考政府採購法、文化藝術採購辦法等相關法令規章，全面檢討修訂內容，並兼顧行政法人法運作彈性、效率及採購公開公平原則，督促該法人確實視個案採購需求擇定適切辦理方式，以確保採購案件公平及公正；(2)圖書館將參考政府採購法及其相關法令辦理，並督促圖書館檢討及修改採購作業規章，完善監辦程序；(3) 對於非適用政府採購法之採購案招、決標資訊公開作業與適用範圍，將督促圖書館檢討及修訂採購作業規章，落實採購作業公開。

5. 112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見，計有為促進圖書館之有效經營管理，提供完善圖書資訊服務，成立行政法人高雄市立圖書館，惟圖書借閱等工作辦理情形未臻完善，有待督促檢討改善 1 項，經屢續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該行政法人 113 年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

高雄市立圖書館收支營運表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目	預算數		決算數		決算數與預算數比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入合計	**479,928**	**100.00**	**517,708**	**100.00**	**37,780**	**7.87**
業務收入	467,474	97.41	490,348	94.72	22,874	4.89
業務外收入	12,454	2.59	27,360	5.28	14,906	119.69
支出合計	**478,128**	**99.62**	**517,687**	**100.00**	**39,559**	**8.27**
業務成本與費用	478,128	99.62	517,682	99.99	39,554	8.27
業務外費用	—	—	5	0.00	5	--
本期賸餘（短絀）	**1,800**	**0.38**	**21**	**0.00**	**- 1,778**	**- 98.78**

高雄市立圖書館平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

科目	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**5,485,099**	**100.00**	**5,458,426**	**100.00**	**26,673**	**0.49**
流動資產	220,976	4.03	209,902	3.85	11,073	5.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000	0.04	9,160	0.17	- 7,160	- 78.17
不動產、廠房及設備	148,620	2.71	132,776	2.43	15,844	11.93
其他資產	5,113,502	93.23	5,106,587	93.55	6,915	0.14
負債及淨值	**5,485,099**	**100.00**	**5,458,426**	**100.00**	**26,673**	**0.49**
負債	**5,451,987**	**99.40**	**5,425,336**	**99.39**	**26,651**	**0.49**
流動負債	91,174	1.66	96,540	1.77	- 5,366	- 5.56
其他負債	5,360,813	97.73	5,328,795	97.63	32,017	0.60
淨值	**33,112**	**0.60**	**33,090**	**0.61**	**21**	**0.07**
累積餘絀	33,112	0.60	33,090	0.61	21	0.07

註：1. 信託代理與保證資產（負債），113 年底及 112 年底各有 1,718,298 元及 2,813,317 元。
2. 為配合 113 年度財務報表表達，112 年度預收收入及遞延收入重分類。

（三） 高雄流行音樂中心

高雄流行音樂中心（下稱高流中心）係依據 106 年 6 月 19 日公布之高雄流行音樂中心設置自治條例及市政府 106 年 7 月 20 日高市府文發字第 10631064900 號令，於 107 年 1 月 1 日成立，監督機關為市政府。業務範圍包括：1.經營管理高流中心及相關文創產業空間；2.規劃辦理及行銷流行音樂活動，扶植流行音樂產業，培育相關文創人才及策辦展示活動；3.受託辦理流行音樂相關研究及推廣業務；4.受託經營管理文創產業空間等。該中心 113 年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任國富浩華聯合會計師事務所蔡淑滿會計師查核簽證，提出查核報告，於 114 年 3 月 21 日提經該中心第 3 屆 114 年度第 1 次董事會議審議，並經監事通過後，依該中心設置自治條例第 23 條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如次：

1. 計畫實施之查核

113 年度營運計畫內容包括，充實專業人力提升行政效能、出版自製影音蓄積高流品牌厚度、加強會員互動增加回饋機制、擴充高流系專業課程培育音樂人才、辦理流行音樂專才培育創作營隊、持續自製特色音樂活動及音樂展覽、推動國際音樂活動交流、完備場域設施功能與優化各類演出場館、扶植音樂新創鏈結產業互動合作。各項計畫執行結果，辦理「2024 Takao Rock 打狗祭」、「2024 金曲!國語作業簿」、「爵對龍有春」等 6 檔音樂企畫活動，計 10 場次，吸引 22 萬 1,720 人次；辦理專業人才培育講座計 14 場次及音樂培訓課程 6 場次，共 3,637 人次參與；校園推廣觸及學生 2,785 人，配合文化局等單位推廣活動 23 場，觸及 1,263 人；海音館與海風廣場演出 108 場、觀眾 38 萬 9,515 人次；LIVE WAREHOUSE 演出 134 場、6 萬 5,168 人次參與；大港開唱 105 場次、約 30 萬人次參與；集客活動辦理 2 檔、吸引 65 萬 645 人次；全區場域招商進駐率 9 成，進駐廠商辦理活動或場地合作 381 場。

2. 收支營運之審核

113 年度收入預算數 1 億 6,344 萬餘元，執行結果，決算數 2 億 4,588 萬餘元，較預算增加 8,243 萬餘元，約 50.44%，主要係市政府專案補助及委託執行計畫增加，致業務收入較預計增加；支出預算數 1 億 6,886 萬餘元，執行結果，決算數 2 億 8,239 萬餘元，較預算增加 1 億 1,353 萬餘元，約 67.24%，主要係市政府專案補助及委託執行計畫增加，致相關支出增加；收支相抵，短絀 3,651 萬餘元，較預算短絀 541 萬餘元，增加 3,109 萬餘元，主要原因如上開支出增加之說明。

3. 資產負債及淨值

113 年 12 月 31 日資產總額 1 億 889 萬餘元，其中流動資產 7,864 萬餘元，占 72.22%；不動產、廠房及設備 674 萬餘元，占 6.19%；其他資產 2,350 萬餘元，占 21.58%。負債總額 7,882 萬餘元，占資產總額 72.39%，其中流動負債 4,275 萬餘元，占資產總額 39.26%；其他負債 3,607 萬餘元，占資產總額 33.13%。淨值 3,006 萬餘元，占資產總額 27.61%，均為累積賸餘。

4. 重要審核意見

為發展與扶植流行音樂產業，協同高流中心辦理扶植在地音樂人才發展等工作，惟採購制度之建立與落實情形未臻周妥，允宜督促檢討改善。

文化局為發展與扶植流行音樂產業，協同行政法人高雄流行音樂中心（下稱高流中心），辦理扶植在地音樂人才發展等工作。又高流中心為使採購作業程序有所依循，確保採購作業落實公開、公正之原則，依其設置自治條例第 29 條第 4 項規定訂定「高雄流行音樂中心採購作業規章」，據以實施該中心之工程、財物及勞務等採購作業，以達到良好及有效控管機制。高流中心 113 年度接受各級政府獎補助、委託或代辦經費辦理各項採購案，總計契約金額為 5,115 萬餘元。經查該法人採購制度之建立與落實情形，核有：(1)辦理非適用政府採購法未達一定金額(150 萬元）之採購，多採逕洽廠商取得報價方式，不利於促進採購競爭，且對於辦理非適用政府採購法之採購資訊及決標資訊，尚有增進公開透明度之空間；（2）為宣傳流行音樂展演活動資訊，汰換 LED 字幕顯示設備，惟採購之資通訊產品為大陸廠牌，允待督促提升資安防護；（3）辦理大型活動，間有委商執行契約未規範公共意外責任險投保事項，及安全許可申請資料未妥為保存等情事，經函請市政府督促檢討改善。據復：（1）將督促高流中心確實視個案採購需求擇定適切之辦理方式，以確保採購案件公平及公正，並對非適用政府採購法之採購案招、決標資訊公開作業與適用範圍，促請檢討及修訂高流中心採購作業規章，確實依規定辦理各案公開作業；(2)因顯示設備解析度規格特殊，高流中心已積極進行市場調查有無其他產品可供替代，亦研議洽詢其他業者更換該設備之可行性，以免除資安疑慮，另將督促高流中心爾後採購避免有類似情形發生；（3）保險事項係協議由承攬廠商辦理，漏未於契約中規範，高流中心將檢討相關文書範本，確保履約管理，掌握活動安全保障事宜。

5. 112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見，計有為扶植在地流行音樂，增進流行音樂文創產值，成立行政法人高雄流行音樂中心，惟辦理場館招商工作及人事進用情形未臻周妥，有待督促檢討改善 1 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該行政法人 113 年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

高雄流行音樂中心收支營運表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目	預算數		決算數		決算數與預算數比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入合計	**163,445**	**100.00**	**245,880**	**100.00**	**82,435**	**50.44**
業務收入	156,265	95.61	215,591	87.68	59,326	37.97
業務外收入	7,180	4.39	30,288	12.32	23,108	321.85
支出合計	**168,862**	**103.31**	**282,396**	**114.85**	**113,534**	**67.24**
業務成本與費用	168,862	103.31	282,396	114.85	113,534	67.24
本期賸餘（短絀）	**- 5,417**	**- 3.31**	**- 36,515**	**- 14.85**	**- 31,098**	**574.09**

高雄流行音樂中心平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

科目	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**108,893**	**100.00**	**122,074**	**100.00**	**- 13,180**	**- 10.80**
流動資產	78,647	72.22	103,223	84.56	- 24,576	- 23.81
不動產、廠房及設備	6,742	6.19	65	0.05	6,676	10,148.85
無形資產	—	—	142	0.12	- 142	- 100.00
其他資產	23,504	21.58	18,642	15.27	4,862	26.08
負債及淨值	**108,893**	**100.00**	**122,074**	**100.00**	**- 13,180**	**- 10.80**
負債	**78,827**	**72.39**	**55,492**	**45.46**	**23,335**	**42.05**
流動負債	42,752	39.26	24,789	20.31	17,962	72.46
其他負債	36,075	33.13	30,703	25.15	5,372	17.50
淨值	**30,065**	**27.61**	**66,581**	**54.54**	**- 36,515**	**- 54.84**
累積賸絀	30,065	27.61	66,581	54.54	- 36,515	- 54.84

伍、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第 41 條第 3 項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。113 年度總決算編製作業手冊亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。113 年度各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計 8 個，基金總額 5 億 4,404 萬餘元（詳政府捐助財團法人明細表），其中政府捐助基金 3 億 5,571 萬餘元，占基金總額 65.38%，又 113 年度營運結果，賸餘者 6 個，賸餘金額 1,176 萬餘元；短絀者 2 個，短絀金額 3,001 萬餘元，綜計短絀 1,825 萬餘元。另 113 年度接受政府委辦及捐助經費（不含捐助基金，以下同）1 億 4,251 萬餘元。茲將本處審核情形分述如次：

一、營運概況

（一） 市政府主管政府捐助財團法人 1 個，基金總額 3,000 萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113 年度接受政府捐助經費 970 萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾 80%。

（二） 社會局主管政府捐助財團法人計 2 個，基金總額 2 億 2,734 萬餘元，其中接受政府捐助基金 1 億 1,571 萬餘元，占 50.90%，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者與賸餘者各 1 個；113 年度無接受政府委辦及捐助經費。

（三） 環境保護局主管政府捐助財團法人 1 個，基金總額 1,310 萬餘元，其中接受政府捐助基金 300 萬元，占 22.89%，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113 年度接受政府委辦及捐助經費 921 萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾 80%。

（四） 消防局主管政府捐助財團法人 1 個，基金總額 5,000 萬元，其中接受政府捐助基金 1,500 萬元，占 30.00%，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113 年度無接受政府委辦及捐助經費。

（五） 文化局主管政府捐助財團法人計 2 個，基金總額 2 億 1,000 萬元，其中接受政府捐助基金 1 億 9,000 萬元，占 90.48%，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者與賸餘者各 1 個；113 年度接受政府捐助經費者 1 個，捐助經費 1 億 1,900 萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾 50%。

（六） 毒品防制局主管政府捐助財團法人 1 個，基金總額 1,358 萬餘元，其中接受政府

捐助基金 200 萬元，占 14.72%，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113 年度接受政府委辦經費 458 萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾 50%。

二、重要審核意見

捐助成立財團法人積極辦理施用毒品者輔導處遇、個案管理及建構家庭支持網絡等社會福利相關事務，惟基金會捐助章程未適時修正，且基金會之效益評估未公開透明，允宜檢討改善，俾提升捐助成立財團法人監督作業。

為結合民間資源從事毒品防制相關社會福利慈善事務，俾協助藥癮者復歸家庭及社會，毒品防制局捐助成立財團法人高雄市毒品防制事務基金會（下稱毒防基金會），辦理有關施用毒品者輔導處遇、個案管理及建構家庭支持網絡等社會福利相關事務，該基金會 113 年度營運結果，收入計 606 萬餘元，支出計 565 萬餘元，賸餘 40 萬餘元。查毒品防制局對毒防基金會營運業務之監管情形，核有：1.毒防基金會於 106 年 4 月依「高雄市社會福利慈善事業財團法人設立許可及監督準則」(下稱社服法人設立及監督準則)、民法等規定訂立捐助章程，明確該基金會之設立目的、業務、組織架構、管理方式、捐助財產等規範，嗣法務部為健全財團法人之組織及運作，於 107 年 8 月制定財團法人法，國內各財團法人陸續依法研修捐助章程之相關規範，且市政府亦於 109 年 4 月廢止上開社服法人設立及監督準則，惟迄至 113 年 11 月止，毒品防制局遲未督促毒防基金會配合最新法規完備捐助章程之相關規範；2.毒品防制局雖依規定於官網公開預決算書等財務資訊，供民眾查閱，惟因部分報表存有缺漏，致未能查悉該基金會最新之基金規模、捐助財產及捐助效益評估等財務資訊，基金會營運管理之公開透明作業未臻完善等情事，經函請毒品防制局檢討改善。據復：1.已督促毒防基金會辦理捐助章程修正作業，刻由社會局進行審核作業；2.已將預決算相關書表完整公開於官網，俾民眾查閱相關資訊。

三、112 年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於 112 年度審核報告內列重要審核意見，計有財團法人高雄市文化基金會積極推展高雄市文化建設，促進國內外文化藝術交流，近 3 年營運因受民間捐助，由短絀轉為賸餘，惟人員編制多由主管機關派員兼任，內部控制及稽核恐未臻客觀公正，允宜檢討改善，俾提升基金會創立效能 1 項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助財團法人明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元、%

財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金				113年度營運概況				
			創立時		累計						
	創立基金總額	期末基金總額	金額	占創立基金總額比率	金額	占期末基金總額比率	政府捐助基金以外金額				餘絀
							捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	
總計	333,727	544,043	260,717	78.12	355,717	65.38	136,715	5,795	142,510	50.87	- 18,250
市政府主管（1 個）	30,000	30,000	30,000	100.00	30,000	100.00	9,706	—	9,706	90.34	487
獲有賸餘											
高雄市客家文化事務基金會	30,000	30,000	30,000	100.00	30,000	100.00	9,706	—	9,706	90.34	487
社會局主管（2 個）	125,717	227,347	115,717	92.05	115,717	50.90	—	—	—	—	- 520
1.發生短絀											
後勁社會福利基金會	115,717	217,347	105,717	91.36	105,717	48.64	—	—	—	—	- 5,964
2.獲有賸餘											
惠民醫療救濟基金會	10,000	10,000	10,000	100.00	10,000	100.00	—	—	—	—	5,444
環境保護局主管(1個)	3,000	13,107	3,000	100.00	3,000	22.89	8,000	1,210	9,210	96.78	4,567
獲有賸餘											
ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會	3,000	13,107	3,000	100.00	3,000	22.89	8,000	1,210	9,210	96.78	4,567
消防局主管（1 個）	50,000	50,000	15,000	30.00	15,000	30.00	—	—	—	—	148
獲有賸餘											
高雄市義消安全設備維護基金會	50,000	50,000	15,000	30.00	15,000	30.00	—	—	—	—	148
文化局主管（2 個）	115,000	210,000	95,000	82.61	190,000	90.48	119,009	—	119,009	52.13	- 23,341
1.發生短絀											
高雄市愛樂文化藝術基金會	5,000	10,000	5,000	100.00	10,000	100.00	119,009	—	119,009	52.55	- 24,051
2.獲有賸餘											
高雄市文化基金會	110,000	200,000	90,000	81.82	180,000	90.00	—	—	—	—	710
毒品防制局主管(1個)	10,010	13,588	2,000	19.98	2,000	14.72	—	4,585	4,585	75.63	409
獲有賸餘											
高雄市毒品防制事務基金會	10,010	13,588	2,000	19.98	2,000	14.72	—	4,585	4,585	75.63	409

資料來源：整理自各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。

陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核


市政府為因應城市發展日趨多元、氣候極端變遷及人口結構變化，以「公平城市、社會共好」為施政目標，持續興建社會住宅、大眾捷運系統、下水道系統與更新水利防洪設施，並推動市地重劃、公園開闢與道路新闢、拓寬及橋梁新建、漁港碼頭設施改善、殯葬設施暨場館改善、垃圾掩埋場活化復育與底渣處理廠興建等，提升城市基礎建設服務品質，另亦透過商店街區營造、教育文化暨運動設施場館整建、觀光休閒園區開發等重大公共建設計畫及辦理各項政府採購，強化地方文藝與休閒發展。鑑於重大公共建設及政府採購之推動與執行，向來為社會及輿論媒體關注焦點，113 年度經本處賡續針對市政府所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一） 市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

113 年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達 1 億元以上，由本處列管者計有 83 項，分別由民政局、教育局、經濟發展局、工務局、警察局、衛生局、環境保護局、地政局、捷運工程局、文化局、交通局、海洋局、都市發展局、觀光局、水利局及運動發展局等 16 個主管機關辦理，年度可支用預算數 380 億 7,065 萬餘元，執行數 200 億 4,371 萬餘元，執行率 52.65%，各項計畫執行情形詳如表 1、圖 1，其中預算執行率未達 80%之計畫計有 34 項，其計畫明細如表 2。

圖 1　市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行概況

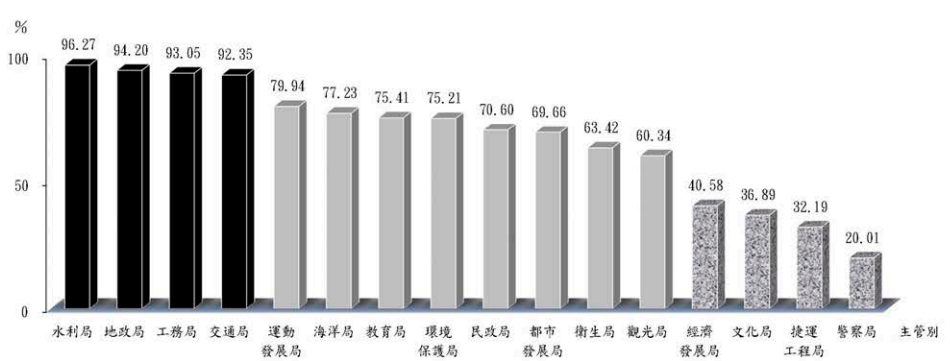

資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

戊－32

表 1　市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、%

序號	主管機關（列管計畫項數）／計畫名稱	年度可支用預算數	年度預算執行數	年度預算執行率
83 項計畫合計		**38,070,656**	**20,043,711**	**52.65**
一、民政局（6 項）		**436,748**	**308,335**	**70.60**
1	第一殯儀館擴充設置案	24,160	1,087	4.50
2	鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔及多元環保葬法生命園區新設工程	27,425	10,847	39.55
3	第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程	25,000	11,884	47.54
4	鳥松公墓南區遷葬案	113,579	81,428	71.69
5	六龜區行政中心新建工程	152,574	123,285	80.80
6	公立納骨塔骨灰櫃位及神主牌位增設暨設施改善工程案	94,008	79,801	84.89
二、教育局（8 項）		**700,941**	**528,597**	**75.41**
1	高雄市立鳳翔國民中學二期校舍新建工程	10,197	—	—
2	壽山國小校舍拆除及新建工程	50,227	2,133	4.25
3	高雄市楠梓區文小 2 用地國小校舍新建工程	148,668	78,079	52.52
4	高雄市巴楠花部落小學改制中小學增建校舍工程	102,903	75,322	73.20
5	楠梓國小健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程	116,033	96,058	82.79
6	高雄市立高雄高級工業職業學校建築實習大樓興建工程	850	837	98.53
7	林園高中新建圖資大樓興建工程	89,570	90,697	101.26
8	旗津國中老舊校舍拆除新建工程	182,492	185,469	101.63
三、經濟發展局（1 項）		**50,000**	**20,290**	**40.58**

表 1　市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、%

序號	主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱	年度可支用預算數	年度預算執行數	年度預算執行率
1	商店街區營造計畫	50,000	20,290	40.58
四、工務局（27 項）		**6,809,441**	**6,336,332**	**93.05**
1	臺鐵高雄機廠貨車工場活化利用	80,000	2,477	3.10
2	亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫	208,894	31,324	15.00
3	高雄市鼓山區九如橋改建工程	48,750	16,381	33.60
4	林園區文賢北路以北打通工程	41,478	24,380	58.78
5	鳳山區過雄街拓寬工程	15,698	11,260	71.73
6	彌陀區中正西路 150 巷開闢工程	48,353	38,565	79.76
7	前鎮媽祖港橋改建工程	140,366	118,505	84.43
8	林園汕尾北汕二路拓寬工程二標	61,721	53,706	87.01
9	林園廣應街拓寬工程	97,632	85,669	87.75
10	高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程	1,235,418	1,091,153	88.32
11	高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段工程－德民路至中海路）	184,446	168,613	91.42
12	仁武區義大二路道路改善工程	51,071	48,729	95.41
13	高雄市六龜區高　133　線道路重建工程（中長期復建工程）	156,378	152,225	97.34
14	大寮區第 81 期重劃區公園開闢工程	101,085	98,986	97.92
15	鼓山區龍德新路拓寬及往東延伸跨越愛河橋梁工程	133,254	133,254	100.00
16	大寮區鳳林一路 300 巷拓寬及打通工程	27,645	27,645	100.00

表 1　市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、%

序號	主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱	年度可支用預算數	年度預算執行數	年度預算執行率
17	左營區介壽路開闢工程	940	940	100.00
18	左營區翠華路（明潭路至世運大道）拓寬工程	120,480	120,480	100.00
19	岡山區筧橋改建工程	64,389	64,389	100.00
20	前鎮漁港建設專案中長程計畫－前鎮漁港景觀線美化及周邊道路整頓及改善工程	47,922	47,922	100.00
21	高雄市鼓山區九如橋改建工程（拆除工程）	91,136	91,136	100.00
22	高雄市濱海聯外道路開闢工程（南段三期－必勝路至南門圓環）	17,527	17,527	100.00
23	仁武區仁心路道路拓寬工程（第一期）	93,652	93,652	100.00
24	彌陀區舊港橋改建工程	112,647	113,999	101.20
25	國防部軍備局生產製造中心第 205 廠光復營區、大樹北營區暨中科院林園營區新建工程	3,536,816	3,583,713	101.33
26	梓官區通安大橋改建工程	80,514	84,032	104.37
27	高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段二期－中海路至必勝路）	11,221	15,656	139.53
五、警察局（1 項）		**105,286**	**21,065**	**20.01**
1	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	105,286	21,065	20.01
六、衛生局（1 項）		**124,501**	**78,958**	**63.42**
1	高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫	124,501	78,958	63.42
七、環境保護局（2 項）		**619,594**	**465,970**	**75.21**
1	底渣處理廠興建	115,605	101,730	88.00
2	高雄市路竹阿蓮區域性垃圾衛生掩埋場活化再利用工程	503,989	364,239	72.27

表 1　市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、%

序號	主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱	年度可支用預算數	年度預算執行數	年度預算執行率
八、地政局（6 項）		**525,188**	**494,746**	**94.20**
1	第 96 期市地重劃區	34,227	17,089	49.93
2	第 81 期市地重劃區	205,024	135,490	66.09
3	第 100 期市地重劃工程	80,810	81,249	100.54
4	第 107 期市地重劃區	106,211	127,869	120.39
5	第 102 期市地重劃區	97,725	119,105	121.88
6	第 108 期市地重劃區	1,191	13,941	1,170.55
九、捷運工程局（5 項）		**23,110,562**	**7,439,414**	**32.19**
1	高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫	4,764,827	99,816	2.09
2	高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫	12,638,077	2,898,934	22.94
3	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二 A 階段）暨周邊土地開發計畫	3,301,480	2,360,396	71.50
4	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫	656,181	505,676	77.06
5	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	1,749,996	1,574,590	89.98
十、文化局（3 項）		**114,601**	**42,281**	**36.89**
1	高雄市立圖書館永安分館新建工程	70,711	1,314	1.86
2	鼓鹽文資建物及周邊街區歷史景觀營造計畫	33,890	30,967	91.38

表 1　市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、%

序號	主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱	年度可支用預算數	年度預算執行數	年度預算執行率
3	文化景觀左營海軍眷村全面修繕基本設計規劃	10,000	10,000	100.00
十一、交通局（4 項）		**346,605**	**320,106**	**92.35**
1	高雄高工附設立體停車場新建工程	147,757	125,408	84.87
2	高雄環狀輕軌二階段平面路口號誌設計與交控系統整合建置案計畫	50,159	46,009	91.73
3	高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	3,210	3,210	100.00
4	新購電力驅動渡輪汰舊計畫	145,478	145,478	100.00
十二、海洋局（5 項）		**823,377**	**635,911**	**77.23**
1	彌陀漁港老舊碼頭改善工程	59,360	24,150	40.68
2	高雄港三號船渠遊艇碼頭整建工程	118,134	75,085	63.56
3	前鎮專案計畫－高雄市漁服中心、漁會大樓建築物外觀及魚市場整建工程	274,477	189,623	69.09
4	旗津漁港深水碼頭整建工程	257,009	232,656	90.52
5	中芸漁港漁筏泊區興建工程	114,395	114,395	100.00
十三、都市發展局（4 項）		**2,121,235**	**1,477,730**	**69.66**
1	三民區新都段公營出租住宅計畫	124,815	9,794	7.85
2	前鎮亞灣智慧公宅（第一期）新建計畫	894,962	601,715	67.23
3	岡山區大鵬九村社會住宅新建計畫	736,610	507,950	68.96

表 1　市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、%

序號	主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱	年度可支用預算數	年度預算執行數	年度預算執行率
4	大寮社會住宅（第一期）新建計畫	364,846	358,270	98.20
十四、觀光局（1 項）		**292,642**	**176,590**	**60.34**
1	高雄市內門觀光休閒園區	292,642	176,590	60.34
十五、水利局（5 項）		**1,142,534**	**1,099,882**	**96.27**
1	中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	60,098	17,446	29.03
2	前鎮漁港下水道系統整建（高雄污水區部分）	54,750	54,750	100.00
3	前鎮漁港下水道系統整建計畫	302,089	302,089	100.00
4	高雄市抽水站設備及抽水機機組更新計畫	38,275	38,275	100.00
5	擴建路污水主幹管（第二過港段）暨中華路污水主幹管（第一區）新建工程	687,322	687,322	100.00
十六、運動發展局（4 項）		**747,399**	**597,498**	**79.94**
1	路竹運動中心建置計畫	69,367	17,605	25.38
2	澄清湖棒球場整修計畫	213,213	175,326	82.23
3	岡山運動中心興建計畫	267,171	232,425	86.99
4	鼓山運動中心建置計畫	197,648	172,141	87.09

註：1. 本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。
2. 年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。
3. 高雄市政府教育局（序號 7、8）、工務局（序號 24 至 27）、地政局（序號 3 至 6）年度預算執行率高於 100%，係因施工或相關作業進度較預計超前，依契約規定辦理估驗計價所致，所需經費來源分別為高雄市教育發展基金、中央補助款、高雄市實施平均地權基金等。
4. 資料來源：表列計畫案件整理自高雄市政府研究發展考核委員會提供府管 1 億元以上重大公共建設計畫（含重大計畫）資料；年度可支用預算數、年度預算執行數整理自各主管機關提供資料。

表 2　市政府所屬各機關 113 年度重大公共

序號	主管機關	計畫名稱	計畫期程	計畫總經費	累計預定支用數	累計實際執行數	總累計執行率
1	教育局	高雄市立鳳翔國民中學二期校舍新建工程	10904－11506	145,000	105,000	3,803	3.62
2	文化局	高雄市立圖書館永安分館新建工程	11104－11512	133,288	100,711	2,055	2.04
3	捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫	11001－12012	53,311,000	4,861,946	421,193	8.66
4	工務局	臺鐵高雄機廠貨車工場活化利用	11306－11502	300,000	80,000	2,477	3.10
5	教育局	壽山國小校舍拆除及新建工程	11001－11510	273,750	54,320	4,985	9.18
6	民政局	第一殯儀館擴充設置案	11101－12112	4,483,650	28,560	1,966	6.89
7	都市發展局	三民區新都段公營出租住宅計畫	10708－11612	735,620	176,810	61,788	34.95
8	工務局	亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫	11207－11412	237,788	208,894	7,499	3.59
9	警察局	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	11201－11512	318,876	142,729	23,947	16.78
10	捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫	10901－11912	144,237,000	14,627,950	5,926,861	40.52
11	運動發展局	路竹運動中心建置計畫	11110－11512	180,000	73,500	16,754	22.79

建設計畫年度預算執行率未達 80%案件

單位：新臺幣千元、%

年度可支用預算數	年度預算執行數	年度預算執行率	落後原因	本處查核意見
10,197	—	—	工程採購多次流標，計畫執行進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
70,711	1,314	1.86	建築結構規劃方案延遲核定，影響計畫執行進度及預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
4,764,827	99,816	2.09	工程預付款尚待依施工進度轉正為實際執行數所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
80,000	2,477	3.10	辦理公民參與說明會及參酌民眾需求調整規劃內容，影響計畫執行進度及預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
50,227	2,133	4.25	工程採購多次流標及廠商提報估驗進度緩辦，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
24,160	1,087	4.50	火化場設置計畫調整，影響整體計畫執行及預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
124,815	9,794	7.85	工程採購多次流標，計畫執行進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
208,894	31,324	15.00	處理工址既有廢棄物，影響工程施作進度及預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
105,286	21,065	20.01	規劃計畫項目執行期程未妥適，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
12,638,077	2,898,934	22.94	工程預付款尚待依施工進度轉正為實際執行數所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
69,367	17,605	25.38	工程採購多次流標及管線牴觸，施工進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

表 2　市政府所屬各機關 113 年度重大公共

序號	主管機關	計畫名稱	計畫期程	計畫總經費	累計預定支用數	累計實際執行數	總累計執行率
12	水利局	中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	10901－11912	1,049,976	304,380	249,294	81.90
13	工務局	高雄市鼓山區九如橋改建工程	11204－11510	461,884	49,756	11,518	23.15
14	民政局	鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔及多元環保葬法生命園區新設工程	10906－11512	357,500	51,890	35,312	68.05
15	經濟發展局	商店街區營造計畫	11301－11512	150,000	50,000	455	0.91
16	海洋局	彌陀漁港老舊碼頭改善工程	11101－11512	300,000	69,940	32,942	47.10
17	民政局	第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程	11301－11712	125,000	25,000	11,884	47.54
18	地政局	第 96 期市地重劃區	10707－11312	112,037	112,037	62,130	55.45
19	教育局	高雄市楠梓區文小 2 用地國小校舍新建工程	11108－11508	880,274	148,668	81,198	54.62
20	工務局	林園區文賢北路以北打通工程	11206－11612	139,814	74,414	52,319	70.31
21	觀光局	高雄市內門觀光休閒園區	10401－11412	564,720	441,187	324,982	73.66
22	衛生局	高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫	10911－11408	258,671	187,677	142,134	75.73
23	海洋局	高雄港三號船渠遊艇碼頭整建工程	11206－11412	145,791	145,791	103,671	71.11

建設計畫年度預算執行率未達 80%案件（續）

單位：新臺幣千元、%

年度可支用預算數	年度預算執行數	年度預算執行率	落後原因	本處查核意見
60,098	17,446	29.03	工程材料進貨期程延遲，影響施工進度及預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
48,750	16,381	33.60	管線抵觸及辦理預力梁變更設計，施工進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
27,425	10,847	39.55	環境影響評估審查作業耗時較久，委託技術服務費用未能依預定時程支付，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
50,000	20,290	40.58	與店家及民眾溝通商圈設施及交通規劃耗時較久，計畫執行進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
59,360	24,150	40.68	工程施工進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
25,000	11,884	47.54	新設火化爐具案未及發包，計畫執行進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
34,227	17,089	49.93	工程進度未如預期，及驗收缺失改善耗時較久，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
148,668	78,079	52.52	統包商提報細部設計及估驗進度緩慢，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
41,478	24,380	58.78	施工進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
292,642	176,590	60.34	受天候及市場缺工等因素，施工進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
124,501	78,958	63.42	工程進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
118,134	75,085	63.56	工程採購多次流標，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

表 2　市政府所屬各機關 113 年度重大公共

序號	主管機關	計畫名稱	計畫期程	計畫總經費	累計預定支用數	累計實際執行數	總累計執行率
24	地政局	第 81 期市地重劃區	10210－11406	1,892,870	599,069	499,695	83.41
25	都市發展局	前鎮亞灣智慧公宅（第一期）新建計畫	11101－11612	3,476,348	1,028,558	735,311	71.49
26	都市發展局	岡山區大鵬九村社會住宅新建計畫	11001－11512	3,584,078	844,740	616,080	72.93
27	海洋局	前鎮專案計畫－高雄市漁服中心、漁會大樓建築物外觀及魚市場整建工程	11001－11405	696,000	696,000	506,081	72.71
28	捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二A階段）暨周邊土地開發計畫	10801－11912	27,918,000	6,518,088	3,088,913	47.39
29	民政局	鳥松公墓南區遷葬案	11203－11308	205,000	128,624	96,473	75.00
30	工務局	鳳山區過雄街拓寬工程	11207－11311	159,470	159,470	116,407	73.00
31	環境保護局	高雄市路竹阿蓮區域性垃圾衛生掩埋場活化再利用工程	10803－11305	781,634	649,849	325,425	50.08
32	教育局	高雄市巴楠花部落小學改制中小學增建校舍工程	10710－11306	191,150	191,150	154,898	81.03
33	捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫	10512－11412	3,965,240	3,070,535	2,782,431	90.62
34	工務局	彌陀區中正西路150巷開闢工程	11106－11405	148,966	128,882	98,823	76.68

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自高雄市政府所屬機關及研究發展考核委員會提供府管 1 億元以上重大公共建設計畫（含重大計畫）資料。

建設計畫年度預算執行率未達 80%案件（續）

單位：新臺幣千元、%

年度可支用預算數	年度預算執行數	年度預算執行率	落後原因	本處查核意見
205,024	135,490	66.09	受天候及辦理變更設計作業等因素，施工進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
894,962	601,715	67.23	統包工程細部設計作業緩慢，計畫執行進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
736,610	507,950	68.96	受天候及市場缺工等因素，施工進度未如預期，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
274,477	189,623	69.09	魚市場整建工程變更設計作業耗時較久，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
3,301,480	2,360,396	71.50	受自來水管線遷改，施工進度未如預期，及工程預付款尚待依施工進度轉正為實際執行數等因素，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
113,579	81,428	71.69	水土保持計畫審查作業耗時較久，委託技術服務費用未能依預定時程支付，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
15,698	11,260	71.73	工程結算作業耗時較久，影響預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
503,989	364,239	72.27	受天候、底渣處理廠興建延後及篩分後可燃性廢棄物去化延遲等因素，影響計畫執行進度及預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
102,903	75,322	73.20	廠商施工量能不足及工程管理欠佳，影響計畫執行進度及預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
656,181	505,676	77.06	工程預付款尚待依施工進度轉正為實際執行數所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
48,353	38,565	79.76	自來水管線及電桿牴觸，辦理遷移作業，影響施工進度及預算執行所致。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。


（二） 審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本處查核市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失

市政府所屬部分機關推動 1 億元以上重大公共建設計畫，因廠商履約進度未如預期等情，造成計畫進度落後情事：市政府所屬各機關 113 年度推動 1 億元以上重大公共建設計畫，由本處列管共計 83 項，其中年度預算執行率未達 80%者計有 34 項。經查落後原因，主要有：A.廠商履約進度未如預期；B.工程介面處理、牴觸管線遷改；C.計畫內容調整、或規劃設計作業耗時較久；D.訂定計畫項目執行期程未妥適；E.辦理變更設計作業或結算驗收改善作業耗時較久；F.工程採購多次流標；G.水土保持計畫、環境影響評估等送請主管或補助機關審查作業費時；H.用地取得或民意協調耗時較久（圖 2），經函請市政府督促各機關研謀改善。據復：A.已請廠商研提趕工計畫並督促加速履約；B.已積極協調施作介面整合及遷改牴觸管線；D.已加速辦理計畫內容調整及規劃設計作業；E.已加速辦理變更設計、驗收缺失改善及結算付款作業；F.已檢討流標原因，修正預算書圖及招標文件，經重新招標已陸續決標，並督促廠商加速履約；G.積極配合主管及補助機關審查作業，並持續管控計畫後續執行進度；H.已積極協調取得需用土地，並達成地方民意共識。

圖 2 市政府所屬各機關重大公共建設計畫年度預算執行率未達 80%落後主要原因

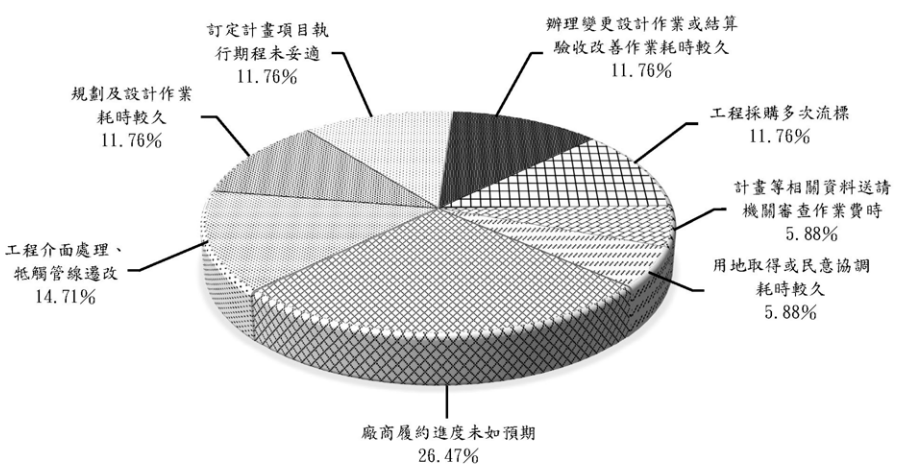

資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

2.個案計畫執行缺失

（1）殯葬事業管理基金櫃（牌）位增設之評估機制未盡覈實，又運用基金經費修繕非基金所管建築物，及核銷作業遲延，致生帳務處理欠周情事，允待檢討改善：高雄市殯葬事業管理基金113年度固定資產建設改良擴充計畫列有7項計畫。經查業務計畫執行情形，核有：A.殯葬管理處為紓解經管納骨塔櫃位日漸不足現象，113年度規劃增設旗山等12區納骨櫃位及旗津等6區神主牌位，惟其中旗山納骨堂於112及113年度增設骨灰櫃位1,296個，卻仍因不敷實際需求，緊急增購櫃位；另旗津生命紀念館神主牌位於112年度第2期增設案辦理時，未審慎規劃，迄113年4月售罄後始辦理緊急採購，顯示需求評估機制未盡覈實；B.運用基金經費修繕非基金所經管之殯儀館建築物且以資本支出入帳，致財產列帳紊亂；C.辦理第一殯儀館財物採購未及時核銷，造成支出資本化及折舊作業延遲等情事，經函請檢討改善。（詳乙－31頁）

（2）配合高雄港第七貨櫃中心聯外運輸需求，積極闢建貨櫃車專用道，改善沿海路交通壅塞情形，惟間有規劃內容未先與土地利害關係人妥為溝通，開工後始變更設計因應，及工程施工品管作業未臻周妥，允待檢討改善：新建工程處規劃於國道7號施工空窗期先辦理「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程」因應，以滿足高雄港貨櫃運輸短、中期需求，提高當地民眾行車安全，所需經費計19億1,638萬餘元，由中央政府全額負擔。該貨櫃車專用道工程施工路段全長約8.28公里，分4個工程標案進行，整體工程預計於114年7月完工。經查辦理情形，核有：A.貨櫃車專用道用地係分別向經濟部、國營臺灣鐵路股份有限公司長期借用及租用，允待積極向主管港務單位爭取經費補助衍生之用地成本，以緩解市政府財政負擔；B.工程規劃設計階段未與工區周遭利害關係人妥為溝通，開工後應當地需求始辦理變更設計，惟所需經費遲未獲核定，允待積極研謀因應，俾如期完工；C.部分工程標施工過程，因遷移牴觸管線及交通維持計畫配合路型調整修正變更，致施工進度受影響，允宜妥擬改善對策，俾如期完成改善港區聯外交通之政策目標等情事，經函請檢討改善。（詳乙－56頁）

（3）因應楠梓產業園區開發，受託代辦楠梓國小校舍拆除及新建工程，期提供學生寬廣活動空間及教師優質教學環境，惟新建工程履約管理未臻周延，允宜研謀改善：市政府為緩解楠梓產業園區開發後鄰近學校學生飽和壓力及學生就近入學需求，並提供學生寬廣活動空間及教師優質教學環境，經教育局委託新建工程處代辦「楠梓國小健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程(第

一期工程）」，契約金額1億5,276萬元，於111年11月開工，主要係興建地上4層之鋼筋混凝土校舍1棟，包含23間普通教室、2間活動室及1間辦公室等。經查辦理情形，核有：A.部分混凝土表面蜂窩、地坪隔熱磚溝縫未填滿、粉刷面裂隙、工區與操場鄰接處未設置安全圍籬阻隔等施工品質欠佳及工地管理欠妥；B.鋁門窗相關工料契約數量編列未盡覈實；C.未依規定辦理粉刷用之細粒料取樣試驗，材料品管作業核有疏漏等情事，經函請檢討改善。（詳乙－59頁）

（4）為解決市轄掩埋場空間不足問題，積極活化已飽和掩埋場空間再利用，惟未妥為規劃掩埋場再飽和後之使用方案，及重置工程未依契約圖說施作等履約管理未臻周延情事，允宜研謀改善：環境保護局為解決市轄掩埋場空間不足問題，近年規劃開挖既有已飽和之掩埋場進行舊垃圾篩分、回收、廢棄物分類處理、設施整建等作業，將騰出之掩埋空間供作最終處置或暫存，以達到掩埋場土地空間活化再利用。其中該局辦理「高雄市路竹阿蓮區域垃圾衛生掩埋場活化重置工程」，經環境部核列計畫經費及補助金額，完成後可提供掩埋面積約3.58公頃，掩埋空間約23萬餘立方公尺。經查辦理情形，核有：A.掩埋場活化後之使用年限僅約5年，惟未妥為規劃活化掩埋場再飽和後之土地使用效益，允宜研酌預為規劃場域使用方案；B.不透水布破損及搭接長度不足、不鏽鋼壓條填縫劑開裂、部分即時監控設備無偵測數據等未依契約設計圖說施作情事；C.鋼筋、不透水布、再生粒料等部分工料之設計數量編列未盡覈實等情事，經函請檢討改善。（詳乙－87頁）

（5）持續推動黃線捷運建設計畫，惟整體計畫經費大幅增漲，部分路線工程無法發包，且機廠用地水保工程期程延遲，影響接續進場施作統包工程之期程，允宜檢討改善：捷運工程局依整體路網評估成果，優先興建高雄都會區大眾捷運系統都會黃線，設有Y1至Y23站，約22.91公里，經費合計1,442億3,700萬元（中央補助833億8,200萬元），嗣因疫情、缺工、戰爭及物價上漲等因素，該局啟動第1次修正計畫作業，經費預計調整至2,423億8,600萬元。經查辦理情形，核有：A.修正計畫尚未獲核定，囿於經費不足，距原綜合規劃報告計畫總經費僅餘206億8,990萬餘元，惟尚有Y9至Y15站、Y19至Y23站之土建及設施機電工程無法辦理發包，恐影響全線營運通車期程；B.鳥松機廠用地遷葬階段之水保工程尚未完成，影響接續進場施作統包工程之期程；C.租稅增額收益迄未收取，允宜依償債計畫內容及期限確實執行，及時挹注償債財源，減少利息負擔等情事，經函請檢討改善。（詳乙－120頁）

（6）因應綠色交通運輸趨勢，辦理岡山路竹延伸線第二階段捷運建設計畫，惟土建統包工程因廠商估驗計價請款程序延宕，預算執行情形欠佳，允宜檢討改善：捷運工程局為因應綠色交通運輸趨勢，積極推動高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫，路網分為第二A階段RK2至RK6站及第二B階段RK7至RK8站，嗣因疫情、缺工、戰爭及物價上漲等因素，於113年4月經行政院核定第二A階段第1次修正計畫，經費調整至279億1,848萬元，通車期程展延至116年底；另第二B階段計畫經費為146億1,669萬元。經查辦理情形，核有：A.截至113年底止，第二A階段土建統包工程實際施工進度為12.89%，雖較預計施工進度11.74%超前，惟因廠商估驗計價請款程序延宕，致預算執行情形欠佳，又因自來水管遷改工程而展延竣工日期；B.第二A階段及第二B階段場站周邊土地尚未完成都市計畫變更作業，影響土地開發期程等情事，經函請檢討改善。（詳乙－122頁）

（7）持續規劃小港林園線捷運建設，延伸捷運紅線至林園區之路網服務範圍，惟核定經費已不敷支應工程發包需求，且用地取得期程延宕，影響計畫執行進度，允宜檢討改進：捷運工程局為改善小港林園地區大眾運輸環境，規劃辦理高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫，路線長度為11.59公里，包含地下段11.46公里及高架段0.13公里，設有RL1至RL7等7座車站，核定總建設經費533億1,100萬元（中央補助313億1,400萬元）。經查辦理情形，核有：A.為應疫情等外在環境因素影響，原核定經費無法因應工程發包需求，雖已積極推動修正計畫，惟截至114年4月止迄未獲核定，影響後續土建、設施機電工程發包期程及計畫整體執行進度；B.持續規劃小港林園線捷運建設，延伸捷運紅線至林園區之路網服務範圍，惟用地取得期程延宕，影響計畫執行進度等情事，經函請檢討改善。（詳乙－122頁）

（8）持續辦理岡山區大鵬九村社會住宅興建計畫，滿足民眾居住需求及帶動地區性發展，惟社會住宅統包工程採購多次流標，採減少興建樓層方式因應，大幅減少容積率及戶數，影響日後租金收入及降低自償能力，允待研謀因應措施：市政府為落實居住正義，積極推動社會住宅興建計畫，其中岡山區大鵬九村社會住宅座落於岡山區第87期重劃區，使用土地面積約1.3公頃，計畫經費匡列35億8,407萬餘元（非自償性部分申請內政部補助），委由新建工程處代辦統包工程採購招標及後續履約管理事宜。經查辦理情形，核有：A.都市發展局原規劃興建708戶，經基本設計後之統包需求為764戶，然因工程採購數度流標，採下修樓層數、戶數、建蔽率與容積


率方式因應，其減少之戶數差額達139戶，允待研謀因應措施，以確保新建社會住宅目標量能之達成；B.新建該社會住宅所需經費，係以高雄市住宅基金融資方式籌措自償性經費，惟因工程採購多次流標，下修樓層數為12層、戶數減為625戶，影響日後租金收入及降低自償性償還能力，允待及時檢討評估營運期間之現金流，並研謀因應措施，以確保社會住宅財務計畫健全等情事，經函請檢討改善。（詳乙－158頁）

二、市政府所屬各機關採購作業執行情形之查核

（一） 113 年度採購作業執行情形

113 年度市政府所屬各機關辦理之公告金額十分之一以上採購案計 9,344 件，決標總金額 755 億 8,701 萬餘元，包括工程採購計 2,704 件（28.94%），決標金額 493 億 9,362 萬餘元（65.35%）；財物採購 1,795 件（19.21%），決標金額 40 億 9,641 萬餘元（5.42%）；勞務採購 4,845 件（51.85%），決標金額 220 億 9,696 萬餘元（29.23%）（圖 3）。

圖 3　各類採購 113 年度公告金額十分之一以上之件數、金額統計

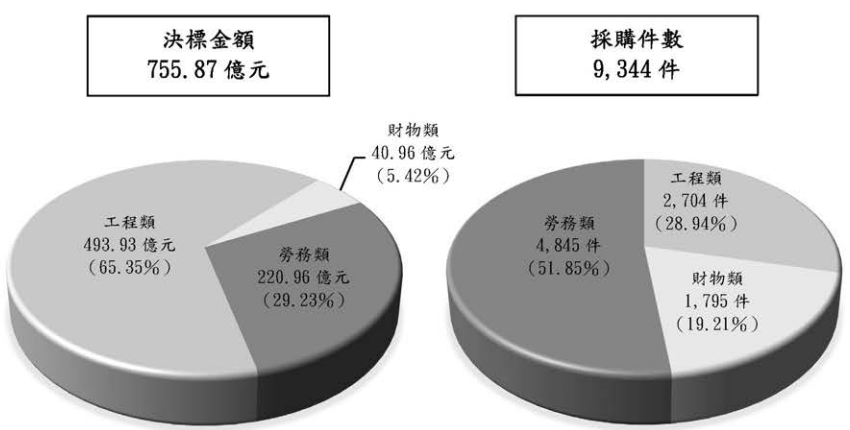

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網網站資料。

（二） 審計機關查核情形

本處查核市政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改善及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1. 共同性執行缺失

（1）持續辦理採購稽核作業，維護採購秩序及確保採購品質，惟所屬各機關學校於採購規劃、招決標、履約與驗收結算等階段間有共同性缺失，允宜督促檢討改善：市政府為推動施政計畫，經各機關依計畫及編列之預算辦理各項採購，113 年度市政府所屬各機關辦理公告金額十分之一以上之採購案計 9,344 件，決標總金額 755 億 8,701 萬餘元。經查各機關採購作業各階段共同性缺失情形，核有：採購案件於前置作業與規劃、招（決）標、履約管理等方面之共同性缺失情事，經函請督促檢討改善。（詳乙－23 頁）

（2）持續辦理學校運動操場及周邊設施整建，提供學生安全且優質之運動環境，惟間有部分學校操場跑道損壞久未修復、未落實審查整建工程材料設計規範及採購招標文件訂定未臻周全，允宜檢討改善，以確保學生運動安全：教育局為改善學生因跑道損壞或無相關體育設施，獲教育部補助改善所屬學校運動操場及周邊設施，以提升學生運動安全及社區共享效益。截至 113 年底，補助所屬學校辦理操場跑道維護暨周邊設施整建工程計 115 校，經費合計 7 億 8,538 萬餘元。經查辦理情形，核有：A. 部分學校操場跑道損壞久未修復，截至 113 年底尚未申請或尚未獲補助整修者計 82 校，其中破損逾 1 年者計 54 校，允宜積極協助籌措經費改善，提供舒適運動環境，以確保學生活動安全；B. 部分學校辦理跑道整建工程，未落實審查材料設計規範，允宜督促落實設計審查作業，以符採購需求目標；C. 部分施工廠商送審材料資料或綠建材標章證書已逾有效期限，監造廠商仍予審核通過等情事，經函請檢討改善。（詳乙－44 頁）

2. 個案採購執行缺失

（1）賡續優化運動環境配合捷運聯合開發計畫，將原封閉之中正運動場改造轉型為開放式並具多元功能之運動公園，惟工程設計及施工品管作業未臻周妥，允待檢討改善：市政府為優化市民運動環境及應市民對多功能生活空間之需求，新建工程處配合捷運工程局捷運 O9 站聯合開發案推動中正運動場開放場域改造計畫，辦理「中正運動場開放場域改造工程」，契約金額 3 億 3,344 萬餘元。經查辦理情形，核有：A. 規劃設置極限運動場之觀眾容納空間無法滿足專業團體需求及欄杆高度較建築技術規則為低，恐對觀眾構成潛在風險，允宜檢視場地規劃設施之安全性；B. 考量國人使用習性，允宜調整部分廁所馬桶型式，以建立優質之公共服務設施；C. 部分工項變更設計數量，尚待檢討設計廠商設計疏失責任；D. 監造人員資歷不符契約要求；E. 施工

圍籬之混凝土防溢座數量未依實做數量估驗計價；F. 部分混凝土完成面夾雜模板或破損、準備搭接之鋼筋上附有未清除之硬化水泥漿、陰井開口未設置防護措施等施工品質及工地安全衛生管理欠佳等情事，經函請檢討改善。（詳乙－56 頁）

（2）賡續推動社會住宅興建計畫，受託代辦岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程，實踐居住正義，惟工程設計及施工品管作業未臻完善，允宜檢討改善，以提升社會住宅工程品質：都市發展局辦理岡山區大鵬九村社會住宅計畫，規劃興建兩棟地上 12 層、地下 2 層，可容納 625 戶之社會住宅，經該局完成先期規劃及基本設計，委託新建工程處代辦「高雄市岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程」採購及履約管理作業。該統包工程契約金額 33 億 721 萬元，由高雄市住宅基金分年支應，工程於 112 年 3 月開工，預定於 115 年 6 月完工。經查辦理情形，核有：A. 統包商於細部設計編列之材料試驗費單價與機關制定基準差異頗大，有待檢討編列價格合理性；B. 借用他機關土地作為工務所用地，惟細部設計編列租地費用未予扣除；C. 辦理已進場尚未施作之金屬模板材料估驗計價作業，與契約規定之給付比率不符；D. 契約規定進口製品無物價調整方式，惟採用之金屬模板為進口製品仍給付物價調整款；E. 鋼板樁等分項施工計畫未待核定即施工及部分牆體鋼筋末端未施作錨定彎鉤、止水帶未熱熔接合等未依核定之細部設計圖說施作及施工品質欠佳等情事，經函請檢討改善。（詳乙－58 頁）

（3）為賡續提供便民醫療服務，市立醫院積極採購各項醫療儀器設備，惟間有採購需求評估、履約管理及教育訓練作業安排未臻周妥，有待檢討研謀改善，以提升醫療檢驗及健康檢查品質：市立聯合、民生、凱旋及中醫 4 家醫院 113 年度辦理醫療儀器設備、藥品衛材及院內相關設施等財物採購決標金額分別為 8,073 萬餘元、7 億 4,911 萬餘元、1 億 2,603 萬餘元及 4,298 萬餘元。經查市立聯合、民生醫院醫療儀器設備採購作業辦理情形，核有：A. 聯合醫院採限制性招標洽原設備供應商採購周邊配件，事前未依規定檢討符合要件，採購前置評估作業未完備；B. 民生醫院採購醫療儀器契約規定廠商應提供新品，惟對新品定義未臻明確，易衍生履約爭議；C. 聯合醫院採購部分儀器之附屬列印設備產地不符契約規定；D. 聯合醫院採購醫療儀器交貨後未能妥為安排教育訓練，不利於醫事人員熟悉儀器操作；E. 聯合醫院部分採購契約規定廠商於驗收後請款時提出採購標的進口之佐證文件，惟驗收合格後，因欠缺相關文件，導致契約價金尾款給付時程延遲等情事，經函請檢討改善。（詳乙－79 頁）

（4）持續辦理南區資源回收廠設備檢修及維護工作，以維持焚化廠營運效能及穩定垃圾處理量能，惟歲修延時偏低，且相關採購及驗收作業未臻周妥，允待檢討改善：環境保護局南區資源回收廠（下稱南區廠）為維護焚化設備及穩定垃圾處理量能，於 113 年度辦理相關設備檢修、維護、更換及耗材購置等採購案計 46 件，決標金額合計 2 億 295 萬餘元。經查辦理情形，核有：A.南區廠近 4 年度（110 至 113 年度）非計畫性停爐次數介於 35 次至 55 次之間，明顯高於全國 27 座大型焚化廠每年平均停爐次數 8 次至 9 次；停爐時數亦達 4,689 小時至 7,822 小時，遠高於全國平均停爐時數 602 小時至 765 小時，惟南區廠近年安排爐體歲修天數相較於中區資源回收廠少，歲修延時偏低，允宜參酌環境部環境管理署查核評鑑建議，於兼顧廢棄物處理量能，適時擴大歲修，以維護焚化廠營運效能；B.短期間辦理數件未達公告金額之汽輪發電機相關檢修作業採購，有分批辦理公告金額以上採購之虞；C.尚未簽辦採購變更增作項目，即由廠商施作完成，權利義務未臻明確，增生履約管理風險；D.辦理汽輪發電機開蓋、檢查、零組件復裝等採購案，未依規定期限驗收等情事，經函請檢討改善。（詳乙－89 頁）

三、特定採購議題查核情形

行政法人採購制度之建立與落實情形之查核

1.市政府設置行政法人情形

市政府為加強策劃、行銷、推廣文化藝術活動，提供完善圖書資訊服務、推廣多元教育、提升閱讀文化，及扶植流行音樂、培育相關文創人才及產業，分別於 106 年 1 月 1 日、9 月 1 日及 107 年 1 月 1 日成立高雄市專業文化機構、高雄市立圖書館、高雄流行音樂中心（以下分別稱專業文化機構、圖書館、高流中心）等 3 個行政法人，為協助其專業治理與永續經營，文化局歷年均補助其營運及管理經費，113 年度補助經費分別為 3 億 8,228 萬餘元、4 億 1,296 萬餘元及 9,859 萬餘元，合計金額 8 億 9,384 萬餘元，並依循行政院人事行政總處訂定之「行政法人績效評鑑參考原則」及「行政法人採購作業規章訂定參考原則」，辦理各行政法人之營運（業務）績效評鑑及採購制度建立之監督作業，各行政法人亦依其組織特性、業務屬性、實務運作所需，分別訂定「高雄市專業文化機構採購作業實施規章」、「高雄市立圖書館採購作業實施規章」、「高雄流行音樂中心採購作業規章」，供辦理採購作業遵循。

2.審計機關查核情形

本處查核行政法人採購制度之建立與落實暨監督作業情形，發現尚待檢討改進及機關函復內容，歸納摘述如次：

（1）文化局依市政府權責劃分督管專業文化機構、圖書館、高流中心等 3 個行政法人之運作及業務執行已逾 7 年，惟尚未依「行政法人採購作業規章訂定參考原則」訂定行政法人辦理採購作業之原則性規範，供各該法人擬訂採購作業實施規章之參考；且個別行政法人擬定之採購作業實施規章內容，對於監辦程序、採購人員利益衝突迴避及爭議處理等採購共通性事項，所擬訂之規範標準與程序亦存有明顯差異，甚至部分行政法人未有相關規範情事，不利確保行政法人本公平與公開原則辦理採購作業，允宜研議建立共通性採購作業實施規章參考要項，並通盤檢視各該法人採購規章內容有無闕漏之處並督請完善建立，俾確保行政法人採購作業落實公平、公開原則，經函請檢討改善。據復：將參採中央及地方各行政法人之監督機關訂定及執行情形，研訂高雄市行政法人採購作業規章之原則性規範，並督促各行政法人通盤檢視自訂規章不足或闕漏之處，予以研修。

（2）文化局每年組成績效評鑑會議，在個別行政法人報送年度營運計畫後，據以訂定當年度績效評鑑之項目、內容及指標，俾衡量各行政法人之執行成果、營運績效及目標達成率，並於次年度將評鑑意見及分析報告提交市議會備查。惟 113 年度各行政法人營運績效評鑑指標尚乏採購作業項目，鑑於文化局歷年對各行政法人辦理相關採購補助經費甚鉅，亟待將採購作業納入相關之評鑑項目並研修績效評鑑原則規定，俾有效發揮監督功能，經函請檢討改善。據復：爾後辦理評鑑作業，將採購作業相關事項納入評鑑計畫與項目，以精進績效評估作業。

（3）各行政法人辦理非適用政府採購法未達一定金額（150 萬元）之採購，多採逕洽廠商取得報價方式，不利於促進採購競爭，且對於非適用政府採購法之公開招標採購資訊公告及非公開招標之決標資訊，尚有增進公開透明之空間，經函請檢討改善。據復：將督促各行政法人確實視個案採購需求擇定適切之辦理方式，以確保採購案件公平及公正，並對非適用政府採購法之採購案招、決標資訊公開作業與適用範圍，促請檢討及修訂個別行政法人之採購作業規章，確實依規定辦理各案公開作業。

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特別預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。


茲將截至113年12月31日止，市政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1至4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第 1 期特別預算執行情形

（一） 補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助市政府計56億8,835萬餘元（100.00％），包括城鄉建設25億2,846萬餘元（44.45％），水環境建設16億2,805萬餘元（28.62％），數位建設6億2,388萬餘元（10.97％），軌道建設4億7,400萬元（8.33％），因應少子化友善育兒空間建設3億4,671萬元（6.10％），人才培育促進就業建設5,992萬餘元（1.05％），食品安全建設2,731萬餘元（0.48％）等7項建設類別（圖1、2）。

圖 1　前瞻第 1 期補助計畫建設類別

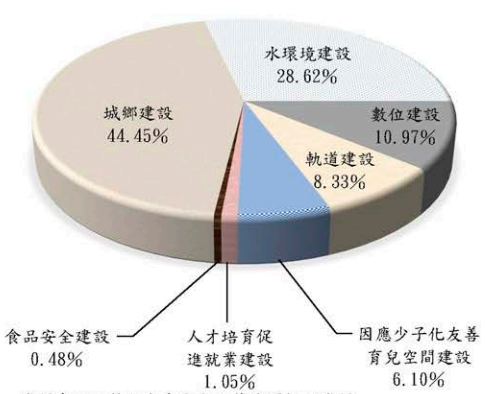

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖 2　前瞻第 1 期補助計畫建設類別（金額）



資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二） 補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助市政府計56億8,835萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數56億578萬餘元，約98.55%（表1、圖3）。

表1 前瞻第1期補助經費執行情形

106年9月13日至113年12月31日止


單位：新臺幣千元、%

前瞻計畫建設類別	前瞻計畫補助款（A）	補助款累計執行數（B）	執行率（B/A×100）
合計	**5,688,358**	**5,605,783**	**98.55**
城鄉建設	2,528,463	2,508,623	99.22
水環境建設	1,628,057	1,609,581	98.87
數位建設	623,889	616,951	98.89
軌道建設	474,000	440,074	92.84
因應少子化友善育兒空間建設	346,710	344,841	99.46
人才培育促進就業建設	59,926	59,245	98.86
食品安全建設	27,312	26,464	96.90

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。
2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖3 前瞻第1期補助經費已執行比率概況

106年9月13日至113年12月31日止

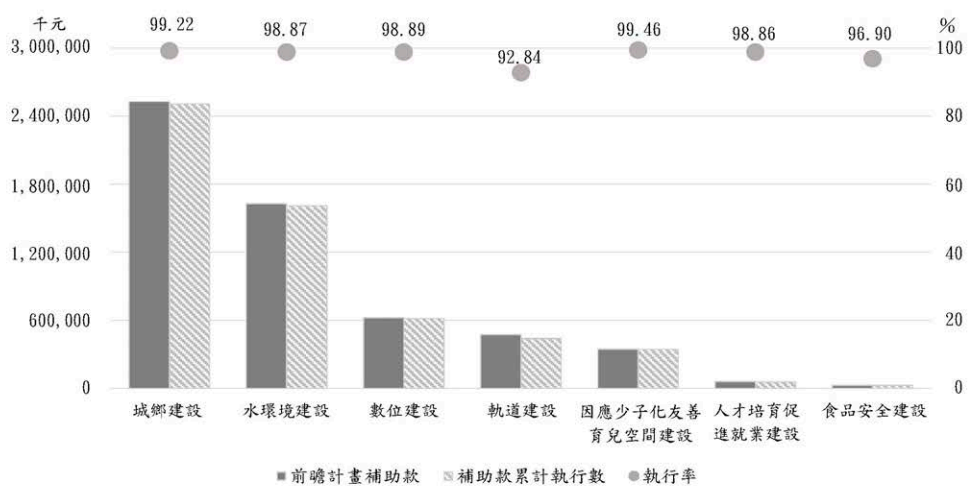


資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、前瞻第 2 期特別預算執行情形

（一） 補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助市政府計110億1,651萬餘元（100.00%），包括城鄉建設48億1,860萬餘元（43.74%），水環境建設34億6,930萬餘元（31.49%），數位建設13億3,162萬餘元（12.09%），軌道建設10億3,300萬元（9.38%），因應少子化友善育兒空間建設2億460萬餘元（1.86%），人才培育促進就業建設1億4,697萬餘元（1.33%），食品安全建設1,239萬餘元（0.11%）等7項建設類別（圖4、5）。

圖 4　前瞻第 2 期補助計畫建設類別

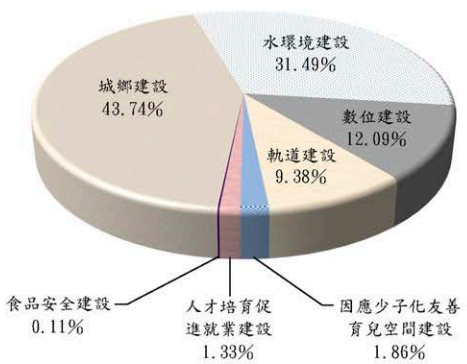

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖 5　前瞻第 2 期補助計畫建設類別（金額）



資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二） 補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助市政府計110億1,651萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數108億5,646萬餘元，約98.55%（表2、圖6）。

表2　前瞻第2期補助經費執行情形

108年1月1日至113年12月31日止


單位：新臺幣千元、%

前瞻計畫建設類別	前瞻計畫補助款（A）	補助款累計執行數（B）	執行率（B/A×100）
合　　計	11,016,514	10,856,464	98.55
城鄉建設	4,818,606	4,756,728	98.72
水環境建設	3,469,303	3,410,262	98.30
數位建設	1,331,624	1,309,414	98.33
軌道建設	1,033,000	1,033,000	100.00
因應少子化友善育兒空間建設	204,609	187,688	91.73
人才培育促進就業建設	146,978	146,978	100.00
食品安全建設	12,392	12,392	100.00

註：1. 本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。
2. 補助款累計執行數（B）係第 2 期特別決算實現數。
3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖 6　前瞻第 2 期補助經費已執行比率概況

108 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止

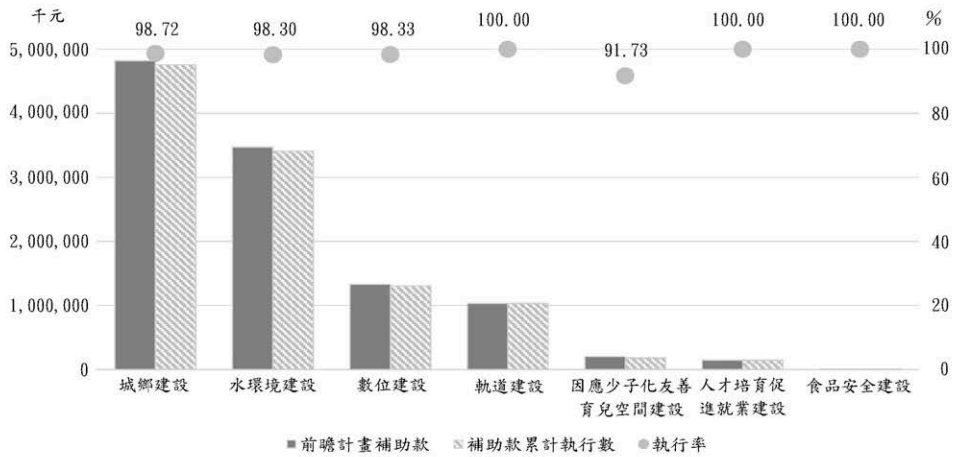


資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

三、前瞻第 3 期特別預算執行情形

（一）　補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第 3 期特別預算補助市政府計 101 億 2,924 萬餘元（100.00%），包括城鄉建設 58 億 3,079 萬餘元（57.56%），水環境建設 28 億 6,668 萬餘元（28.30%），軌道建設 8 億 120 萬元（7.91%），數位建設 2 億 6,254 萬餘元（2.59%），因應少子化友善育兒空間建設 1 億 8,913 萬餘元（1.87%），人才培育促進就業建設 1 億 5,817 萬餘元（1.56%），食品安全建設 2,070 萬餘元（0.20%）等 7 項建設類別（圖 7、8）。

圖 7　前瞻第 3 期補助計畫建設類別

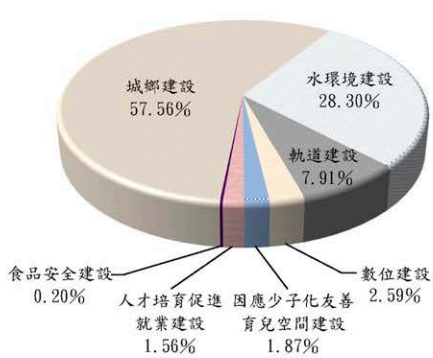

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖 8　前瞻第 3 期補助計畫建設類別（金額）



資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二） 補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助市政府計101億2,924萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數99億2,326萬餘元，約97.97%（表3、圖9）。

表3 前瞻第3期補助經費執行情形

110年1月1日至113年12月31日止


單位：新臺幣千元、%

前瞻計畫建設類別	前瞻計畫補助款（A）	補助款累計執行數（B）	執行率（B/A×100）
合計	**10,129,242**	**9,923,265**	**97.97**
城鄉建設	5,830,798	5,648,438	96.87
水環境建設	2,866,689	2,850,536	99.44
軌道建設	801,200	801,200	100.00
數位建設	262,541	262,136	99.85
因應少子化友善育兒空間建設	189,136	186,149	98.42
人才培育促進就業建設	158,172	154,226	97.51
食品安全建設	20,704	20,577	99.39

註：1. 本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。
2. 補助款累計執行數（B）係第 3 期特別決算實現數。
3. 本表前瞻計畫補助款 101 億 2,924 萬餘元與 112 年度高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額 101 億 3,394 萬餘元，差異 469 萬餘元，主要係按計畫執行情形調減所致。
4. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖 9 前瞻第 3 期補助經費已執行比率概況

110 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止

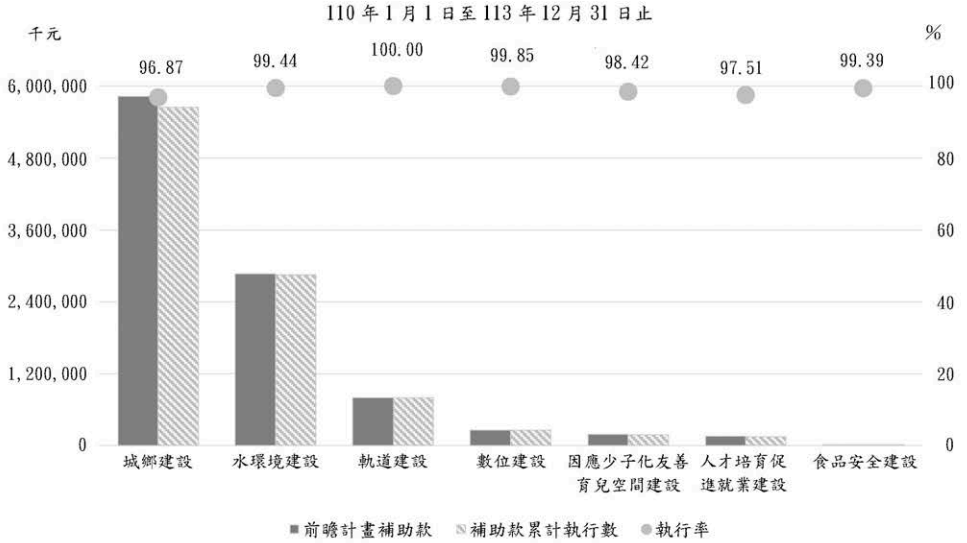


資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

四、前瞻第 4 期特別預算執行情形

（一） 補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助市政府計126億11萬餘元（100.00%），包括軌道建設57億210萬元（45.25%），城鄉建設31億3,243萬餘元（24.86%），水環境建設28億1,216萬餘元（22.32%），人才培育促進就業建設4億542萬餘元（3.22%），數位建設2億9,236萬餘元（2.32%），因應少子化友善育兒空間建設1億6,405萬餘元（1.30%），綠能建設6,578萬餘元（0.52%），食品安全建設2,580萬元（0.20%）等8項建設類別（圖10、11）。

圖 10 前瞻第 4 期補助計畫建設類別

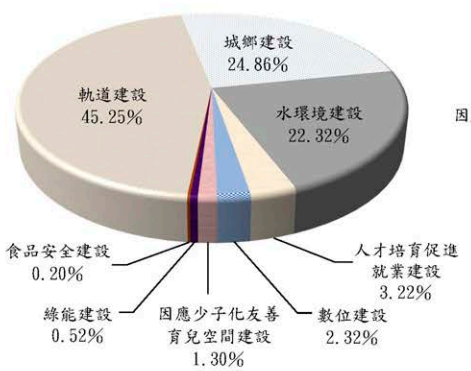

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖 11 前瞻第 4 期補助計畫建設類別（金額）



資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二） 補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助市政府計126億11萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數89億8,224萬餘元，約71.29%（表4、圖12）。執行率未達80%者，係軌道建設、城鄉建設、水環境建設、因應少子化友善育兒空間建設等4項，主要係高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發等計畫，廠商估驗計價請款程序延宕；仁武產業園區等計畫，廠商尚未申請估驗付款；高雄市區濱海聯外道路開闢等工程，用地取得期程延宕；楠梓藍田公共托嬰中心等計畫，因執行期程跨年度，影響執行進度等所致。

表4　前瞻第4期補助經費執行情形

112年1月1日至113年12月31日止


單位：新臺幣千元、%

前瞻計畫建設類別	前瞻計畫補助款（A）	補助款累計執行數（B）	執行率（B/A×100）
合　　計	**12,600,118**	**8,982,245**	**71.29**
軌道建設	5,702,100	4,077,763	71.51
城鄉建設	3,132,433	2,326,626	74.28
水環境建設	2,812,160	1,731,833	61.58
人才培育促進就業建設	405,427	374,813	92.45
數位建設	292,360	292,281	99.97
因應少子化友善育兒空間建設	164,053	90,138	54.94
綠能建設	65,782	63,211	96.09
食品安全建設	25,800	25,578	99.14

註：1. 本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。
2. 補助款累計執行數（B）係第 4 期特別決算實現數。
3. 本表前瞻計畫補助款 126 億 11 萬餘元與 112 年度高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額 61 億 3,395 萬餘元，差異 64 億 6,616 萬餘元，主要係 113 年度新增補助計畫，或按計畫執行情形調整所致。
4. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖 12　前瞻第 4 期補助經費已執行比率概況

112 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止

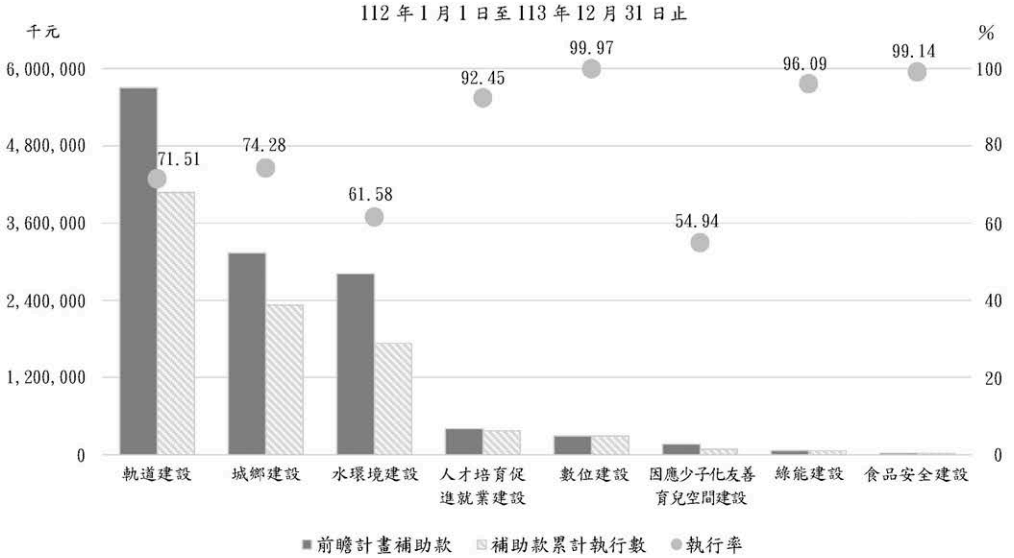

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

五、重要審核意見

本處查核市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

（一） 持續推動黃線捷運建設計畫，惟整體計畫經費大幅增漲，部分路線工程無法發包，且機廠用地水保工程期程延遲，影響接續進場施作統包工程之期程，允宜檢討改善。（軌道建設）

交通部以「都市推動捷運計畫」預算，補助各地方政府優化軌道運輸服務，達成紓解都會區交通擁擠之目標，並引入複合式軌道運輸系統，除可避免面對延伸路線鉅額建設成本及用地徵收等問題，亦擴大軌道運輸服務範圍。查核捷運工程局「高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫」執行情形，核有：1.修正計畫尚未獲核定，囿於經費不足，距原綜合規劃報告計畫總經費僅餘 206 億 8,990 萬餘元，惟尚有部分路線之土建及設施機電工程無法辦理發包，恐影響全線營運通車期程；2.鳥松機廠用地遷葬階段之水保工程尚未完成，影響接續進場施作統包工程之期程；3.租稅增額收益迄未收取，允宜依償債計畫內容及期限確實執行，及時挹注償債財源，減少利息負擔等情事，經函請檢討改善。（詳乙－120 頁）

（二） 因應綠色交通運輸趨勢，辦理岡山路竹延伸線第二階段捷運建設計畫，惟土建統包工程因廠商估驗計價請款程序延宕，預算執行情形欠佳，允宜檢討改善。（軌道建設）

交通部以「都市推動捷運計畫」預算，補助各地方政府優化軌道運輸服務，達成紓解都會區交通擁擠之目標，並引入複合式軌道運輸系統，除可避免面對延伸路線鉅額建設成本及用地徵收等問題，亦擴大軌道運輸服務範圍。查核捷運工程局「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫」執行情形，核有：1.截至 113 年底止，第二 A 階段土建統包工程實際施工進度為 12.89%，雖較預計施工進度 11.74%超前，惟因廠商估驗計價請款程序延宕，致預算執行情形欠佳；2.部分場站周邊土地尚未完成都市計畫變更作業，影響土地開發期程等情事，經函請檢討改善。（詳乙－122 頁）

（三） 積極推動岡山路竹延伸線第一階段捷運建設計畫，以促進岡山地區衍生之交通需求，惟通車後實際運量未如預期，允宜檢討改善。（軌道建設）

交通部以「都市推動捷運計畫」預算，補助各地方政府優化軌道運輸服務，達成紓解都會區交通擁擠之目標，並引入複合式軌道運輸系統，除可避免面對延伸路線鉅額建設成本及用地徵收等問題，亦擴大軌道運輸服務範圍。查核捷運工程局「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫」執行情形，核有：第一階段已於 113 年 6 月 30 日通車，

惟截至 113 年底止，累計實際運量 58 萬餘人次，僅占綜合規劃報告書同期間預計運量 149 萬餘人次，約 39.27%，運量雖持續成長，惟與預估運量仍有差距，未能支應本業營運收支差短之情事，經函請檢討改善。(詳乙－121 頁)

（四） 建置學校社區共讀站促進圖書資源共享，惟部分站點工程規劃尚欠周妥、藏書量未達規定標準、管理與資訊公開機制未臻周全，甚鄰近市圖分館影響使用效益，亟待檢討精進，以提升服務品質，保障使用者借閱權益。(城鄉建設)

教育部以「校園社區化改造計畫」預算，補助各地方政府透過多元學習型態，提供社區民眾可學習、交流及共學平臺，運用學校基地，打造校園社區多元服務空間，共構社區居民便利生活環境。查核教育局「學校社區共讀站」等計畫執行情形，核有：1.已開放共讀站計 151 處，惟間有部分站點藏書量未達規定標準、平日課後開放民眾使用未逾 2 小時、例假日未開放等情，限縮社區民眾參與共讀及自我成長之機會；2.部分共讀站之管理人員在職訓練時數未達規定標準，或部分學校尚未訂定開放社區使用之公開資訊及管理規範，影響服務品質及圖書資源共享效益；3.部分學校未規範購置電腦設備之基本規格、設計採用特定產品，或未督促設計廠商提出必要性說明及辦理相關審查作業，規劃設計作業未盡周妥等情事，經函請檢討改善。(詳乙－43 頁)

（五） 積極爭取中央計畫型補助，強化基礎公共建設及營造城鎮環境新風貌，惟間有計畫未與利害關係人溝通，無法取得闢建用地，或改善方案不符民眾期待，致取消興建計畫，有待檢討改善。(城鄉建設、水環境建設)

內政部以「城鎮之心工程」及「水與安全計畫」預算，補助各地方政府辦理舊市區整體風貌改造，強化因應氣候變遷及調適能力，善用在地優勢整合軟硬體資源，建構安全舒適之休閒環境，及補助各地方政府辦理易淹水地區之上、中、下游防洪、減災、禦潮工程整體改善，提升防洪及適洪韌性，強化防災預警與應變能量，管理災害風險。查核市政府「六龜之心再造」等計畫執行情形，核有：1.工務局公園處辦理永安公園開闢工程計畫，未事先與計畫區內私有地相關關係人溝通，取得公園開闢用地，最終取消興建計畫；2.農業局推動龍目社區水岸綠廊生活環境營造計畫，部分建置設施損壞及河道乾枯，與原預期提供遊客親水遊憩之計畫目標有間；3.水利局辦理高雄市林園區龔厝路側溝排水改善工程，因改善方案未能結合都市計畫道路開闢併建雨水下水道方式，不符合地方民意期待而撤案；4.都市發展局與六龜區公所推動六龜之心再造計畫，進行街區環境景觀及觀光休憩設施改善，惟水池積砂、景觀步道土石流失等環境設施維護欠周妥等情事，經函請檢討改善。(詳乙－21 頁)

（六） 充實數位教學軟硬體設施，有效提升師生數位環境互動與成長，惟部分學校數位載具與教學軟體使用率偏低，且未落實效益檢核與追蹤機制，允宜檢討

改善，俾充分發揮數位資源之使用效益。（數位建設）

教育部以「縮短 5G 偏鄉數位落差」預算，補助各地方政府辦理設置學生之學習載具，幫助落後學生學習，並建置 5G 智慧科技學習環境與示範教學，引領學校朝新科技教學，培養自主學習與終身學習能力。查核教育局「校園 5G 示範教室與學習載具」等計畫執行情形，核有：1.市轄公私立學校配發學習載具設備部分使用率未達 30%，亟需檢視設備汰換與管理維護機制；2.112 學年度第 1 學期全市及各校授權軟體不曾使用之平均比率較 111 學年度第 2 學期同項比率上升 9.9 及 17.7 個百分點，顯示教學軟體資源實際使用情形呈下降趨勢，惟該局未妥謀善策因應，僅針對實際使用軟體之教師辦理問卷調查，無法全面反映實際使用情形，與數位學習推動計畫之使用效益追蹤與評估機制未符等情事，經函請檢討改善。（詳乙－41 頁）

（七） 開發內門觀光休閒園區，營造友善生態及休閒遊憩場域，惟區內土地以私有地居多，前期規劃作業未臻周延，復因委外招商政策反覆，影響園區新建計畫進度及營運期程，亟待研謀改善，俾發揮預期綜效。（城鄉建設）

交通部以「推動觀光升級」預算，補助各地方政府構建觀光基礎建設，提供高品質旅遊環境，促進整體觀光發展，帶動周邊產業復甦，活絡地方經濟。查核觀光局「高雄市內門觀光休閒園區新建工程」等計畫執行情形，核有：1.遷建新址多數為私有土地，屬山坡地保育區之農牧及林業用地，開發使用受限，且聯外道路亦未符法令規定，又先期可行性評估作業未臻周延，無法提報整體計畫，雖數次調整計畫方向，遷建計畫仍於規劃階段終止，未能發揮預期效益；2.因規劃期程冗長，適逢疫情，計畫經費因物價上漲調增至 5 億 6,472 萬元，增幅達 67.70%，截至 114 年 3 月底止，多項工程仍未完工，耽延預定營運期程；3.園區促參政策歷經 3 次變更，辦理過程欠缺完整風險評估及財務分析報告，最終由市政府先行投入鉅額建設經費再進行 ROT 方式招商，大幅增加財政負擔，與促進民間參與公共建設法「減輕政府負擔、加速建設」目的未符等情事，經函請檢討改善。（詳乙－161 頁）

（八） 為改善都市開發所衍生水文地理環境改變問題，持續辦理區域排水系統規劃檢討計畫，惟仍有部分沿岸之堤防、護岸或橋梁梁底高程不足，排水功能受限，允宜積極檢討改善，以降低沿岸淹水風險。（水環境建設）

經濟部以「水與安全計畫」預算，補助各地方政府辦理易淹水地區之上、中、下游防洪、減災、禦潮工程整體改善，提升防洪及適洪韌性，強化防災預警與應變能量，管理災害風險。查核水利局「縣市管河川及區域排水整體改善」計畫執行情形，核有：1.部分排水系統沿岸堤防高程未達 10 年降雨重現期保護標準之計畫提案高程，一旦遭遇颱風暴雨，恐有溢堤引發水患之風險；2.部分橋梁梁底高程低於 10 年降雨量河川計畫水位，影響排水功能等情事，經函請檢討改善。（詳乙－169 頁）

